BNPB

Lampiran Pantauan Udara Karhutla Merauke

Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 31 Oktober 2026

Dipresentasikan oleh

Tim Ahli BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jakarta, 1 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

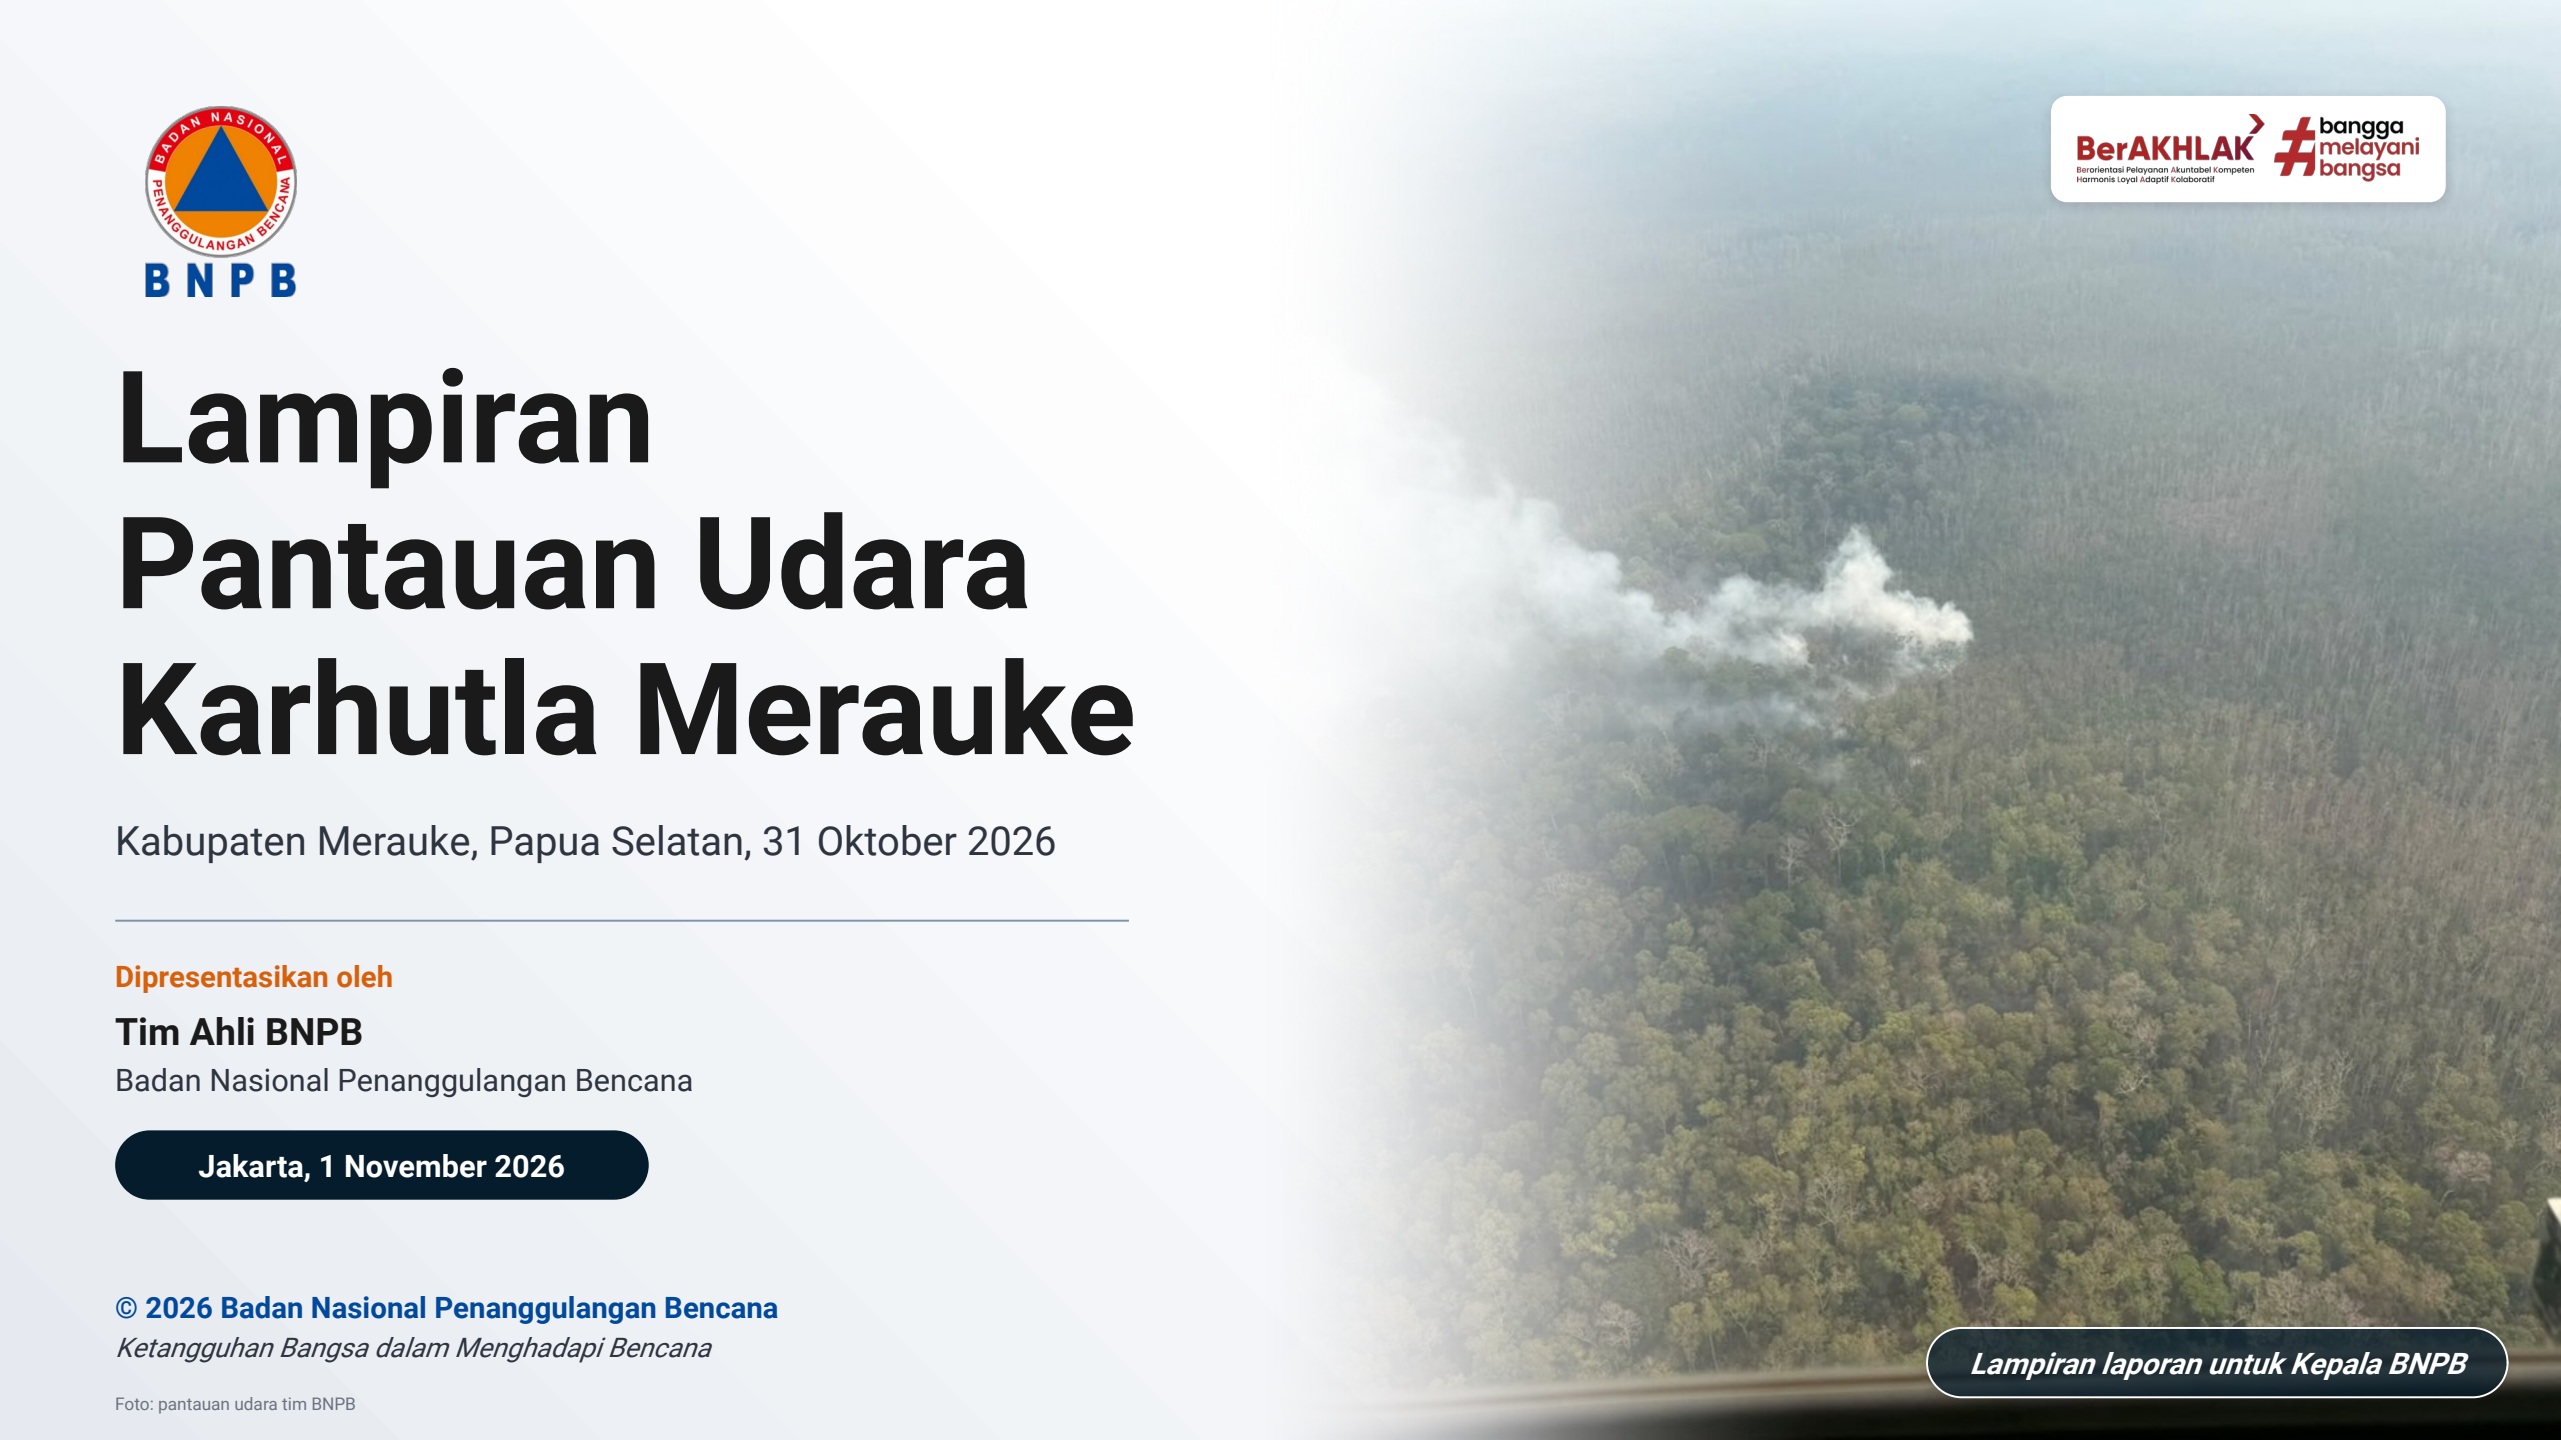


Foto: pantauan udara tim BNPB

Lampiran laporan untuk Kepala BNPB

Daftar Isi

Lampiran Pantauan Udara Karhutla Merauke

01 Renlap Rute Udara Merauke 3–6

02 Contoh Renlap Darat SIPPA 7–10

03 Foto Udara dan Berkas Asli Renlap 11–35

01

Renlap Rute Udara Merauke


01 **Renlap Rute Udara Merauke** 3–6

02 Contoh Renlap Darat SIPPA 7–10

03 Foto Udara dan Berkas Asli Renlap 11–35

Lampiran A1. Renlap rute udara 30 Oktober: peta check point dan urutan terbang

Rute dan urutan check point

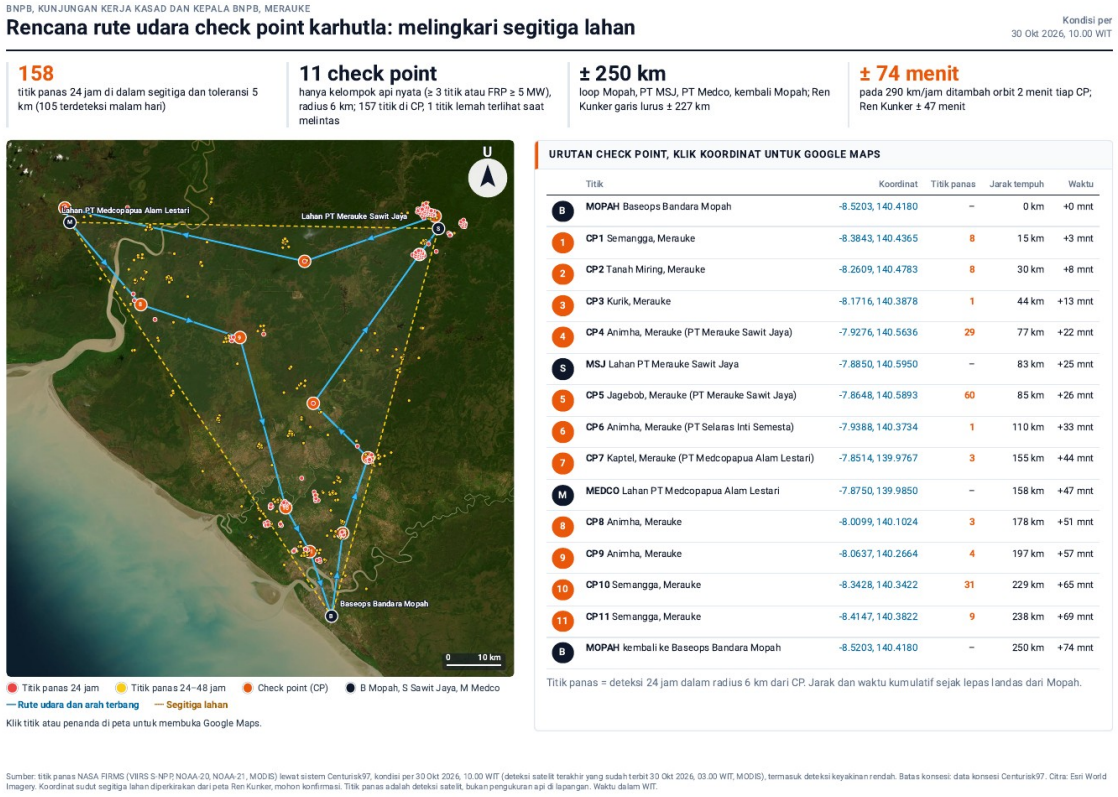

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT

158	11 check point	± 250 km	± 74 menit
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)	hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas	loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km	pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit

Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
Rute udara dan arah terbang · Segitiga lahan
Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS

	Titik	Koordinat	Titik panas	Jarak tempuh	Waktu
B	**MOPAH** Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	0 km	+0 mnt
1	**CP1** Semangga, Merauke	-8.3843, 140.4365	8	15 km	+3 mnt
2	**CP2** Tanah Miring, Merauke	-8.2609, 140.4783	8	30 km	+8 mnt
3	**CP3** Kurik, Merauke	-8.1716, 140.3878	1	44 km	+13 mnt
4	**CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.9276, 140.5636	29	77 km	+22 mnt
S	**MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya	-7.8850, 140.5950	–	83 km	+25 mnt
5	**CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.8648, 140.5893	60	85 km	+26 mnt
6	**CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)	-7.9388, 140.3734	1	110 km	+33 mnt
7	**CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)	-7.8514, 139.9767	3	155 km	+44 mnt
M	**MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari	-7.8750, 139.9850	–	158 km	+47 mnt
8	**CP8** Animha, Merauke	-8.0099, 140.1024	3	178 km	+51 mnt
9	**CP9** Animha, Merauke	-8.0637, 140.2664	4	197 km	+57 mnt
10	**CP10** Semangga, Merauke	-8.3428, 140.3422	31	229 km	+65 mnt
11	**CP11** Semangga, Merauke	-8.4147, 140.3822	9	238 km	+69 mnt
B	**MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	250 km	+74 mnt

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

- Rute melingkari segitiga Bandara Mopah, lahan PT Merauke Sawit Jaya, dan lahan PT Medcopapua Alam Lestari.
- Check point hanya dipasang di kelompok api nyata dari *hotspot* terbaru, dengan radius pandang **6 km**.
- Tabel kanan memuat koordinat, jumlah *hotspot*, jarak tempuh, dan waktu kumulatif tiap check point.
- Seluruh halaman aslinya ada di Lampiran D berkas ini.
- Rute bisa disusun ulang dalam hitungan menit bila *hotspot* berubah.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A2. Flight plan untuk pilot: haluan, jarak, dan waktu tiap leg

Flight plan per leg

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

TABEL LEG UNTUK PILOT

Leg	Dari ke	Koordinat tujuan (GPS)	Google Maps	Haluan sejati	Jarak	NM	Waktu
1	MOPAH ke CP1	S08°23.060' E140°26.192'	-8.3843, 140.4365	008°	15,3 km	8,2 NM	3 mnt
2	CP1 ke CP2	S08°15.653' E140°28.696'	-8.2609, 140.4783	018°	14,5 km	7,8 NM	3 mnt
3	CP2 ke CP3	S08°10.296' E140°23.268'	-8.1716, 140.3878	315°	14,1 km	7,6 NM	3 mnt
4	CP3 ke CP4	S07°55.654' E140°33.814'	-7.9276, 140.5636	036°	33,3 km	18,0 NM	7 mnt
5	CP4 ke MSJ	S07°53.100' E140°35.700'	-7.8850, 140.5950	036°	5,9 km	3,2 NM	1 mnt
6	MSJ ke CP5	S07°51.887' E140°35.357'	-7.8648, 140.5893	344°	2,3 km	1,3 NM	< 1 mnt
7	CP5 ke CP6	S07°56.328' E140°22.404'	-7.9388, 140.3734	251°	25,2 km	13,6 NM	5 mnt
8	CP6 ke CP7	S07°51.082' E139°58.602'	-7.8514, 139.9767	283°	44,8 km	24,2 NM	9 mnt
9	CP7 ke MEDCO	S07°52.500' E139°59.100'	-7.8750, 139.9850	161°	2,8 km	1,5 NM	< 1 mnt
10	MEDCO ke CP8	S08°00.594' E140°06.142'	-8.0099, 140.1024	139°	19,8 km	10,7 NM	4 mnt
11	CP8 ke CP9	S08°03.823' E140°15.987'	-8.0637, 140.2664	108°	19,0 km	10,3 NM	4 mnt
12	CP9 ke CP10	S08°20.566' E140°20.533'	-8.3428, 140.3422	165°	32,1 km	17,3 NM	7 mnt
13	CP10 ke CP11	S08°24.881' E140°22.933'	-8.4147, 140.3822	151°	9,1 km	4,9 NM	2 mnt
14	CP11 ke MOPAH	S08°31.218' E140°25.080'	-8.5203, 140.4180	161°	12,4 km	6,7 NM	3 mnt
	Total				250 km	135 NM	52 mnt

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

CARA MEMBACA RUTE

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026


Keterangan lampiran

- Tiap leg memuat koordinat GPS tujuan dalam derajat-menit, tautan Google Maps, haluan sejati, jarak, dan waktu.
- Jarak ditulis dalam kilometer dan mil laut, siap dibaca pilot.
- Kolom kanan menjelaskan cara membaca rute dan hal yang perlu diputuskan sebelum lepas landas.
- Berkas GPX dan KML ikut dikirim untuk perangkat navigasi.
- Leg yang tertutup asap bisa dilewati tanpa menyusun ulang seluruh rute.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A3. Halaman rinci tiap check point: citra dan daftar *hotspot*

CP-1 Semangga

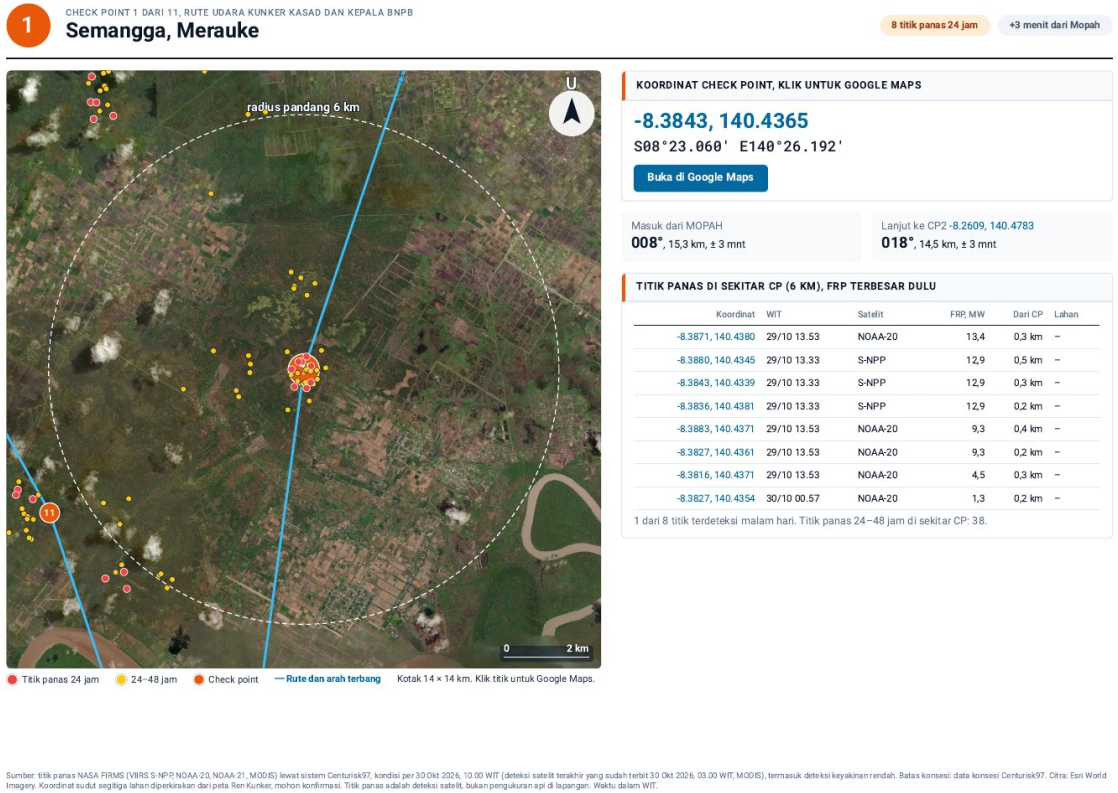

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

- Satu halaman untuk tiap check point: citra satelit dengan lingkaran radius pandang dan arah datang pesawat.
- Koordinat dalam dua format dan tombol Google Maps.
- Daftar *hotspot* di sekitar check point: jam deteksi, sensor, FRP, dan jarak dari check point.
- Renlap memuat halaman serupa untuk semua check point.
- Tim di helikopter bisa mencocokkan api yang terlihat dengan *hotspot* di daftar.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Contoh Renlap Darat SIPPA

01 Renlap Rute Udara Merauke 3–6

02 **Contoh Renlap Darat SIPPA** 7–10

03 Foto Udara dan Berkas Asli Renlap 11–35

Lampiran B1. Renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah: lokasi, sumber air terdekat, dan panjang selang

Lima lokasi urut sumber air

BNPB SIPPA, SISTEM PIPA PORTABEL KARHUTLA DAN BANJIR

Pilot Kalimantan Tengah: 5 lokasi, sumber air terdekat

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB
Dossier tim lapangan, 20 halaman

635	Kapuas 213, Pulang Pisau 130	3 dari 5	3 + 2
titik panas Kalimantan Tengah 31 Okt–1 Nov	kabupaten terbanyak	lokasi di dalam peta gambut resmi	lokasi selang pendek dan selang panjang

Kit pompa, selang, dan lance menyuntikkan air ke bara gambut sampai kedalaman 1,5 m. Petak uji ditaruh di **titik panas 24 jam terdekat yang berada di tanah gambut** (cadangan: 48 jam; bila tidak ada, di kompleks), lalu dicari sumber air terdekat untuk titik itu. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan.

5 lokasi, urut sumber air paling dekat ke petak (kondisi 1 November)

	LOKASI, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS	GAMBUT DAN KEDALAMAN	TITIK PANAS 5 KM, 48 JAM	SUMBER AIR DAN SELANG	WAKTU SAMPAI PETAK	UNTUK UJI APA
1	**Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya** Kompleks K0166 Petak uji -2.3154, 114.0295 Pompa -2.3147, 114.0298 Parkir -2.2942, 114.0206	Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m	10 4 dalam 24 jam	kanal, 80 m dari petak selang 159 m, 10 gulung	**± 80 menit** dari Daops Palangkaraya, jalan kaki 2,9 km	**Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek** Paling dekat Daops dan sedang ada api; kanal tepat di sebelah petak. Paling cocok untuk uji utama.
2	**Mendawai, Mendawai, Katingan** Kompleks K0107 Petak latihan -2.9901, 113.3133 Pompa -2.9908, 113.3116 Parkir -2.9829, 113.3166	Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor	12 5 dalam 24 jam	kanal, 210 m dari petak selang 306 m, 18 gulung	**± 57 menit** dari Desa Mendawai, jalan kaki 1,0 km	**Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api** Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 57 menit dari Desa Mendawai.
3	**Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas** Kompleks K3573 Petak latihan -2.0183, 114.3732 Pompa -2.0173, 114.3750 Turun perahu -2.0092, 114.3832	Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor	14 9 dalam 24 jam	kanal, 230 m dari petak selang 333 m, 19 gulung	**± 141 menit** dari Desa Sei Gawing, jalan kaki 1,7 km	**Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api** Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 141 menit dari Desa Sei Gawing.
4	**Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan** Kompleks K0672 Petak latihan -1.4949, 114.8119 Pompa -1.4940, 114.8204 Parkir -1.5130, 114.8118	Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor	6 5 dalam 24 jam	parit, 950 m dari petak selang 1.198 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan	**± 36 menit** dari Desa Pendang, jalan kaki 2,3 km	**Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan** Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 36 menit dari Desa Pendang.
5	**Batapah, Timpah, Kapuas** Kompleks K1674 Petak latihan -1.4848, 114.5812 Pompa -1.4838, 114.5727 Parkir -1.4863, 114.5787	Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor	7 5 dalam 24 jam	sungai, 950 m dari petak selang 1.197 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan	**± 67 menit** dari Desa Lungkuh Layang, jalan kaki 0,4 km	**Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan** Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 67 menit dari Desa Lungkuh Layang.

CEK GAMBUT

3 dari 5 lokasi berada di dalam peta gambut resmi 1:250.000 (Kementan, lewat PRIMS BRGM). Lokasi 4, 5 tidak tercatat di peta itu, jadi periksa dulu apakah benar gambut. Peta itu **tidak mencantumkan kedalaman**, jadi kedalaman gambut di tiap lokasi **wajib dibor** sebelum petak dipasang.

Aturan ganti: tiap petak dibor saat survei. Kalau gambutnya kurang dari 50 cm (bukan gambut) atau kurang dari 1 m (lance tembus ke tanah biasa), petak dipindah ke titik panas berikutnya dan alasannya dicatat.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Cara memilih: api masih terdeteksi 24 jam terakhir, bukan tambang atau industri, dan sumber air paling jauh 1 km dari petak, lalu diurutkan dari sumber air terdekat (80 m sampai 950 m). Mantangai Tumbang Mangkutup paling lama bertahan (69 titik panas dalam 72 jam) tetapi petaknya di gambut 4,3 km dari air, jadi dikeluarkan.
2. Kalimantan Tengah menyala lagi: 635 titik panas dalam 2 hari terakhir, terbanyak Kapuas (213) dan Pulang Pisau (130). Api Pulang Pisau belum punya kompleks SIPPA terdekat, jadi belum masuk renlap ini.
3. Dua tim dari Palangka Raya, rincinnya di halaman Rencana kunjungan.
4. Sumber air lokasi 1 sampai 4 berupa kanal atau parit: ukur debit dulu (paling sedikit 5 liter per detik untuk satu kit) sebelum memasang pompa.
5. Regu dan pompa: Manggala Agni Daops Palangkaraya atau BPBD kabupaten. Izin kepala desa; tiap sore H-1 diputuskan jalan atau tidak dari titik panas 24 jam terakhir. Alat tambahan: 2 lance, 2 termometer tusuk, 1 bor gambut.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian perkawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

Keterangan lampiran

- Contoh renlap darat yang sama mesinnya dengan renlap udara, dibuat 1 November untuk Kalimantan Tengah.
- Petak dipilih di *hotspot* terbaru, lalu dicari sumber air terdekat: **sekitar 80 m** sampai **sekitar 950 m** dari petak.
- Panjang selang, jumlah gulung, dan pompa tambahan dihitung per lokasi; selang terpanjang **sekitar 1.200 m**.
- Tiap lokasi punya koordinat petak, pompa, dan titik parkir.
- Lokasi yang sumber airnya terlalu jauh dikeluarkan dari daftar.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran B2. Contoh Kalimantan Tengah: rencana kunjungan regu darat per tim dan per hari

Rencana kunjungan per tim

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

Rencana kunjungan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Titik awal -2.2096, 113.9135. Urutan tabel adalah urutan kunjungan per tim dan hari. Nomor lokasi sama dengan nomor di halaman lokasi. Tautan Google Maps berangkat dari titik awal (hari berikutnya dari lokasi terakhir hari sebelumnya) dan menuju titik parkir tiap lokasi.

TIM	HARI	LOKASI	NAMA	TITIK PANAS 24 JAM	JARAK LURUS DARI TITIK AWAL	JARAK JALAN DARI TITIK SEBELUMNYA	WAKTU MOBIL DARI TITIK SEBELUMNYA	JALAN KAKI DARI PARKIR
1	1	3	**Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas** Kompleks K3573	9	55,3 km	135,5 km	2 jam 28 menit	2,0 km
1	2	4	**Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan** Kompleks K0672	5	127,6 km	105,6 km	2 jam 12 menit	2,6 km
1	3	5	**Batapah, Timpah, Kapuas** Kompleks K1674	5	109,6 km	65,6 km	1 jam 38 menit	0,4 km
2	1	1	**Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya** Kompleks K0166	4	15,4 km	20,9 km	23 menit	0,4 km
2	2	2	**Mendawai, Mendawai, Katingan** Kompleks K0107	5	109,4 km	153,2 km (perkiraan)	3 jam 50 menit (perkiraan)	1,1 km

TIM 1

- **Hari 1**, lokasi 3: Buka peta. Mobil 2 jam 28 menit, jalan kaki 1 jam 0 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **5 jam 58 menit**. Menginap di Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas.
- **Hari 2**, lokasi 4: Buka peta. Mobil 2 jam 12 menit, jalan kaki 1 jam 18 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 0 menit**. Menginap di Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan.
- **Hari 3**, lokasi 5: Buka peta. Mobil 1 jam 38 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **4 jam 20 menit**.

TIM 2

- **Hari 1**, lokasi 1: Buka peta. Mobil 23 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **3 jam 5 menit**. Menginap di Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya.
- **Hari 2**, lokasi 2: Buka peta. Mobil 3 jam 50 menit, jalan kaki 33 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 53 menit**.

SEMUA LOKASI, PERGI DAN PULANG KE TITIK AWAL

Buka peta

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

Keterangan lampiran

- Urutan kunjungan per tim dan per hari, dari titik awal ke tiap lokasi.
- Jarak lurus, jarak jalan, waktu mobil, dan jalan kaki dari titik parkir.
- Tautan Google Maps langsung ke titik parkir tiap lokasi.
- Pola yang sama bisa dipakai untuk regu darat di Merauke; halaman aslinya di Lampiran E.
- Dua tim bisa bergerak bersamaan tanpa saling tumpang tindih.

Sumber: *Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran B3. Contoh Kalimantan Tengah: cara uji pompa dan keselamatan regu di petak

Cara uji dan keselamatan

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

Cara uji dan keselamatan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Bila air terdekat dari petak lebih jauh dari 500 m, pompa ditaruh di titik air dekat jalan (titik air SIPPA) dan **satu jalur selang 1,2–1,2 km** digelar ke petak, dengan pompa tambahan di tengah bila hitungan menunjukkan tekanan tidak cukup. Panjang selang dihitung dari jarak lurus ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak.

CARA MENGUJI EFEKTIVITAS, SEMUA LOKASI

1. **Petak:** 4 petak 10 × 10 m di bara yang sama, jarak antarpetak ≥ 10 m. 2 petak disuntik lance (L1, L2), 2 petak disemprot biasa (K1, K2). Posisi diundi.
2. **Suhu tanah** diukur di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm: sebelum, sesudah, dan besoknya (24 jam).
3. **Dianggap padam** bila besoknya semua titik di bawah 40 °C dan tidak ada asap keluar dari tanah. Bandingkan petak lance dengan petak semprot biasa.
4. **Air, waktu, dan bensin** yang dipakai tiap petak dicatat.
5. **Api muncul lagi atau tidak:** dipantau 7 hari lewat titik panas satelit, plus didatangi lagi setelah 3 hari.
6. **Kit dinyatakan bisa dipakai** bila: air sampai ke lance di ≥ 2 sesi, dari tiba sampai air mengalir ≤ 4 jam, tekanan lance ≥ 2 bar bertahan 30 menit, data suhu lengkap ≥ 90%, tidak ada kecelakaan, dan ≥ 95% alat kembali utuh (keputusan 53).
7. Semua dicatat di aplikasi /pipa.

KESELAMATAN, SEMUA LOKASI

- **Lubang bara:** tusuk tanah dengan tongkat sebelum melangkah. Jangan berdiri di tanah yang berasap. Jalan beriringan di jalur yang sudah dicek.
- **Asap:** pakai masker, kerja di arah datang angin, ganti orang tiap 30 menit. Istirahat di udara bersih bila pusing atau mual.
- **Selang bertekanan:** kecilkan gas pompa sebelum melepas sambungan. Jangan berdiri di depan ujung lance saat membuka katup.
- **Api mendekat:** mundur ke arah air atau kanal, bukan ke semak kering. Satu orang khusus mengawasi api dan angin.
- **Di air:** pakai pelampung di tepi kanal dan di perahu. Waspada ular dan buaya. Perahu jangan kelebihan muatan.
- **Panas:** minum 3 liter per orang, kerja berat paling lama 45 menit lalu istirahat. Bensin disimpan ≥ 10 m dari bara.
- HP dan radio terisi penuh. Titik kumpul di ujung jalan, satu kendaraan siaga.

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

Keterangan lampiran

- Cara mengukur efektivitas suntikan air ke bara di tiap lokasi.
- Debit sumber air diukur dulu: paling sedikit **5 liter per detik** untuk satu kit.
- Aturan keselamatan regu: arah angin, jalur keluar, dan batas kerja.
- Keputusan jalan atau tunda diambil sore sebelumnya dari *hotspot* terbaru.
- Alat tambahan per regu tercantum: lance, termometer tusuk, dan bor gambut.

Sumber: *Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

03

Foto Udara dan Berkas Asli Renlap

01 Renlap Rute Udara Merauke 3–6

02 Contoh Renlap Darat SIPPA 7–10

03 Foto Udara dan Berkas Asli Renlap 11–35

Lampiran C. Foto udara lain dari pantauan 31 Oktober

Foto udara lain, 31 Oktober


Lahan terbuka di tepi hutan


Rawa mengering


Petak bergaris hitam bekas api


Sungai di bawah kabut asap


Asap di tepi lahan terbuka


Kepulan asap di hutan


Asap di dekat permukiman


Cuplikan video: banyak kepulan asap

Sumber: *Pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 1 dari 13

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

158
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)

11 check point
hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas

± 250 km
loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km

± 74 menit
pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit



Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
— Rute udara dan arah terbang ···· Segitiga lahan

Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS

	Titik	Koordinat	Titik panas	Jarak tempuh	Waktu
B	**MOPAH** Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	0 km	+0 mnt
1	**CP1** Semangga, Merauke	-8.3843, 140.4365	8	15 km	+3 mnt
2	**CP2** Tanah Miring, Merauke	-8.2609, 140.4783	8	30 km	+8 mnt
3	**CP3** Kurik, Merauke	-8.1716, 140.3878	1	44 km	+13 mnt
4	**CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.9276, 140.5636	29	77 km	+22 mnt
S	**MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya	-7.8850, 140.5950	–	83 km	+25 mnt
5	**CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.8648, 140.5893	60	85 km	+26 mnt
6	**CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)	-7.9388, 140.3734	1	110 km	+33 mnt
7	**CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)	-7.8514, 139.9767	3	155 km	+44 mnt
M	**MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari	-7.8750, 139.9850	–	158 km	+47 mnt
8	**CP8** Animha, Merauke	-8.0099, 140.1024	3	178 km	+51 mnt
9	**CP9** Animha, Merauke	-8.0637, 140.2664	4	197 km	+57 mnt
10	**CP10** Semangga, Merauke	-8.3428, 140.3422	31	229 km	+65 mnt
11	**CP11** Semangga, Merauke	-8.4147, 140.3822	9	238 km	+69 mnt
B	**MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	250 km	+74 mnt

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

TABEL LEG UNTUK PILOT

Leg	Dari ke	Koordinat tujuan (GPS)	Google Maps	Haluan sejati	Jarak	NM	Waktu
1	**MOPAH** ke **CP1**	S08°23.060' E140°26.192'	-8.3843, 140.4365	**008°**	15,3 km	8,2 NM	3 mnt
2	**CP1** ke **CP2**	S08°15.653' E140°28.696'	-8.2609, 140.4783	**018°**	14,5 km	7,8 NM	3 mnt
3	**CP2** ke **CP3**	S08°10.296' E140°23.268'	-8.1716, 140.3878	**315°**	14,1 km	7,6 NM	3 mnt
4	**CP3** ke **CP4**	S07°55.654' E140°33.814'	-7.9276, 140.5636	**036°**	33,3 km	18,0 NM	7 mnt
5	**CP4** ke **MSJ**	S07°53.100' E140°35.700'	-7.8850, 140.5950	**036°**	5,9 km	3,2 NM	1 mnt
6	**MSJ** ke **CP5**	S07°51.887' E140°35.357'	-7.8648, 140.5893	**344°**	2,3 km	1,3 NM	< 1 mnt
7	**CP5** ke **CP6**	S07°56.328' E140°22.404'	-7.9388, 140.3734	**251°**	25,2 km	13,6 NM	5 mnt
8	**CP6** ke **CP7**	S07°51.082' E139°58.602'	-7.8514, 139.9767	**283°**	44,8 km	24,2 NM	9 mnt
9	**CP7** ke **MEDCO**	S07°52.500' E139°59.100'	-7.8750, 139.9850	**161°**	2,8 km	1,5 NM	< 1 mnt
10	**MEDCO** ke **CP8**	S08°00.594' E140°06.142'	-8.0099, 140.1024	**139°**	19,8 km	10,7 NM	4 mnt
11	**CP8** ke **CP9**	S08°03.823' E140°15.987'	-8.0637, 140.2664	**108°**	19,0 km	10,3 NM	4 mnt
12	**CP9** ke **CP10**	S08°20.566' E140°20.533'	-8.3428, 140.3422	**165°**	32,1 km	17,3 NM	7 mnt
13	**CP10** ke **CP11**	S08°24.881' E140°22.933'	-8.4147, 140.3822	**151°**	9,1 km	4,9 NM	2 mnt
14	**CP11** ke **MOPAH**	S08°31.218' E140°25.080'	-8.5203, 140.4180	**161°**	12,4 km	6,7 NM	3 mnt
	Total				**250 km**	**135 NM**	**52 mnt**

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

CARA MEMBACA RUTE

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 3 dari 13

1

CHECK POINT 1 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Semangga, Merauke

8 titik panas 24 jam

+3 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.3843, 140.4365

S08°23.060' E140°26.192'

Buka di Google Maps

Masuk dari MOPAH
008°, 15,3 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP2 -8.2609, 140.4783
018°, 14,5 km, ± 3 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.3871, 140.4380	29/10 13.53	NOAA-20	13,4	0,3 km	–
-8.3880, 140.4345	29/10 13.33	S-NPP	12,9	0,5 km	–
-8.3843, 140.4339	29/10 13.33	S-NPP	12,9	0,3 km	–
-8.3836, 140.4381	29/10 13.33	S-NPP	12,9	0,2 km	–
-8.3883, 140.4371	29/10 13.53	NOAA-20	9,3	0,4 km	–
-8.3827, 140.4361	29/10 13.53	NOAA-20	9,3	0,2 km	–
-8.3816, 140.4371	29/10 13.53	NOAA-20	4,5	0,3 km	–
-8.3827, 140.4354	30/10 00.57	NOAA-20	1,3	0,2 km	–

1 dari 8 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 38.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 4 dari 13


2

CHECK POINT 2 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Tanah Miring, Merauke

8 titik panas 24 jam

+8 menit dari Mopah

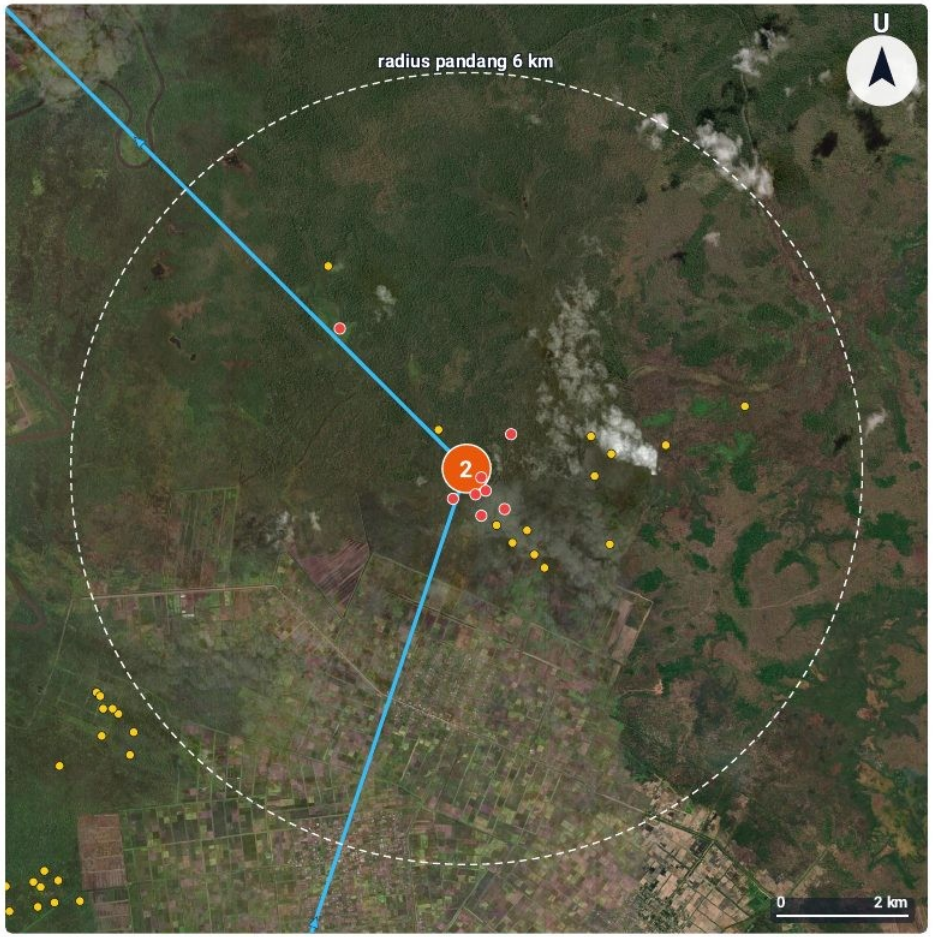

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.2609, 140.4783

S08°15.653' E140°28.696'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP1
018°, 14,5 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP3 -8.1716, 140.3878
315°, 14,1 km, ± 3 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.2639, 140.4809	30/10 00.57	NOAA-20	8,4	0,4 km	–
-8.2644, 140.4795	30/10 00.39	S-NPP	5,7	0,4 km	–
-8.2650, 140.4764	30/10 00.00	NOAA-21	5,6	0,5 km	–
-8.2621, 140.4803	30/10 00.00	NOAA-21	5,0	0,3 km	–
-8.2664, 140.4835	30/10 00.00	NOAA-21	4,0	0,8 km	–
-8.2562, 140.4844	29/10 12.57	NOAA-21	3,4	0,9 km	–
-8.2673, 140.4803	30/10 00.57	NOAA-20	2,2	0,7 km	–
-8.2418, 140.4608	29/10 13.53	NOAA-20	1,8	2,9 km	–

6 dari 8 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 13.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 5 dari 13


3

CHECK POINT 3 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Kurik, Merauke

1 titik panas 24 jam

+13 menit dari Mopah

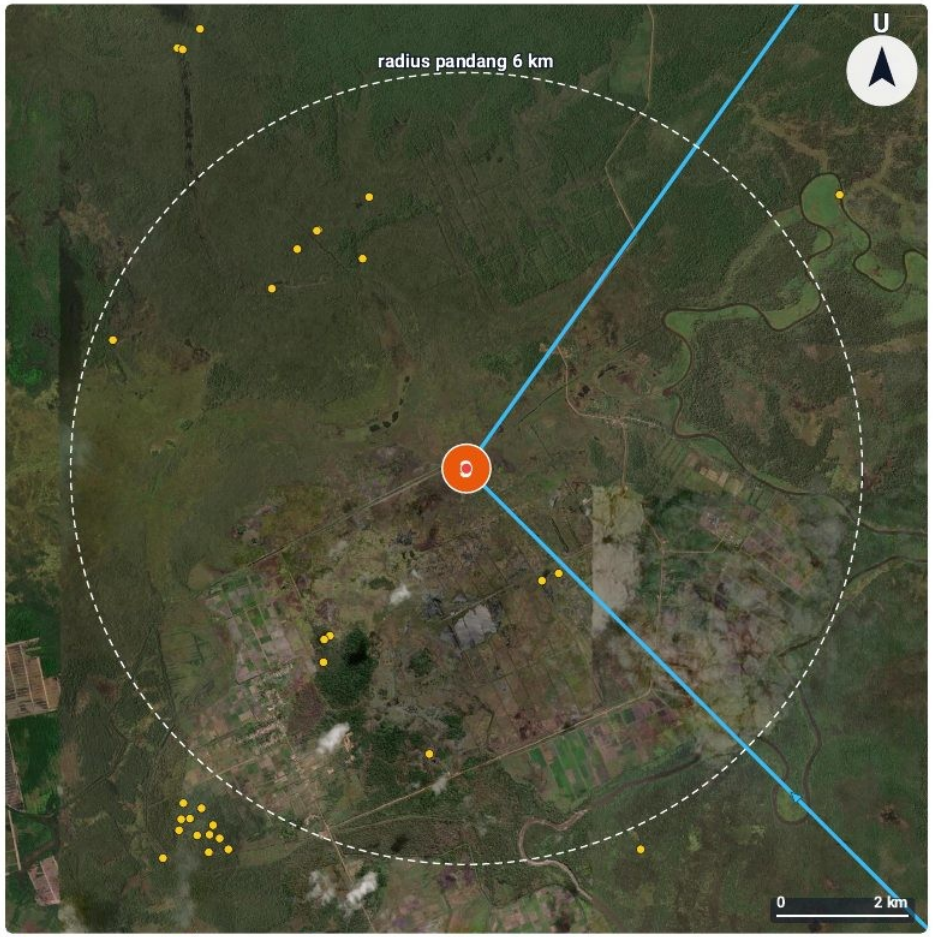

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.1716, 140.3878

S08°10.296' E140°23.268'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP2
315°, 14,1 km, ± 3 mnt

Lanjut ke CP4 -7.9276, 140.5636
036°, 33,3 km, ± 7 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.1716, 140.3878	29/10 13.33	S-NPP	5,8	0,0 km	–

0 dari 1 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 13.


Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 6 dari 13

CHECK POINT 4 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

4 Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)

29 titik panas 24 jam | +22 menit dari Mopah

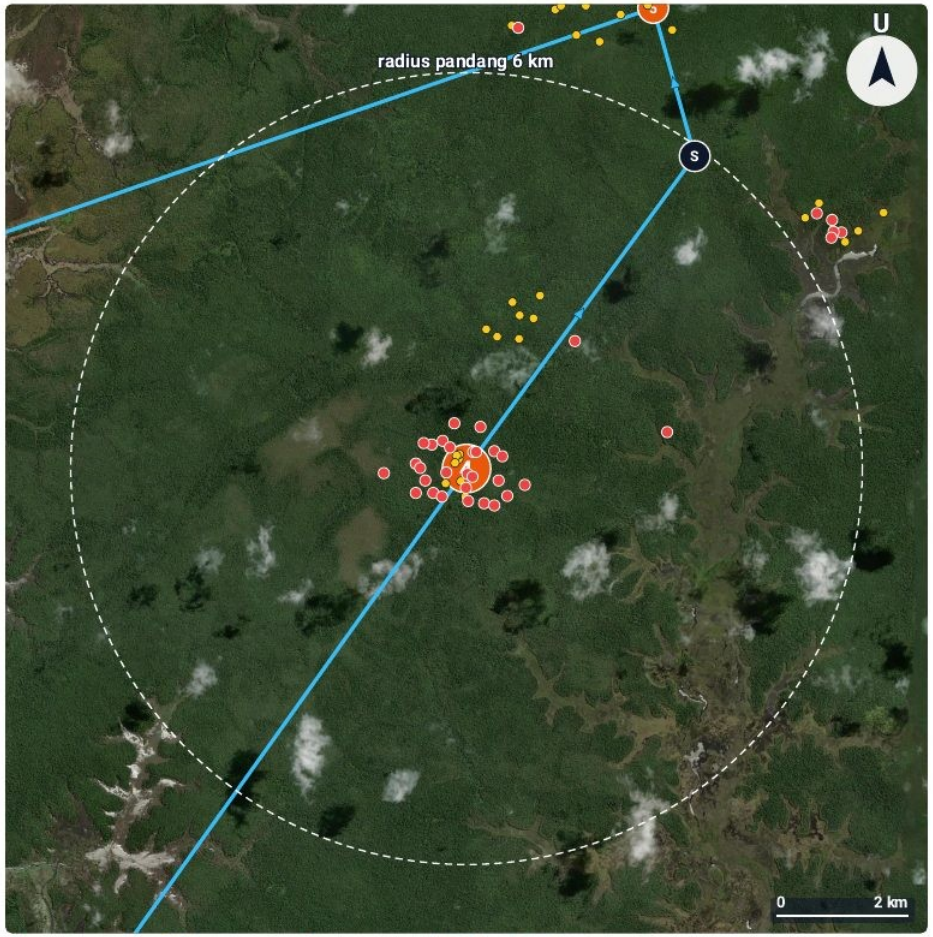

Titik panas 24 jam | 24–48 jam | Check point | — Rute dan arah terbang | Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.9276, 140.5636

S07°55.654' E140°33.814'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP3
036°, 33,3 km, ± 7 mnt

Lanjut ke MSJ -7.8850, 140.5950
036°, 5,9 km, ± 1 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.9283, 140.5637	30/10 00.00	NOAA-21	23,1	0,1 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9269, 140.5566	30/10 00.00	NOAA-21	23,1	0,8 km	–
-7.9323, 140.5660	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9309, 140.5590	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9252, 140.5674	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,5 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9238, 140.5603	30/10 00.00	NOAA-21	12,3	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9302, 140.5635	30/10 00.39	S-NPP	6,6	0,3 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9292, 140.5579	30/10 00.39	S-NPP	6,6	0,7 km	–
-7.9253, 140.5645	30/10 00.39	S-NPP	3,1	0,3 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9243, 140.5588	30/10 00.39	S-NPP	3,1	0,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.9282, 140.5522	30/10 00.39	S-NPP	2,6	1,3 km	–
-7.9326, 140.5674	30/10 00.57	NOAA-20	2,3	0,7 km	PT Merauke Sawit Jaya

dan 17 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

29 dari 29 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 14.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 7 dari 13


5

CHECK POINT 5 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)

60 titik panas 24 jam

+26 menit dari Mopah

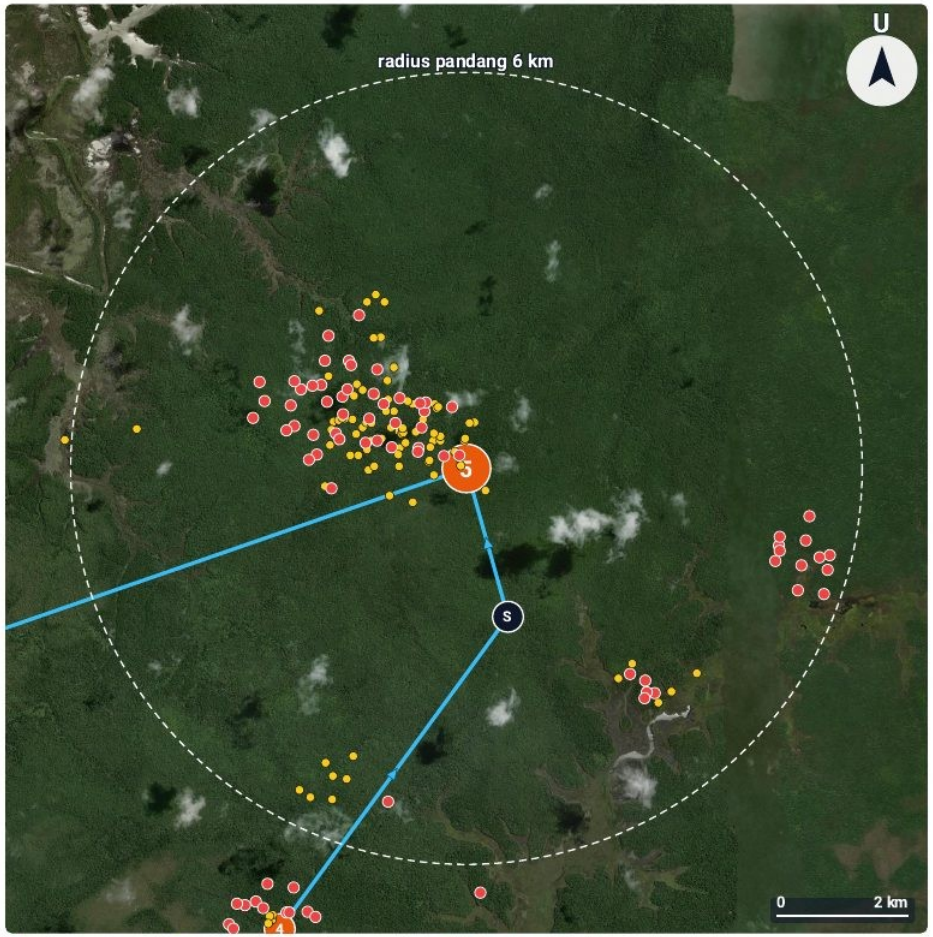

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.8648, 140.5893

S07°51.887' E140°35.357'

Buka di Google Maps

Masuk dari MSJ
344°, 2,3 km, ± < 1 mnt

Lanjut ke CP6 -7.9388, 140.3734
251°, 25,2 km, ± 5 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.8535, 140.5681	30/10 03.00	MODIS	180,7	2,6 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8557, 140.5701	30/10 00.00	NOAA-21	86,0	2,3 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8574, 140.5723	30/10 00.57	NOAA-20	66,5	2,0 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8540, 140.5729	30/10 00.57	NOAA-20	66,5	2,2 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8534, 140.5693	30/10 00.57	NOAA-20	66,5	2,5 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8559, 140.5829	30/10 03.00	MODIS	57,1	1,2 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8600, 140.5713	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,1 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8590, 140.5656	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,7 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8550, 140.5722	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,2 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8540, 140.5665	30/10 00.39	S-NPP	49,6	2,8 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8766, 140.6393	30/10 00.00	NOAA-21	47,7	5,7 km	PT Merauke Sawit Jaya
-7.8753, 140.6323	30/10 00.00	NOAA-21	33,5	4,9 km	PT Merauke Sawit Jaya

dan 48 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

59 dari 60 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 87.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 8 dari 13


6

CHECK POINT 6 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)

1 titik panas 24 jam

+33 menit dari Mopah

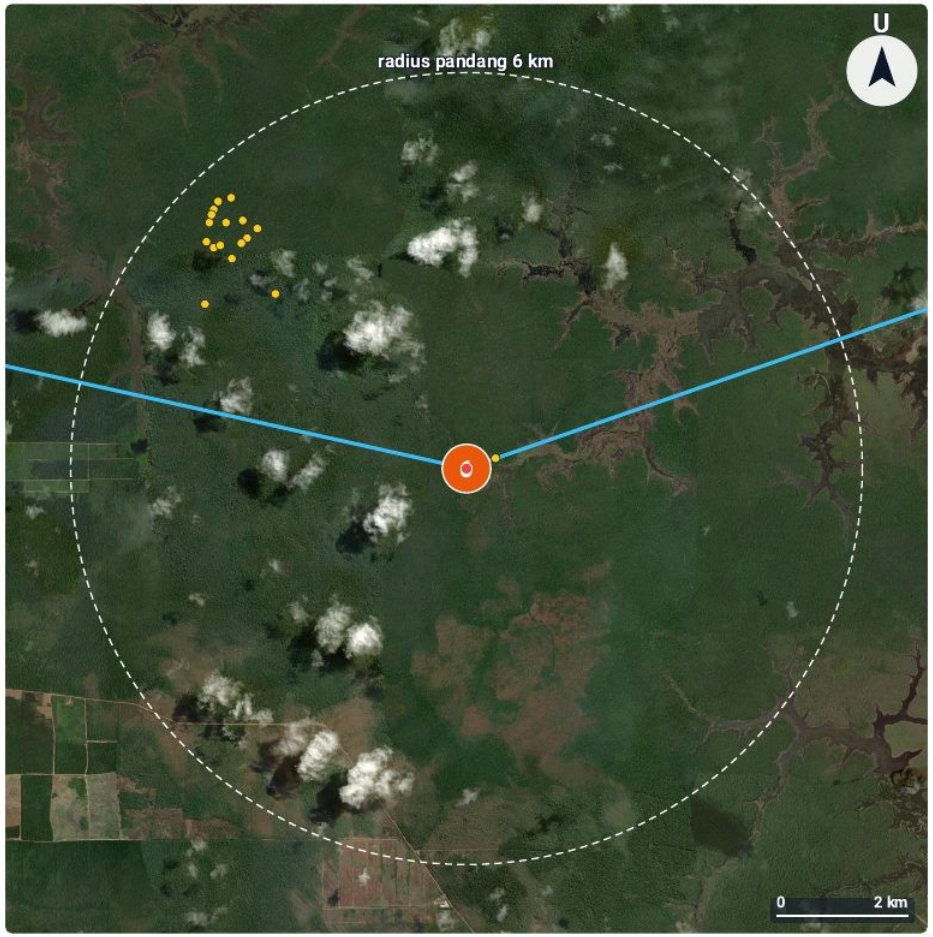

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.9388, 140.3734

S07°56.328' E140°22.404'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP5
251°, 25,2 km, ± 5 mnt

Lanjut ke CP7 -7.8514, 139.9767
283°, 44,8 km, ± 9 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.9388, 140.3734	29/10 13.33	S-NPP	6,1	0,0 km	PT Selaras Inti Semesta

0 dari 1 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 17.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 9 dari 13


7

CHECK POINT 7 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)

3 titik panas 24 jam

+44 menit dari Mopah

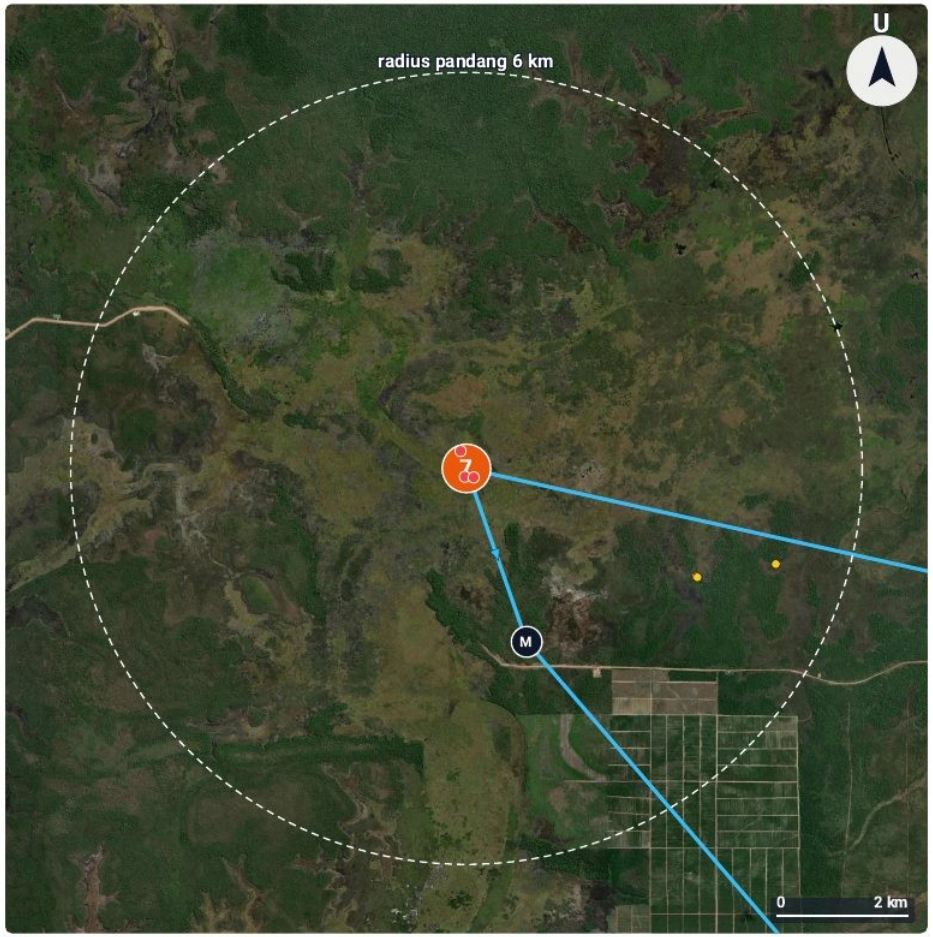

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-7.8514, 139.9767

S07°51.082' E139°58.602'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP6
283°, 44,8 km, ± 9 mnt

Lanjut ke MEDCO -7.8750, 139.9850
161°, 2,8 km, ± < 1 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-7.8526, 139.9777	29/10 13.53	NOAA-20	4,2	0,2 km	PT Medcopapua Alam Lestari
-7.8490, 139.9759	29/10 13.33	S-NPP	3,6	0,3 km	PT Medcopapua Alam Lestari
-7.8525, 139.9765	29/10 13.33	S-NPP	1,2	0,1 km	PT Medcopapua Alam Lestari

0 dari 3 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 3.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 10 dari 13

8

CHECK POINT 8 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Animha, Merauke

3 titik panas 24 jam

+51 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.0099, 140.1024

S08°00.594' E140°06.142'

Buka di Google Maps

Masuk dari MEDCO
139°, 19,8 km, ± 4 mnt

Lanjut ke CP9 -8.0637, 140.2664
108°, 19,0 km, ± 4 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.0031, 140.0915	29/10 13.33	S-NPP	10,7	1,4 km	–
-7.9924, 140.0898	29/10 13.33	S-NPP	5,2	2,4 km	–
-8.0342, 140.1258	29/10 13.33	S-NPP	2,7	3,7 km	–

0 dari 3 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 15.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 11 dari 13


9

CHECK POINT 9 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Animha, Merauke

4 titik panas 24 jam

+57 menit dari Mopah

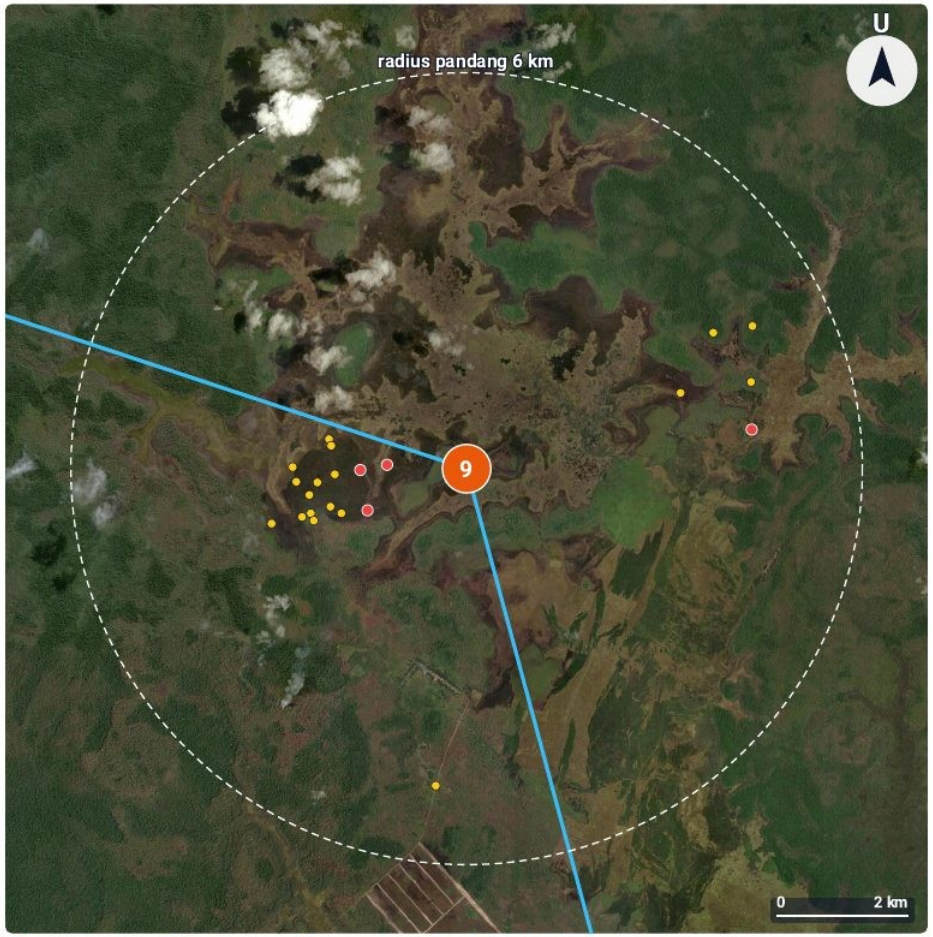

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.0637, 140.2664

S08°03.823' E140°15.987'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP8
108°, 19,0 km, ± 4 mnt

Lanjut ke CP10 -8.3428, 140.3422
165°, 32,1 km, ± 7 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.0639, 140.2518	29/10 13.53	NOAA-20	18,6	1,6 km	–
-8.0632, 140.2555	29/10 13.53	NOAA-20	10,9	1,2 km	–
-8.0694, 140.2528	29/10 13.53	NOAA-20	9,9	1,6 km	–
-8.0584, 140.3057	29/10 13.33	S-NPP	7,0	4,4 km	–

0 dari 4 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 18.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 12 dari 13


10

CHECK POINT 10 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Semangga, Merauke

31 titik panas 24 jam

+65 menit dari Mopah

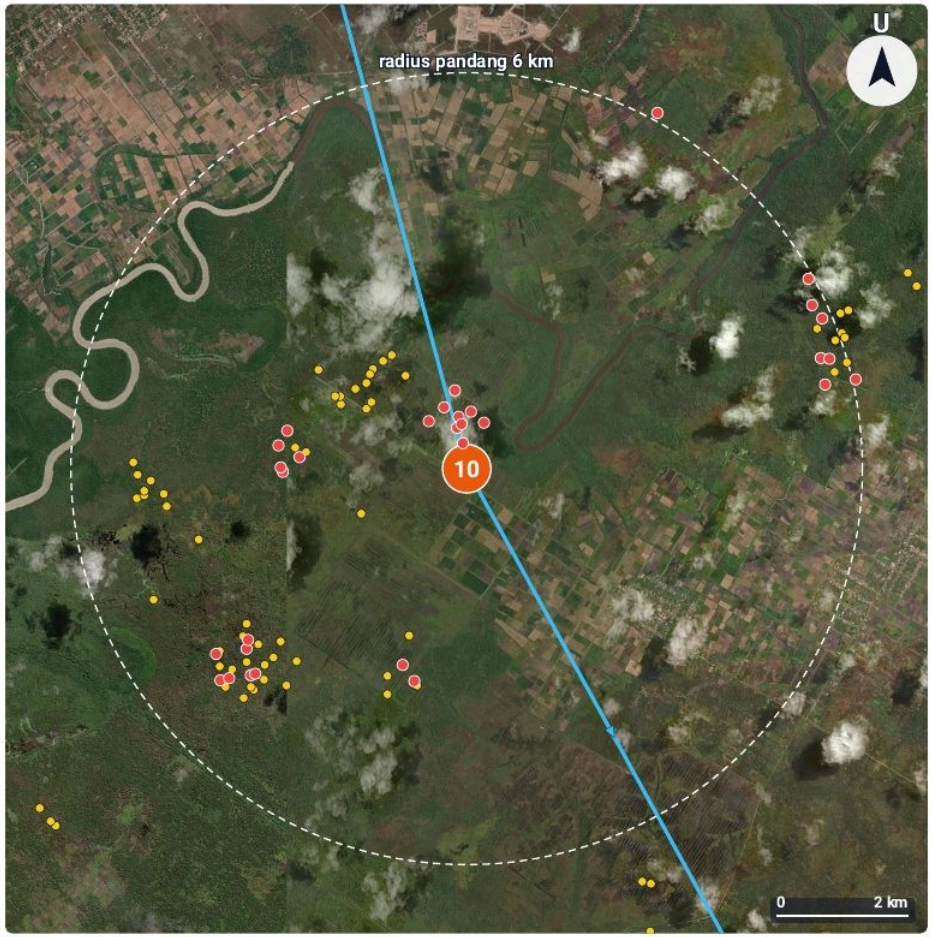

Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.3428, 140.3422

S08°20.566' E140°20.533'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP9
165°, 32,1 km, ± 7 mnt

Lanjut ke CP11 -8.4147, 140.3822
151°, 9,1 km, ± 2 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.3713, 140.3095	29/10 13.53	NOAA-20	13,6	4,8 km	–
-8.3393, 140.3417	29/10 13.33	S-NPP	13,0	0,4 km	–
-8.3357, 140.3411	29/10 13.33	S-NPP	13,0	0,8 km	–
-8.3372, 140.3409	29/10 13.53	NOAA-20	13,0	0,6 km	–
-8.3707, 140.3131	29/10 13.53	NOAA-20	10,9	4,5 km	–
-8.3709, 140.3125	29/10 13.33	S-NPP	9,8	4,5 km	–
-8.3673, 140.3119	29/10 13.33	S-NPP	9,8	4,3 km	–
-8.3661, 140.3121	29/10 13.33	S-NPP	9,0	4,2 km	–
-8.3365, 140.3446	29/10 13.53	NOAA-20	7,4	0,7 km	–
-8.3205, 140.3898	29/10 13.33	S-NPP	7,1	5,8 km	–
-8.3169, 140.3893	29/10 13.33	S-NPP	7,0	5,9 km	–
-8.3313, 140.3916	29/10 13.33	S-NPP	6,5	5,6 km	–

dan 19 titik lain, semua ada di peta dan berkas KML.

7 dari 31 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 51.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran D. Berkas asli renlap rute udara Merauke, 30 Oktober 2026, halaman 13 dari 13

11

CHECK POINT 11 DARI 11, RUTE UDARA KUNKER KASAD DAN KEPALA BNPB

Semangga, Merauke

9 titik panas 24 jam

+69 menit dari Mopah



Titik panas 24 jam · 24–48 jam · Check point · — Rute dan arah terbang · Kotak 14 × 14 km. Klik titik untuk Google Maps.

KOORDINAT CHECK POINT, KLIK UNTUK GOOGLE MAPS

-8.4147, 140.3822

S08°24.881' E140°22.933'

Buka di Google Maps

Masuk dari CP10
151°, 9,1 km, ± 2 mnt

Lanjut ke MOPAH -8.5203, 140.4180
161°, 12,4 km, ± 3 mnt

TITIK PANAS DI SEKITAR CP (6 KM), FRP TERBESAR DULU

Koordinat	WIT	Satelit	FRP, MW	Dari CP	Lahan
-8.4116, 140.3572	29/10 13.33	S-NPP	6,2	2,8 km	–
-8.4143, 140.3547	29/10 13.53	NOAA-20	3,5	3,0 km	–
-8.4138, 140.3558	29/10 13.53	NOAA-20	3,4	2,9 km	–
-8.4308, 140.3987	29/10 13.33	S-NPP	3,1	2,6 km	–
-8.4272, 140.3981	29/10 13.33	S-NPP	3,1	2,2 km	–
-8.4109, 140.3750	30/10 00.57	NOAA-20	2,3	0,9 km	–
-8.4286, 140.3941	30/10 00.39	S-NPP	1,6	2,0 km	–
-8.4118, 140.3786	29/10 13.33	S-NPP	1,4	0,5 km	–
-8.4098, 140.3754	30/10 00.39	S-NPP	0,8	0,9 km	–

3 dari 9 titik terdeteksi malam hari. Titik panas 24–48 jam di sekitar CP: 39.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 1 dan 2 dari 20

BNPB SIPPA, SISTEM PIPA PORTABEL KARHUTLA DAN BANJIR

Pilot Kalimantan Tengah: 5 lokasi, sumber air terdekat

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB
Dossier tim lapangan, 20 halaman

635
titik panas Kalimantan Tengah 31 Okt–1 Nov

Kapuas 213, Pulang Pisau 130
kabupaten terbanyak

3 dari 5
lokasi di dalam peta gambut resmi

3 + 2
lokasi selang pendek dan selang panjang

Kit pompa, selang, dan lance menyuntikkan air ke bara gambut sampai kedalaman 1,5 m. Petak uji ditaruh di **titik panas 24 jam terdekat yang berada di tanah gambut** (cadangan: 48 jam; bila tidak ada, di kompleks), lalu dicari sumber air terdekat untuk titik itu. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan.

5 lokasi, urut sumber air paling dekat ke petak (kondisi 1 November)

	LOKASI, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS	GAMBUT DAN KEDALAMAN	TITIK PANAS 5 KM, 48 JAM	SUMBER AIR DAN SELANG	WAKTU SAMPAI PETAK	UNTUK UJI APA
1	**Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya** Kompleks K0166 Petak uji -2.3154, 114.0295 Pompa -2.3147, 114.0298 Parkir -2.2942, 114.0206	Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m	**10** 4 dalam 24 jam	kanal, 80 m dari petak selang 159 m, 10 gulung	**± 80 menit** dari Daops Palangkaraya, jalan kaki 2,9 km	**Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek** Paling dekat Daops dan sedang ada api; kanal tepat di sebelah petak. Paling cocok untuk uji utama.
2	**Mendawai, Mendawai, Katingan** Kompleks K0107 Petak latihan -2.9901, 113.3133 Pompa -2.9908, 113.3116 Parkir -2.9829, 113.3166	Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor	**12** 5 dalam 24 jam	kanal, 210 m dari petak selang 306 m, 18 gulung	**± 57 menit** dari Desa Mendawai, jalan kaki 1,0 km	**Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api** Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 57 menit dari Desa Mendawai.
3	**Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas** Kompleks K3573 Petak latihan -2.0183, 114.3732 Pompa -2.0173, 114.3750 Turun perahu -2.0092, 114.3832	Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor	**14** 9 dalam 24 jam	kanal, 230 m dari petak selang 333 m, 19 gulung	**± 141 menit** dari Desa Sei Gawing, jalan kaki 1,7 km	**Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api** Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 141 menit dari Desa Sei Gawing.
4	**Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan** Kompleks K0672 Petak latihan -1.4949, 114.8119 Pompa -1.4940, 114.8204 Parkir -1.5130, 114.8118	Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor	**6** 5 dalam 24 jam	parit, 950 m dari petak selang 1.198 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan	**± 36 menit** dari Desa Pendang, jalan kaki 2,3 km	**Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan** Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 36 menit dari Desa Pendang.
5	**Batapah, Timpah, Kapuas** Kompleks K1674 Petak latihan -1.4848, 114.5812 Pompa -1.4838, 114.5727 Parkir -1.4863, 114.5787	Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor	**7** 5 dalam 24 jam	sungai, 950 m dari petak selang 1.197 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan	**± 67 menit** dari Desa Lungkuh Layang, jalan kaki 0,4 km	**Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan** Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 67 menit dari Desa Lungkuh Layang.

CEK GAMBUT

3 dari 5 lokasi berada di dalam peta gambut resmi 1:250.000 (Kementan, lewat PRIMS BRGM). Lokasi 4, 5 tidak tercatat di peta itu, jadi periksa dulu apakah benar gambut. Peta itu **tidak mencantumkan kedalaman**, jadi kedalaman gambut di tiap lokasi **wajib dibor** sebelum petak dipasang.

Aturan ganti: tiap petak dibor saat survei. Kalau gambutnya kurang dari 50 cm (bukan gambut) atau kurang dari 1 m (lance tembus ke tanah biasa), petak dipindah ke titik panas berikutnya dan alasannya dicatat.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Cara memilih: api masih terdeteksi 24 jam terakhir, bukan tambang atau industri, dan sumber air paling jauh 1 km dari petak, lalu diurutkan dari sumber air terdekat (80 m sampai 950 m). Mantangai Tumbang Mangkutup paling lama bertahan (69 titik panas dalam 72 jam) tetapi petaknya di gambut 4,3 km dari air, jadi dikeluarkan.
2. Kalimantan Tengah menyala lagi: 635 titik panas dalam 2 hari terakhir, terbanyak Kapuas (213) dan Pulang Pisau (130). Api Pulang Pisau belum punya kompleks SIPPA terdekat, jadi belum masuk renlap ini.
3. Dua tim dari Palangka Raya, rinciannya di halaman Rencana kunjungan.
4. Sumber air lokasi 1 sampai 4 berupa kanal atau parit: ukur debit dulu (paling sedikit 5 liter per detik untuk satu kit) sebelum memasang pompa.
5. Regu dan pompa: Manggala Agni Daops Palangkaraya atau BPBD kabupaten. Izin kepala desa; tiap sore H-1 diputuskan jalan atau tidak dari titik panas 24 jam terakhir. Alat tambahan: 2 lance, 2 termometer tusuk, 1 bor gambut.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian per kawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

Rencana kunjungan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Titik awal -2.2096, 113.9135. Urutan tabel adalah urutan kunjungan per tim dan hari. Nomor lokasi sama dengan nomor di halaman lokasi. Tautan Google Maps berangkat dari titik awal (hari berikutnya dari lokasi terakhir hari sebelumnya) dan menuju titik parkir tiap lokasi.

TIM	HARI	LOKASI	NAMA	TITIK PANAS 24 JAM	JARAK LURUS DARI TITIK AWAL	JARAK JALAN DARI TITIK SEBELUMNYA	WAKTU MOBIL DARI TITIK SEBELUMNYA	JALAN KAKI DARI PARKIR
1	1	3	**Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas** Kompleks K3573	9	55,3 km	135,5 km	2 jam 28 menit	2,0 km
1	2	4	**Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan** Kompleks K0672	5	127,6 km	105,6 km	2 jam 12 menit	2,6 km
1	3	5	**Batapah, Timpah, Kapuas** Kompleks K1674	5	109,6 km	65,6 km	1 jam 38 menit	0,4 km
2	1	1	**Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya** Kompleks K0166	4	15,4 km	20,9 km	23 menit	0,4 km
2	2	2	**Mendawai, Mendawai, Katingan** Kompleks K0107	5	109,4 km	153,2 km (perkiraan)	3 jam 50 menit (perkiraan)	1,1 km

TIM 1

- **Hari 1**, lokasi 3: Buka peta. Mobil 2 jam 28 menit, jalan kaki 1 jam 0 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **5 jam 58 menit**. Menginap di Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas.
- **Hari 2**, lokasi 4: Buka peta. Mobil 2 jam 12 menit, jalan kaki 1 jam 18 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 0 menit**. Menginap di Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan.
- **Hari 3**, lokasi 5: Buka peta. Mobil 1 jam 38 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **4 jam 20 menit**.

TIM 2

- **Hari 1**, lokasi 1: Buka peta. Mobil 23 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **3 jam 5 menit**. Menginap di Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya.
- **Hari 2**, lokasi 2: Buka peta. Mobil 3 jam 50 menit, jalan kaki 33 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 53 menit**.

SEMUA LOKASI, PERGI DAN PULANG KE TITIK AWAL

Buka peta

Waktu dan jarak jalan dari OSRM (OpenStreetMap), atau perkiraan garis lurus × 1,4 pada 40 km/jam bila bertanda perkiraan. Tambah 30 sampai 50% untuk jalan kebun, feri, dan istirahat. Jalan kaki dihitung pergi-pulang 4 km/jam; 150 menit per lokasi adalah asumsi, bukan hasil ukur.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 3 dan 4 dari 20

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

Cara uji dan keselamatan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Bila air terdekat dari petak lebih jauh dari 500 m, pompa ditaruh di titik air dekat jalan (titik air SIPPA) dan **satu jalur selang 1,2–1,2 km** digelar ke petak, dengan pompa tambahan di tengah bila hitungan menunjukkan tekanan tidak cukup. Panjang selang dihitung dari jarak lurus ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak.

CARA MENGUJI EFEKTIVITAS, SEMUA LOKASI

1. **Petak:** 4 petak 10 × 10 m di bara yang sama, jarak antarpetak ≥ 10 m. 2 petak disuntik lance (L1, L2), 2 petak disemprot biasa (K1, K2). Posisi diundi.
2. **Suhu tanah** diukur di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm: sebelum, sesudah, dan besoknya (24 jam).
3. **Dianggap padam** bila besoknya semua titik di bawah 40 °C dan tidak ada asap keluar dari tanah. Bandingkan petak lance dengan petak semprot biasa.
4. **Air, waktu, dan bensin** yang dipakai tiap petak dicatat.
5. **Api muncul lagi atau tidak:** dipantau 7 hari lewat titik panas satelit, plus didatangi lagi setelah 3 hari.
6. **Kit dinyatakan bisa dipakai** bila: air sampai ke lance di ≥ 2 sesi, dari tiba sampai air mengalir ≤ 4 jam, tekanan lance ≥ 2 bar bertahan 30 menit, data suhu lengkap ≥ 90%, tidak ada kecelakaan, dan ≥ 95% alat kembali utuh (keputusan 53).
7. Semua dicatat di aplikasi /pipa.

KESELAMATAN, SEMUA LOKASI

- **Lubang bara:** tusuk tanah dengan tongkat sebelum melangkah. Jangan berdiri di tanah yang berasap. Jalan beriringan di jalur yang sudah dicek.
- **Asap:** pakai masker, kerja di arah datang angin, ganti orang tiap 30 menit. Istirahat di udara bersih bila pusing atau mual.
- **Selang bertekanan:** kecilkan gas pompa sebelum melepas sambungan. Jangan berdiri di depan ujung lance saat membuka katup.
- **Api mendekat:** mundur ke arah air atau kanal, bukan ke semak kering. Satu orang khusus mengawasi api dan angin.
- **Di air:** pakai pelampung di tepi kanal dan di perahu. Waspada ular dan buaya. Perahu jangan kelebihan muatan.
- **Panas:** minum 3 liter per orang, kerja berat paling lama 45 menit lalu istirahat. Bensin disimpan ≥ 10 m dari bara.
- HP dan radio terisi penuh. Titik kumpul di ujung jalan, satu kendaraan siaga.


Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian per kawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

LOKASI 1 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

1 Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya

UNTUK: **Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek**

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

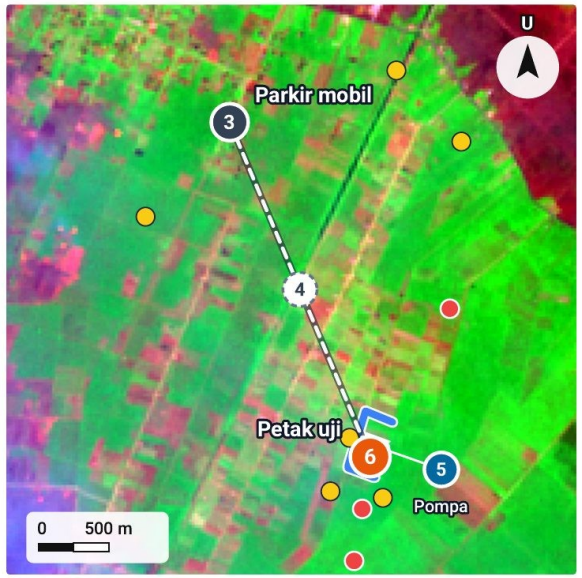

Petak uji · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Sumber air · Parkir mobil atau turun perahu
Jalan kaki · Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam

WARNA CITRA — **Oranye terang** = api atau bara · **Merah tua sampai ungu** = bekas terbakar · **Hijau** = tumbuhan · **Putih kebiruan** = awan atau asap · **Gelap** = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2B, 11 Sep 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

4	10	0,7
titik panas 24 jam	titik panas 48 jam	km titik panas terdekat

Kebakaran terdekat: 0,7 km, Kec. Sabangau, sudah 1 hari, ± 21 ha

CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

Kekeringan gambut (DC): 264
Suhu, kelembapan, angin: 32,6 °C, 57%, 4,9 km/jam

Prakiraan	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11
Hujan, mm	0	8	2	2	8	6	11
Peluang, %	29	96	73	86	90	66	77

LAHAN DAN RIWAYAT

Gambut	**Ya**, di peta gambut resmi 1:250.000; kedalaman: Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m
Tahun ada api	**7** dari 14 tahun (2012–2025)
Desa	Kalampangan, Kec. Sabangau
Kesatuan hidrologis gambut	Sungai Kahayan - Sungai Sebangau

ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Daops Palangkaraya
   -2.2073, 113.9164
2. **Naik mobil 29 menit** ke ujung jalan: 20,5 km, 2 menit jalan kampung, 4 menit jalan tanah (licin bila hujan), 23 menit jalan besar.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.2942, 114.0206
4. **Jalan kaki 51 menit** ± 2,9 km ke arah tenggara.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 80 m dari petak
   -2.3147, 114.0298
6. **Sampai di petak uji** gelar selang ± 159 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.3154, 114.0295

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 5 dan 6 dari 20

1


LOKASI 1 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya

UNTUK
Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

PETA RUTE

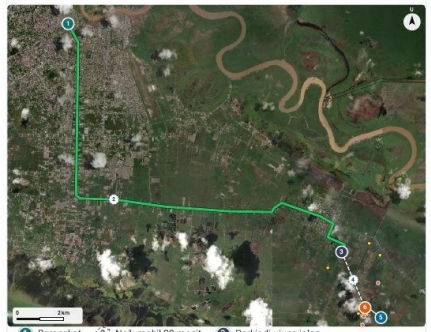

NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI



Naik-turun ± 1 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

ALUR PERJALANAN, ± 80 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Daops Palangkaraya
   -2.2073, 113.9164
2. **Naik mobil 29 menit** ke ujung jalan: 20,5 km, 2 menit jalan kampung, 4 menit jalan tanah (licin bila hujan), 23 menit jalan besar.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.2942, 114.0206
4. **Jalan kaki 51 menit** ± 2,9 km ke arah tenggara.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 80 m dari petak
   -2.3147, 114.0298
6. **Sampai di petak uji** gelar selang ± 159 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.3154, 114.0295

Api ada ± 1 km di sebelah timur ujung jalan, di sepanjang kanal.

TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air kanal dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Kalau ada sekat kanal BRGM di dekat petak, ambil air di sisi hulu sekat. Jangan bongkar sekatnya.
- Taruh petak semprot biasa di sisi kanal yang sama supaya perbandingannya adil.

BARANG YANG DIBAWA

Barang	Jumlah	Catatan
Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit	1 unit	
Selang isap 3 m dengan saringan	1	Saringan jangan sampai menyentuh lumpur
Selang 2,5 inci, 20 m per gulung	10 gulung	Sudah termasuk 2 gulung cadangan
Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci)	1	Satu cabang ke lance, satu ke nozzle
Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m	2 (boleh sampai 8)	Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan
Nozzle semprot biasa	1	Untuk petak pembanding
Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m	2	Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya
Bor gambut	1	Ukur tebal gambut di tiap petak
Meteran 50 m, patok, tali rafia	1, 16 patok, 1 gulung	Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m
HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas	1 set	Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang
Bensin	20 liter	Pompa memakai 2–5 liter per jam
Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape	1 set	Untuk perbaikan kecil di lokasi
Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot	1 per orang	Wajib dipakai selama di lokasi
Kotak P3K dan air minum	1 kotak, 3 liter per orang	

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

1

LOKASI 1 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya

UNTUK
Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK



Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi kanal, 80 m dari petak. Dari pompa cukup **satu jalur selang ± 159 m (10 gulung)** ke petak. Tidak perlu pompa tambahan. Tekanan yang sampai di lance masih besar (± 7 bar), jadi buka katup pelan-pelan dan jaga di 2–3 bar.


Pilihan pasang	Tekanan di pompa	Sisa tekanan di lance	Air sampai	Bensin per jam	Hasil hitung
2 lance + 1 nozzle (alat minimum)	4,0 bar	7,0 bar	2 menit	1,3 L	Layak
8 lance (uji penuh)	4,4 bar	6,6 bar	2 menit	1,9 L	Layak

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Datar. Beda tinggi kanal dan petak kurang dari 1 m, jadi pompa tidak perlu mendorong air menanjak.

URUTAN KERJA

1	**Sehari sebelumnya**	Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan.
2	**Begitu tiba**	Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap.
3	**Pasang petak**	Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut.
4	**Ukur sebelum**	Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah.
5	**Pasang pompa dan selang**	Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak.
6	**Alirkan air**	Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit.
7	**Suntik dan semprot**	Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya.
8	**Ukur sesudah**	Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor).
9	**Bongkar**	Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang.

TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)



Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 0,0 m (paling tinggi 0,0 m); hitungan memakai 0,5 m. Total head pompa ± 45 m (4,4 bar): naik 0,5 m, gesekan selang 9 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

TANTANGAN

- Ada kebakaran besar 2,5 km ke tenggara yang sudah 7 hari menyala. Asapnya bisa terbawa angin ke petak.
- Bara di sini kemungkinan dalam (perkiraan 15–51 cm, gambut lebih dari 3 m). Lance 1,5 m belum tentu sampai dasar bara.
- Letak kanal di peta bisa meleset puluhan meter, dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui.
- Sekitarnya kebun dan ladang warga: minta izin pemilik lahan sebelum menusuk tanah.

YANG MEMUDAHKAN

- 29 menit naik mobil dari Daops Palangkaraya, sebagian besar lewat jalan besar.
- Kanal tepat di sebelah petak: selang pendek, air sampai dalam 1 menit.
- Ada 13 sumur bor BRGM dalam 3 km, yang terdekat 0,4 km. Bisa jadi cadangan air bila kanal kering (perlu pompa celup).
- Dekat pemukiman Kalampangan: bensin dan bantuan mudah didapat.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 7 dan 8 dari 20


2

LOKASI 2 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

Mendawai, Mendawai, Katingan

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

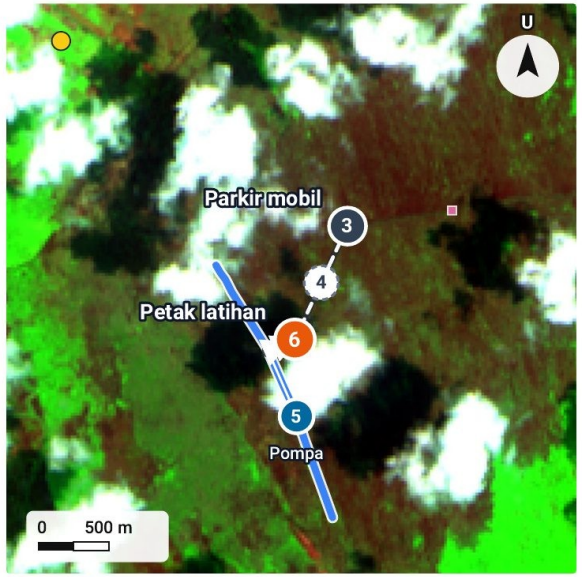

Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Sumber air · Parkir mobil atau turun perahu · Jalan kaki · Titik panas 24–48 jam · Sumur bor atau sekat kanal BRGM

WARNA CITRA — Oranye terang = api atau bara · Merah tua sampai ungu = bekas terbakar · Hijau = tumbuhan · Putih kebiruan = awan atau asap · Gelap = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2C, 29 Okt 2026 pukul 09.58 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

5	12	2,7
titik panas 24 jam	titik panas 48 jam	km titik panas terdekat

Petak	**Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini
Kebakaran terdekat	2,7 km, Kec. Mendawai, sudah 1 hari, ± 10 ha

CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

Kekeringan gambut (DC)	**397**, sangat kering (di atas 350)
Suhu, kelembapan, angin	31,5 °C, 61%, 6,7 km/jam

Prakiraan	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11
Hujan, mm	0	6	3	2	11	1	9
Peluang, %	47	100	92	100	100	96	85

LAHAN DAN RIWAYAT

Gambut	**Ya**, di peta gambut resmi 1:250.000; kedalaman: Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor
Tahun ada api	**2** dari 14 tahun (2012–2025)
Desa	Mendawai, Kec. Mendawai
Kesatuan hidrologis gambut	Sungai Katingan - Sungai Sebangau

ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Mendawai
   -2.9289, 113.3943
2. **Naik mobil 41 menit** ke ujung jalan: 0,9 km, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta, 3 menit jalan tanah (licin bila hujan).
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.9829, 113.3166
4. **Jalan kaki 16 menit** ± 1,0 km ke arah barat daya.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 210 m dari petak
   -2.9908, 113.3116
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 306 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.9901, 113.3133

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

2

LOKASI 2 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

Mendawai, Mendawai, Katingan

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api


BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

PETA RUTE



1 Berangkat · 2 Naik mobil 41 menit · 3 Parkir di ujung jalan · 4 Jalan kaki 16 menit · 5 Pasang pompa di tepi air · 6 Sampai di petak latihan · Rute mobil atau perahu · Jalan kaki · Titik panas

NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI



Naik-turun ± 4 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

ALUR PERJALANAN, ± 57 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Mendawai
   -2.9289, 113.3943
2. **Naik mobil 41 menit** ke ujung jalan: 0,9 km, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta, 3 menit jalan tanah (licin bila hujan).
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.9829, 113.3166
4. **Jalan kaki 16 menit** ± 1,0 km ke arah barat daya.
5. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 210 m dari petak
   -2.9908, 113.3116
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 306 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.9901, 113.3133

Sebagian jalan tanah perlu dicek dulu; tanya warga.

TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Kalau ada sekat kanal BRGM di dekat petak, ambil air di sisi hulu sekat. Jangan bongkar sekatnya.

BARANG YANG DIBAWA

Barang	Jumlah	Catatan
Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit	1 unit	
Selang isap 3 m dengan saringan	1	Saringan jangan sampai menyentuh lumpur
Selang 2,5 inci, 20 m per gulung	18 gulung	Sudah termasuk 2 gulung cadangan
Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci)	1	Satu cabang ke lance, satu ke nozzle
Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m	2 (boleh sampai 8)	Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan
Nozzle semprot biasa	1	Untuk petak pembanding
Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m	2	Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya
Bor gambut	1	Ukur tebal gambut di tiap petak
Meteran 50 m, patok, tali rafia	1, 16 patok, 1 gulung	Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m
HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas	1 set	Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang
Bensin	20 liter	Pompa memakai 2–5 liter per jam
Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape	1 set	Untuk perbaikan kecil di lokasi
Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot	1 per orang	Wajib dipakai selama di lokasi
Kotak P3K dan air minum	1 kotak, 3 liter per orang	

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 9 dan 10 dari 20


LOKASI 2 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

2 Mendawai, Mendawai, Katingan

UNTUK: Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK

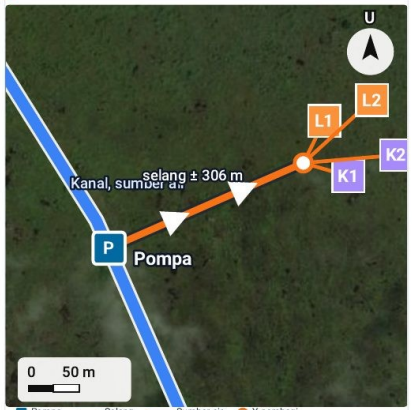

Pompa · Selang · Sumber air · Y-pembagi
Petak lance L1, L2 · Petak semprot biasa K1, K2 · Titik panas

Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi kanal, 210 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 306 m (18 gulung)** ke petak. Satu pompa cukup, tidak perlu pompa tambahan. Tekanan sisa di lance ± 6 bar; buka katup pelan-pelan dan jaga di 2–3 bar.

Pilihan pasang	Tekanan di pompa	Sisa tekanan di lance	Air sampai	Bensin per jam	Hasil hitung
2 lance + 1 nozzle (alat minimum)	4,5 bar	6,5 bar	4 menit	1,4 L	Layak
8 lance (uji penuh)	5,2 bar	5,8 bar	3 menit	2,2 L	Layak

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 5 m dan air ± 6 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

URUTAN KERJA

1	**Sehari sebelumnya**	Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan.
2	**Begitu tiba**	Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap.
3	**Pasang petak**	Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut.
4	**Ukur sebelum**	Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah.
5	**Pasang pompa dan selang**	Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak.
6	**Alirkan air**	Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit.
7	**Suntik dan semprot**	Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya.
8	**Ukur sesudah**	Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor).
9	**Bongkar**	Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang.

TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)



Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 0,0 m (paling tinggi 0,0 m); hitungan memakai 0,5 m. Total head pompa ± **53 m** (5,2 bar): naik 0,5 m, gesekan selang 18 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

TANTANGAN

- Gambut sangat kering (indeks kekeringan DC 397); bara mudah menjalar sampai ke bawah petak pembanding.
- Hujan diprakirakan 11 mm pada 5/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 11,3 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

YANG MEMUDAHKAN

- Air hanya 210 m dari petak: selang pendek, air sampai dalam hitungan menit.
- BRGM mencatat 7 sumur bor atau sekat kanal dalam 3 km dari titik kompleks, yang terdekat ke petak 1,4 km. Bisa jadi cadangan air.


Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

LOKASI 3 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

3 Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas

UNTUK: Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

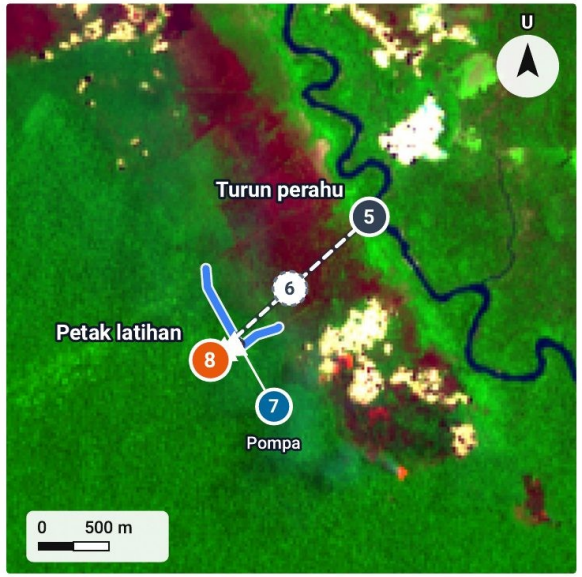

Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Sumber air · Parkir mobil atau turun perahu
Jalan kaki

WARNA CITRA — **Oranye terang** = api atau bara · **Merah tua sampai ungu** = bekas terbakar · **Hijau** = tumbuhan · **Putih kebiruan** = awan atau asap · **Gelap** = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2B, 11 Sep 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

9	14	3,4
titik panas 24 jam	titik panas 48 jam	km titik panas terdekat

Petak	**Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini
Kebakaran terdekat	4,1 km, Kec. Mantangai, sudah 3 hari, ± 132 ha

CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

Kekeringan gambut (DC)	264
Suhu, kelembapan, angin	32,6 °C, 57%, 4,9 km/jam

Prakiraan	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11
Hujan, mm	0	14	2	2	8	4	10
Peluang, %	25	91	76	81	85	73	83

LAHAN DAN RIWAYAT

Gambut	**Ya**, di peta gambut resmi 1:250.000; kedalaman: Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor
Tahun ada api	**4** dari 14 tahun (2012–2025)
Desa	Tumbang Muroi, Kec. Mantangai
Kesatuan hidrologis gambut	Sungai Kapuas - Sungai Mangkutup

ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Sei Gawing
   -1.7911, 114.2580
2. **Naik mobil 80 menit** ke dermaga: 17,5 km, 42 menit jalan kampung, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Naik perahu di dermaga** pindahkan alat dari mobil ke perahu
4. **Naik perahu 36 menit** 9,1 km lewat sungai dan kanal.
5. **Turun perahu** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.0092, 114.3832
6. **Jalan kaki 25 menit** ± 1,7 km ke arah barat daya.
7. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 230 m dari petak
   -2.0173, 114.3750
8. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 333 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.0183, 114.3732

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 11 dan 12 dari 20

3


LOKASI 3 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

PETA RUTE

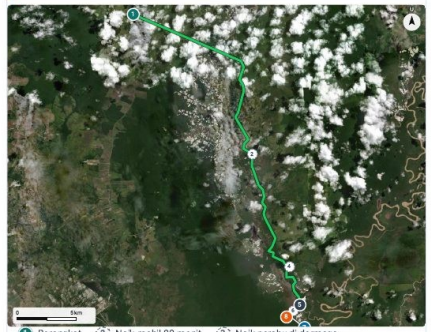

1 Berangkat · 2 Naik mobil 80 menit · 3 Naik perahu di dermaga
4 Naik perahu 36 menit · 5 Turun perahu · 6 Jalan kaki 25 menit
7 Pasang pompa di tepi air · 8 Sampai di petak latihan
Rute mobil atau perahu · Jalan kaki · Titik panas

NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI



Naik-turun ± 20 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

ALUR PERJALANAN, ± 141 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Sei Gawing
   -1.7911, 114.2580
2. **Naik mobil 80 menit** ke dermaga: 17,5 km, 42 menit jalan kampung, 38 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Naik perahu di dermaga** pindahkan alat dari mobil ke perahu
4. **Naik perahu 36 menit** 9,1 km lewat sungai dan kanal.
5. **Turun perahu** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -2.0092, 114.3832
6. **Jalan kaki 25 menit** ± 1,7 km ke arah barat daya.
7. **Pasang pompa di tepi air** kanal, 230 m dari petak
   -2.0173, 114.3750
8. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 333 m dari pompa, pasang 4 petak
   -2.0183, 114.3732

Bagian akhir lewat perahu (36 menit); titik turun perahu di peta adalah perkiraan model.

TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Ikat pompa di lantai perahu. Tiap orang pakai pelampung.
- Bagi tim jadi 2 kelompok: selang dibawa duluan, pompa terakhir. Pasang pita penanda di jalur kaki untuk jalan pulang saat asap tebal.

BARANG YANG DIBAWA

Barang	Jumlah	Catatan
Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit	1 unit	
Selang isap 3 m dengan saringan	1	Saringan jangan sampai menyentuh lumpur
Selang 2,5 inci, 20 m per gulung	19 gulung	Sudah termasuk 2 gulung cadangan
Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci)	1	Satu cabang ke lance, satu ke nozzle
Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m	2 (boleh sampai 8)	Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan
Nozzle semprot biasa	1	Untuk petak pembanding
Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m	2	Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya
Bor gambut	1	Ukur tebal gambut di tiap petak
Meteran 50 m, patok, tali rafia	1, 16 patok, 1 gulung	Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m
HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas	1 set	Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang
Bensin	20 liter	Pompa memakai 2–5 liter per jam
Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape	1 set	Untuk perbaikan kecil di lokasi
Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot	1 per orang	Wajib dipakai selama di lokasi
Kotak P3K dan air minum	1 kotak, 3 liter per orang	

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

3


LOKASI 3 DARI 5, SELANG PENDEK, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas

UNTUK
Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK

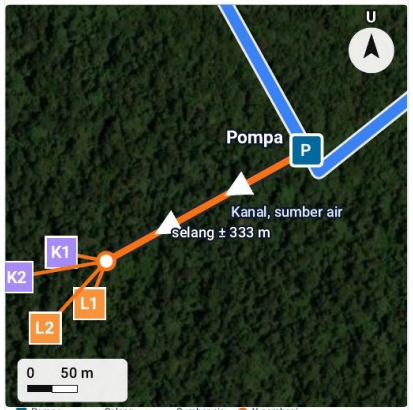

Pompa · Selang · Sumber air · Y-pembagi
Petak lance L1, L2 · Petak semprot biasa K1, K2 · Titik panas

Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi kanal, 230 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 333 m (19 gulung)** ke petak. Satu pompa cukup, tidak perlu pompa tambahan. Tekanan sisa di lance ± 4 bar; buka katup pelan-pelan dan jaga di 2–3 bar.

Pilihan pasang	Tekanan di pompa	Sisa tekanan di lance	Air sampai	Bensin per jam	Hasil hitung
2 lance + 1 nozzle (alat minimum)	6,2 bar	4,8 bar	4 menit	2,0 L	Layak
8 lance (uji penuh)	7,0 bar	4,0 bar	3 menit	3,0 L	Layak

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 23 m dan air ± 5 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

URUTAN KERJA

1	**Sehari sebelumnya**	Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan.
2	**Begitu tiba**	Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap.
3	**Pasang petak**	Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut.
4	**Ukur sebelum**	Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah.
5	**Pasang pompa dan selang**	Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak.
6	**Alirkan air**	Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit.
7	**Suntik dan semprot**	Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya.
8	**Ukur sesudah**	Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor).
9	**Bongkar**	Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang.

TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)



Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 17,0 m (paling tinggi 17,0 m); hitungan memakai 17,0 m. Total head pompa ± 72 m (7,0 bar): naik 17,0 m, gesekan selang 20 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

TANTANGAN

- Jalan kaki 1,7 km (25 menit) dari ujung jalan ke petak sambil membawa alat; siapkan pengangkut tambahan.
- Hujan diprakirakan 14 mm pada 2/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 5,0 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

YANG MEMUDAHKAN

- Air hanya 230 m dari petak: selang pendek, air sampai dalam hitungan menit.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.


Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 13 dan 14 dari 20

4 LOKASI 4 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan

UNTUK Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

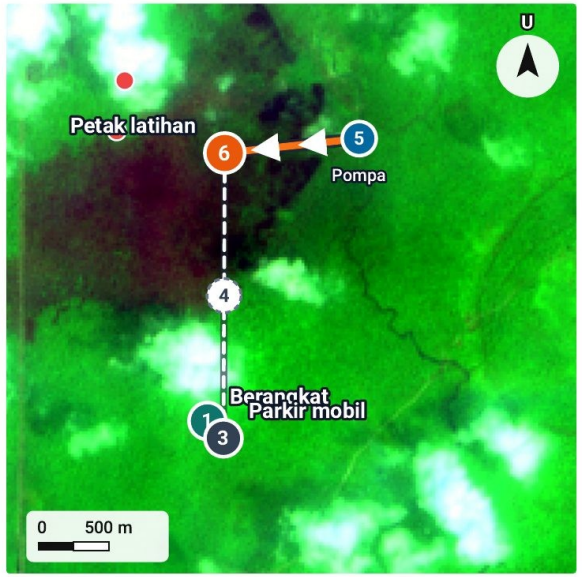

Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Parkir mobil atau turun perahu · Jalan kaki · Titik panas 24 jam

WARNA CITRA — Oranye terang = api atau bara · Merah tua sampai ungu = bekas terbakar · Hijau = tumbuhan · Putih kebiruan = awan atau asap · Gelap = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2C, 26 Okt 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

5	6	0,8
titik panas 24 jam	titik panas 48 jam	km titik panas terdekat

Petak	**Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini
Kebakaran terdekat	0,7 km, Kec. Dusun Utara, sudah 1 hari, ± 10 ha

CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

Kekeringan gambut (DC)	176
Suhu, kelembapan, angin	32,3 °C, 58%, 2,7 km/jam

Prakiraan	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11
Hujan, mm	0	11	3	2	7	3	7
Peluang, %	27	82	88	69	84	78	76

LAHAN DAN RIWAYAT

Gambut	**Tidak tercatat** di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor
Tahun ada api	**1** dari 14 tahun (2012–2025)
Desa	Pendang, Kec. Dusun Utara
Kesatuan hidrologis gambut	Sungai Kapuas - Sungai Barito

ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Pendang
   -1.5119, 114.8108
2. **Naik mobil 1 menit** ke ujung jalan: 1 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.5130, 114.8118
4. **Jalan kaki 35 menit** ± 2,3 km ke arah utara.
5. **Pasang pompa di tepi air** parit, 950 m dari petak
   -1.4940, 114.8204
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.198 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4949, 114.8119

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.


4 LOKASI 4 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan

UNTUK Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

PETA RUTE

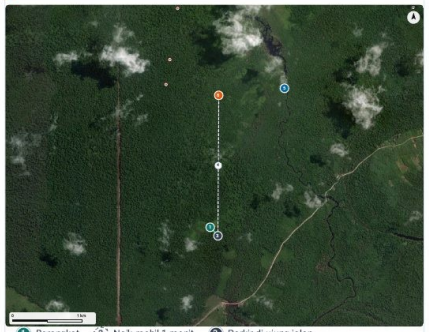

1 Berangkat · 2 Naik mobil 1 menit · 3 Parkir di ujung jalan · 4 Jalan kaki 35 menit · 5 Pasang pompa di tepi air · 6 Sampai di petak latihan · Rute mobil atau perahu · Jalan kaki · Titik panas

NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI



Naik-turun ± 12 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

ALUR PERJALANAN, ± 36 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Pendang
   -1.5119, 114.8108
2. **Naik mobil 1 menit** ke ujung jalan: 1 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.5130, 114.8118
4. **Jalan kaki 35 menit** ± 2,3 km ke arah utara.
5. **Pasang pompa di tepi air** parit, 950 m dari petak
   -1.4940, 114.8204
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.198 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4949, 114.8119

Jalur jalan kaki ke petak mengikuti jalur selang.

TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Gelar selang dari petak ke arah pompa: ujung yang sudah tersambung tidak terseret.
- Beri nomor tiap gulung dan catat jam selesai tiap 200 m untuk mengukur kecepatan gelar.
- Pasang pengukur tekanan di pompa dan di lance; catat keduanya tiap 10 menit.
- Bagi tim jadi 2 kelompok: selang dibawa duluan, pompa terakhir. Pasang pita penanda di jalur kaki untuk jalan pulang saat asap tebal.

BARANG YANG DIBAWA

Barang	Jumlah	Catatan
Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit	1 unit	
Selang isap 3 m dengan saringan	1	Saringan jangan sampai menyentuh lumpur
Selang 2,5 inci, 20 m per gulung	62 gulung	Sudah termasuk 2 gulung cadangan
Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci)	1	Satu cabang ke lance, satu ke nozzle
Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m	2 (boleh sampai 8)	Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan
Nozzle semprot biasa	1	Untuk petak pembanding
Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m	2	Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya
Bor gambut	1	Ukur tebal gambut di tiap petak
Meteran 50 m, patok, tali rafia	1, 16 patok, 1 gulung	Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m
HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas	1 set	Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang
Bensin	20 liter	Pompa memakai 2–5 liter per jam
Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape	1 set	Untuk perbaikan kecil di lokasi
Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot	1 per orang	Wajib dipakai selama di lokasi
Kotak P3K dan air minum	1 kotak, 3 liter per orang	

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 15 dan 16 dari 20

LOKASI 4 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

4 Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK



Pompa · Selang · Sumber air · Y-pembagi
Petak lance L1, L2 · Petak semprot biasa K1, K2 · Titik panas

Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi parit, 950 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 1.198 m (62 gulung)** ke petak. Karena jauh, perlu **1 pompa tambahan** di tengah jalur, kira-kira tiap 599 m. Pompa tambahan menerima air dari selang dan mendorongnya lagi ke depan.

Pilihan pasang	Tekanan di pompa	Sisa tekanan di lance	Air sampai	Bensin per jam	Hasil hitung
2 lance + 1 nozzle (alat minimum)	8,1 bar	2,9 bar	15 menit	2,5 L	Layak
8 lance (uji penuh)	11,0 bar	0,0 bar	11 menit	4,6 L	Tidak layak
8 lance + 1 pompa tambahan	7,2 bar	3,8 bar	6 menit	3,0 L	Layak

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 22 m dan air ± 16 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

URUTAN KERJA

1	**Sehari sebelumnya**	Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan.
2	**Begitu tiba**	Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap.
3	**Pasang petak**	Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut.
4	**Ukur sebelum**	Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah.
5	**Pasang pompa dan selang**	Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak.
6	**Alirkan air**	Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit.
7	**Suntik dan semprot**	Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya.
8	**Ukur sesudah**	Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor).
9	**Bongkar**	Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang.

TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)



Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 4,0 m (paling tinggi 6,0 m); hitungan memakai 6,0 m. Total head pompa per ruas (ada 2 ruas) ± **73 m** (7,2 bar): naik 3,0 m, gesekan selang 35 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

TANTANGAN

- Jalan kaki 2,3 km (35 menit) dari ujung jalan ke petak sambil membawa alat; siapkan pengangkut tambahan.
- Selang ± 1.198 m berarti 62 gulung (± 8 kg per gulung): perlu banyak orang atau gerobak untuk menggelar.
- Makin panjang selang, makin banyak sambungan yang bisa bocor. Siapkan klem dan selang tambal lebih banyak.
- Jarak air ke petak jauh untuk satu pompa. Cek ulang sumber air lain yang lebih dekat saat survei.
- Hujan diprakirakan 11 mm pada 2/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 4,5 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Lokasi tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000. Pastikan dulu tanahnya gambut sebelum memasang petak.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

YANG MEMUDAHKAN

- Pompa di dekat jalan: pompa dan bensin tidak perlu dipikul jauh; jalur selang sekaligus jalur jalan kaki ke petak.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

LOKASI 5 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 1 DARI 3, PETA LAPANGAN

5 Batapah, Timpah, Kapuas

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB



Petak latihan · Pompa di tepi air · Selang (satu jalur) · Parkir mobil atau turun perahu · Jalan kaki

WARNA CITRA: **Oranye terang** = api atau bara · **Merah tua sampai ungu** = bekas terbakar · **Hijau** = tumbuhan · **Putih kebiruan** = awan atau asap · **Gelap** = air atau bayangan

- **Citra:** Sentinel-2C, 26 Okt 2026 pukul 09.48 WIB. Kotak 4,0 × 4,0 km.
- **Titik panas:** satelit NASA FIRMS sampai 01 Nov 2026, 07.01 WIB.
- **Klik** penanda atau titik panas untuk membuka lokasinya di Google Maps.
- Garis selang dan jalan kaki hanya menunjukkan arah; di lapangan ikuti tanggul atau setapak.

API DI SEKITAR LOKASI (5 KM)

5	7	3,6
titik panas 24 jam	titik panas 48 jam	km titik panas terdekat

Petak	**Petak latihan**; tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini
Kebakaran terdekat	4,1 km, Kec. Timpah, sudah 2 hari, ± 83 ha

CUACA DAN KEKERINGAN HARI INI

Kekeringan gambut (DC)	176
Suhu, kelembapan, angin	32,3 °C, 58%, 2,7 km/jam

Prakiraan	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11
Hujan, mm	0	13	3	1	6	2	14
Peluang, %	33	81	81	63	86	75	77

LAHAN DAN RIWAYAT

Gambut	**Tidak tercatat** di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor
Tahun ada api	**5** dari 14 tahun (2012–2025)
Desa	Batapah, Kec. Timpah
Kesatuan hidrologis gambut	Di luar terdata

ALUR PERJALANAN (KLIK KOORDINAT)

1. **Berangkat** dari Desa Lungkuh Layang
   -1.6437, 114.5267
2. **Naik mobil 61 menit** ke ujung jalan: 12,1 km, 29 menit jalan kampung, 32 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.4863, 114.5787
4. **Jalan kaki 6 menit** ± 0,4 km ke arah timur laut.
5. **Pasang pompa di tepi air** sungai, 950 m dari petak
   -1.4838, 114.5727
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.197 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4848, 114.5812

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 17 dan 18 dari 20


5 LOKASI 5 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 2 DARI 3, PERJALANAN DAN PERSIAPAN

Batapah, Timpah, Kapuas

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

PETA RUTE

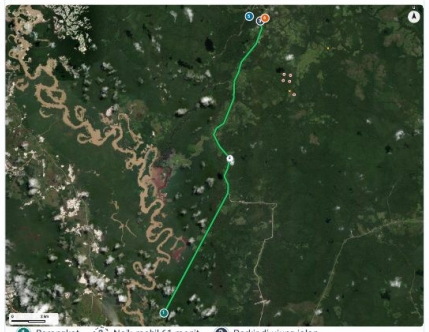

NAIK-TURUN JALUR JALAN KAKI



Naik-turun ± 7 m. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon, jadi angka nyata bisa lebih kecil. Head pompa ada di halaman pemasangan.

ALUR PERJALANAN, ± 67 MENIT SAMPAI PETAK

1. **Berangkat** dari Desa Lungkuh Layang
   -1.6437, 114.5267
2. **Naik mobil 61 menit** ke ujung jalan: 12,1 km, 29 menit jalan kampung, 32 menit jalan kebun yang belum ada di peta.
3. **Parkir di ujung jalan** turunkan alat, bagi bawaan per orang
   -1.4863, 114.5787
4. **Jalan kaki 6 menit** ± 0,4 km ke arah timur laut.
5. **Pasang pompa di tepi air** sungai, 950 m dari petak
   -1.4838, 114.5727
6. **Sampai di petak latihan** gelar selang ± 1.197 m dari pompa, pasang 4 petak
   -1.4848, 114.5812

Jalur jalan kaki ke petak mengikuti jalur selang.

TIPS LOKASI INI

- Mulai pagi, jam 7–10, saat angin masih lemah dan asap belum naik.
- Cek dulu dalamnya air dengan galah. Saringan isap butuh air ≥ 30 cm.
- Gelar selang dari petak ke arah pompa: ujung yang sudah tersambung tidak terseret.
- Beri nomor tiap gulung dan catat jam selesai tiap 200 m untuk mengukur kecepatan gelar.
- Pasang pengukur tekanan di pompa dan di lance; catat keduanya tiap 10 menit.

BARANG YANG DIBAWA

Barang	Jumlah	Catatan
Pompa portabel 1.000–1.300 liter/menit	1 unit	
Selang isap 3 m dengan saringan	1	Saringan jangan sampai menyentuh lumpur
Selang 2,5 inci, 20 m per gulung	62 gulung	Sudah termasuk 2 gulung cadangan
Y-pembagi berkatup (2,5 ke 2 × 1,5 inci)	1	Satu cabang ke lance, satu ke nozzle
Lance pipa baja 1,5 inci, panjang 1,5 m	2 (boleh sampai 8)	Ujung runcing berlubang, katup dan pengukur tekanan
Nozzle semprot biasa	1	Untuk petak pembanding
Termometer tusuk gambut, panjang ≥ 1 m	2	Ukur suhu sebelum, sesudah, dan besoknya
Bor gambut	1	Ukur tebal gambut di tiap petak
Meteran 50 m, patok, tali rafia	1, 16 patok, 1 gulung	Untuk memasang 4 petak 10 × 10 m
HP dengan aplikasi /pipa, kamera, formulir kertas	1 set	Formulir kertas untuk cadangan bila sinyal hilang
Bensin	20 liter	Pompa memakai 2–5 liter per jam
Alat servis: oli, busi, kunci, klem, selang tambal, sealtape	1 set	Untuk perbaikan kecil di lokasi
Masker N95, kacamata, sarung tangan, sepatu bot	1 per orang	Wajib dipakai selama di lokasi
Kotak P3K dan air minum	1 kotak, 3 liter per orang	

Gambar dan spesifikasi tiap barang ada di lampiran di akhir dossier.

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

5 LOKASI 5 DARI 5, SELANG PANJANG, HALAMAN 3 DARI 3, PEMASANGAN DAN UJI

Batapah, Timpah, Kapuas

UNTUK: Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan

BNPB SIPPA
Data per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

TATA LETAK POMPA, SELANG, DAN PETAK



Titik panas dari satelit bisa meleset sampai ± 375 m. Di lapangan, cari tanah yang berasap di sekitar petak dan pasang petak di situ.

CARA PASANG

Pompa ditaruh di tepi sungai, 950 m dari petak. Dari pompa **satu jalur selang ± 1.197 m (62 gulung)** ke petak. Karena jauh, perlu **1 pompa tambahan** di tengah jalur, kira-kira tiap 599 m. Pompa tambahan menerima air dari selang dan mendorongnya lagi ke depan.

Pilihan pasang	Tekanan di pompa	Sisa tekanan di lance	Air sampai	Bensin per jam	Hasil hitung
2 lance + 1 nozzle (alat minimum)	9,0 bar	2,0 bar	15 menit	2,9 L	Pas-pasan
8 lance (uji penuh)	11,9 bar	-0,9 bar	11 menit	5,0 L	Tidak layak
8 lance + 1 pompa tambahan	7,7 bar	3,3 bar	6 menit	3,2 L	Layak

Hitungan kalkulator SIPPA untuk pompa 1.000–1.300 liter/menit dan selang 2,5 inci. Panjang selang sudah ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak. Menurut data, kompleks ± 48 m dan air ± 30 m di atas laut. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

URUTAN KERJA

1	**Sehari sebelumnya**	Datangi lokasi. Pastikan air di parit atau kanal cukup (dalam ≥ 30 cm), jalan bisa dilewati, dan minta izin kepala desa serta pemilik lahan.
2	**Begitu tiba**	Catat jam tiba di aplikasi /pipa. Kumpulkan tim 10 menit untuk pengarahan keselamatan. Lihat arah angin dan asap.
3	**Pasang petak**	Cari tanah gambut yang masih berasap. Pasang 4 petak 10 × 10 m dengan patok dan tali. Bor 1 titik per petak untuk tahu tebal gambut.
4	**Ukur sebelum**	Ukur suhu tanah di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm. Foto tiap petak dari 4 arah.
5	**Pasang pompa dan selang**	Pompa di tepi air, paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air. Masukkan selang isap; saringan jangan kena lumpur. Gelar selang ke petak, pasang Y-pembagi 15 m sebelum petak.
6	**Alirkan air**	Nyalakan pompa, naikkan gas pelan-pelan sampai jarum di lance menunjuk 2–3 bar. Catat jam air mulai keluar dan tekanan tiap 10 menit.
7	**Suntik dan semprot**	Petak L1 dan L2: tusukkan lance tiap 2 m (25 tusukan per petak), tahan 1–2 menit di kedalaman 30, 60, lalu 100 cm. Petak K1 dan K2: semprot permukaan biasa, catat lamanya.
8	**Ukur sesudah**	Langsung ukur suhu lagi di titik yang sama. Besok di jam yang sama ukur sekali lagi (titik ditandai patok bernomor).
9	**Bongkar**	Matikan pompa, buang sisa air di selang, gulung. Catat jam selesai dan alat yang rusak atau hilang.

TOPOGRAFI POMPA KE PETAK (HEAD)



Beda tinggi pompa ke petak menurut data ± 16,0 m (paling tinggi 16,0 m); hitungan memakai 16,0 m. Total head pompa per ruas (ada 2 ruas) ± **78 m** (7,7 bar): naik 8,0 m, gesekan selang 35 m, isap 3,5 m, sisa tekanan di lance 3 bar. Data ketinggian ikut menghitung tinggi pohon; ukur beda tinggi dengan GPS saat survei.

TANTANGAN

- Selang ± 1.197 m berarti 62 gulung (± 8 kg per gulung); perlu banyak orang atau gerobak untuk menggelar.
- Makin panjang selang, makin banyak sambungan yang bisa bocor. Siapkan klem dan selang tambal lebih banyak.
- Jarak air ke petak jauh untuk satu pompa. Cek ulang sumber air lain yang lebih dekat saat survei.
- Hujan diprakirakan 13 mm pada 2/11. Tanah becek membuat membawa alat lebih lambat.
- Daops Palangkaraya ± 4,0 jam dari sini. Kalau alat rusak, cadangan lama datangnya.
- Tidak ada bara gambut yang layak diuji di dekat sini; lokasi dipakai untuk latihan atau survei.
- Lokasi tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000. Pastikan dulu tanahnya gambut sebelum memasang petak.
- Tebal gambut di titik ini belum diketahui; bor dulu sebelum menyuntik dengan lance 1,5 m.
- Letak air di peta bisa meleset puluhan meter dan banyaknya air saat kemarau belum diketahui; cek dengan galah.

YANG MEMUDAHKAN

- Ujung jalan dekat petak: jalan kaki dari ujung jalan ± 6 menit.
- Pompa di dekat jalan: pompa dan bensin tidak perlu dipikul jauh; jalur selang sekaligus jalur jalan kaki ke petak.


Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Lampiran E. Berkas asli renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah (contoh), 1 November 2026, halaman 19 dan 20 dari 20

Peralatan: gambar dan spesifikasi

BNPB SIPPA
Spesifikasi kelas kinerja, atau setara. Foto hanya contoh bentuk, bukan merek yang diwajibkan.

POMPA PORTABEL




Gambar teknik SIPPA

Mengisap air dari parit, kanal, atau sungai dan mendorongnya lewat selang ke petak.

- 1.000–1.300 liter/menit pada 6–8 bar (yang ada di Daops, BPBD)
- Kit SIPPA berikutnya: 1.500 liter/menit pada 10 bar, atau setara
- Bensin RON 91 atau lebih, ± 2–5 liter per jam
- Isap 3 inci, keluar 2,5 inci; dipikul 2–4 orang

Jumlah: 1; selang panjang tambah 1–2 pompa

SELANG ISAP DENGAN SARINGAN




Gambar teknik SIPPA

Menghubungkan pompa ke air tanpa menyedot lumpur dan sampah.

- Selang isap 3 inci, dinding kaku tidak kempis, panjang 3 m
- Saringan kasar lubang ± 5 mm
- Katup kaki satu arah supaya air tidak turun saat pompa berhenti
- Pompa paling tinggi 3,5 m di atas permukaan air

Jumlah: 1 set per pompa

SELANG LAYFLAT 2,5 INCI




Gambar teknik SIPPA

Mengalirkan air dari pompa ke petak; satu jalur saja.

- Diameter dalam 65 mm (2,5 inci), lapis karet atau nitril
- Tekanan kerja 16 bar atau lebih, diuji 1,5 kali tekanan kerja
- 20 m per gulung, ± 8 kg per gulung
- Kopling Storz 65 dengan karet perapat, pasang tanpa baut

Jumlah: Sesuai panjang jalur, termasuk 2 gulung cadangan (lihat tabel tiap lokasi)

Y-PEMBAGI BERKATUP



Gambar teknik SIPPA

Membagi satu selang menjadi dua cabang: ke lance dan ke nozzle.

- Masuk 2,5 inci Storz, keluar 2 × 1,5 inci
- Katup di tiap cabang untuk membuka dan menutup sendiri-sendiri
- Tekanan kerja 16 bar atau lebih
- Dipasang ± 15 m sebelum petak

Jumlah: 1

LANCE INJEKSI




Gambar teknik SIPPA

Ditusukkan ke gambut untuk menyuntik air langsung ke bara di bawah permukaan.

- Pipa baja tahan karat SS316 atau galvanis, 1,5 inci, panjang 1,5 m
- Ujung runcing berlubang; ukuran lubang final dari uji bengkel (contoh 8 lubang 2–2,5 mm)
- Katup bola dan pengukur tekanan di kepala lance
- Debit 15–40 liter/menit pada 2–4 bar

Jumlah: 2 untuk pilot, boleh sampai 8

NOZZLE SEMPROT



Gambar teknik SIPPA

Menyemprot permukaan di petak pembanding (cara biasa).

- Nozzle 1,5 inci, bisa diatur pancar lurus atau kabut
- Debit bisa diatur; catat menit dan setelan selama menyemprot
- Tekanan kerja sama dengan selang cabang

Jumlah: 1

PENGUKUR TEKANAN (MANOMETER)



Gambar teknik SIPPA

Membaca tekanan air di pompa dan di kepala lance.

- Rentang 0–10 bar, jarum berisi gliserin (tahan getar)
- Ulir 1/4 inci, dipasang di keluaran pompa dan di kepala lance
- Dibaca dan dicatat tiap 10 menit

Jumlah: 1 di pompa, 1 di tiap lance

TERMOMETER TUSUK GAMBUT



Gambar teknik SIPPA

Mengukur suhu tanah gambut untuk tahu bara masih menyala atau sudah padam.

- Sensor termokopel tipe K, layar digital
- Batang tusuk baja tahan karat, panjang 1 m atau lebih, bertanda 10, 30, 50, 100 cm
- Rentang sampai 400 °C atau lebih, ketelitian ± 2 °C
- Padam bila semua titik di bawah 40 °C


Jumlah: 2

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.

Peralatan: gambar dan spesifikasi

BNPB SIPPA
Spesifikasi kelas kinerja, atau setara. Foto hanya contoh bentuk, bukan merek yang diwajibkan.

BOR GAMBUT




Gambar teknik SIPPA

Mengambil contoh tanah untuk mengukur tebal gambut di tiap petak.

- Tabung setengah silinder untuk contoh gambut tidak teraduk
- Batang sambung 1 m, bisa disambung sampai 5–6 m
- Gagang T untuk diputar dengan tangan

Jumlah: 1

METERAN, PATOK, DAN TALI



Gambar teknik SIPPA

Memasang 4 petak 10 × 10 m dan menandai titik ukur suhu.

- Meteran gulung 50 m bahan fiberglass
- 16 patok kayu atau PVC ± 1 m, diberi nomor
- Tali rafia untuk batas petak

Jumlah: 1 meteran, 16 patok, 1 gulung tali

HP DAN RADIO



Gambar teknik SIPPA

Mencatat data di aplikasi /pipa dan berkomunikasi antar regu.

- HP Android dengan aplikasi /pipa (bisa tanpa sinyal) dan GPS
- Power bank 20.000 mAh
- Radio genggam untuk pompa, pompa tambahan, dan petak
- Formulir kertas cadangan

Jumlah: 1 set per regu, radio 1 per pos

BENSIN DAN JERIGEN



Gambar teknik SIPPA

Bahan bakar pompa selama uji.

- Jerigen 20 liter khusus BBM, tertutup rapat
- Bensin RON 91 atau lebih
- Corong dan saringan; disimpan 10 m atau lebih dari bara

Jumlah: 20 liter per pompa per hari

ALAT SERVIS




Gambar teknik SIPPA

Perbaikan kecil di lokasi supaya uji tidak berhenti.

- Kunci pompa dan kunci busi, busi cadangan, oli
- Klem selang, selang tambal, sealtape, karet perapat kopling cadangan
- Kain lap dan sarung tangan kerja

Jumlah: 1 set

ALAT PELINDUNG DIRI



Gambar teknik SIPPA

Melindungi regu dari asap, panas, dan lubang bara.

- Masker N95 atau P100
- Kacamata pelindung, helm, baju lengan panjang
- Sarung tangan kulit, sepatu bot karet

Jumlah: 1 set per orang

P3K DAN AIR MINUM



Gambar teknik SIPPA

Pertolongan pertama dan mencegah kepanasan.

- Kotak P3K dengan obat luka bakar dan cairan pencuci mata
- Air minum 3 liter per orang per hari

Jumlah: 1 kotak per regu

PELAMPUNG



Gambar teknik SIPPA

Wajib saat bekerja di tepi kanal, sungai, atau di perahu.

- Rompi pelampung berwarna terang dengan tali pengikat
- Dipakai sejak naik perahu sampai turun

Jumlah: 1 per orang bila ada kanal, sungai, atau perahu

Sumber: titik panas NASA FIRMS lewat Centurisk97; gambut 1:250.000 Kementan dan kanal, sumur bor BRGM lewat PRIMS; air, jalan, rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan); citra Sentinel-2 atau Esri; cuaca FWI Centurisk97 dan Open-Meteo. Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB. BNPB SIPPA.
