BNPB

Progres Sektor Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera

Bantuan Stimulan Rumah Rusak dan Hunian Tetap Pascabencana Siklon Senyar di Tiga Provinsi Sumatera

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dipresentasikan oleh

Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Selasa, 27 Oktober 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Foto: Dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB

Bantuan stimulan rumah rusak dan hunian tetap pascabencana Sumatera berjalan di tiga provinsi

STIMULAN RUSAK SEDANG DAN RINGAN

Rp748,9 M
ke daerah

78,9%
realisasi belanja

HUNIAN TETAP

850 2,2%
selesai dari **38.651** usulan

868 2,9%
proses bangun dari **30.430**

Capaian

Stimulan
35.407 unit rumah di **42 kabupaten/kota**.

Reviu huntap
30.430 usulan dari **38.651 usulan huntap**.

Usulan lanjutan
26 kabupaten/kota sedang berproses.

Rencana transfer
Rp**1.751,1** M ke daerah, tahap II –IV akhir Oktober 2026.

Kendala

Material
Semen dan besi langka, harga naik.

Lahan
Status tanah adat dan ulayat belum pasti.

Anggaran
ABT DSP rumah rusak berat terlambat cair.

Data penerima
Verifikasi dan validasi oleh pemda terlambat.

Tindak Lanjut

Pasokan
Harga khusus semen dari PT Semen Indonesia.

Pencairan
Dipercepat untuk rumah rusak berat.

Mekanisme
Hibah RR khusus sektor perumahan.

Data
Pemda menuntaskan verifikasi penerima bantuan.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, bahan RTM 27 Oktober 2026

Daftar Isi

Progres Sektor Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera

01 Dasar Hukum Pelaksanaan 4–5

02 Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan 6–12

03 Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat 13–18

04 Kendala dan Tindak Lanjut 19–20

05 Dokumentasi Lapangan 21–27

BNPB

01

Dasar Hukum Pelaksanaan

01 **Dasar Hukum Pelaksanaan** 4–5

02 Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan 6–12

03 Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat 13–18

04 Kendala dan Tindak Lanjut 19–20

05 Dokumentasi Lapangan 21–27

Dasar hukum pelaksanaan bantuan perumahan pascabencana Sumatera

Peraturan yang Menjadi Dasar Pelaksanaan

	JENIS	NOMOR	TENTANG	LEMBAGA PENERBIT	CAKUPAN
1	**Peraturan BNPB**	Nomor 5 Tahun 2017	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	BNPB	Umum
2	**Peraturan BNPB**	Nomor 4 Tahun 2020	Dana Siap Pakai	BNPB	Umum
3	**Petunjuk Pelaksanaan**	Nomor 5 Tahun 2024	Bantuan DSP stimulan perbaikan dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana	BNPB	Umum
4	**Keputusan Kepala BNPB**	Nomor 393 Tahun 2026	Bantuan perbaikan dan pembangunan rumah rusak terdampak bencana	Kepala BNPB	Umum
5	**Keputusan Mendagri**	Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026	Pedoman teknis bantuan rumah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera	Kementerian Dalam Negeri	Khusus Sumatera
6	**Petunjuk Teknis**	Nomor 1 Tahun 2026	Pembangunan rumah rusak berat melalui *in situ* dan relokasi mandiri di tiga provinsi	BNPB	Khusus Sumatera

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, bahan RTM 27 Oktober 2026

BNPB

02

Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan

01 Dasar Hukum Pelaksanaan 4–5

02 Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan 6–12

03 Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat 13–18

04 Kendala dan Tindak Lanjut 19–20

05 Dokumentasi Lapangan 21–27

Realisasi belanja stimulan untuk rumah yang rusak sedang dan ringan mencapai 78,9% dari dana di rekening masyarakat

BNPB

PENYALURAN

- **Rp748,9 M** ditransfer ke daerah
- **Rp702,4 M** di rekening masyarakat
- **78,9%** realisasi belanja

WILAYAH

- **42** kab/kota penerima
- **26** kab/kota tahap lanjut

Stimulan Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) per Provinsi

PROVINSI	UNIT RS DAN RR	RP MILIAR		REALISASI
		KE REKENING	BELANJA	
Aceh	30.661	621,8	494,3	79,5%
Sumatera Utara	3.560	61,9	47,1	76,1%
Sumatera Barat	1.186	18,7	12,7	68,1%
Jumlah	**35.407**	**702,4**	**554,2**	

Catatan Pelaksanaan

Batas usulan
Paling lambat 31 Agustus 2026; pemda melengkapi dokumen sesuai catatan PIC BNPB.

Dokumen usulan
SK transisi kedaluwarsa dan NIK/KK berbeda di SK BNBA; kajian kelayakan lahan relokasi mandiri belum ada.

Pertanggungjawaban
Laporan bulanan, pengembalian kas negara, SK BNBA final, rekening koran.

Pelaksanaan
Material langka dan tenaga tukang terbatas.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi berdasarkan laporan pemda, sebagian belum didukung laporan pertanggungjawaban

Rincian penyaluran stimulan rumah rusak sedang dan rusak ringan per tahap (Rp miliar)

Rusak Sedang (RS)

PROVINSI	KE DAERAH		KE REKENING		BELANJA	
	UNIT	RP	UNIT	RP	UNIT	RP
Aceh	12.919	387,6	12.289	368,6	11.190	292,7
Sumatera Utara	1.228	36,8	1.068	32,0	891	24,0
Sumatera Barat	375	11,3	343	10,3	265	7,2
Jumlah	14.522	435,7	13.700	410,9	12.346	323,9

Rusak Ringan (RR)

PROVINSI	KE DAERAH		KE REKENING		BELANJA	
	UNIT	RP	UNIT	RP	UNIT	RP
Aceh	17.742	266,1	16.879	253,2	15.539	201,6
Sumatera Utara	2.332	35,0	1.998	29,9	1.740	23,1
Sumatera Barat	811	12,2	562	8,4	441	5,5
Jumlah	20.885	313,3	19.439	291,6	17.720	230,3

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi berdasarkan laporan pemda, sebagian belum didukung laporan pertanggungjawaban

Realisasi belanja stimulan di Aceh 79,5%, tersebar di 17 kabupaten/kota

Stimulan RS dan RR per Kabupaten/Kota di Aceh

	KABUPATEN/KOTA	UNIT	RP MILIAR			REALISASI
			KE DAERAH	KE REKENING	BELANJA	
1	Aceh Barat	73	1,5	1,5	1,5	100,0%
2	Aceh Selatan	274	4,7	4,0	0,9	22,9%
3	Aceh Singkil	520	8,5	0,8	0,3	33,8%
4	Aceh Tamiang tahap I	5.141	112,2	109,1	87,5	80,2%
5	Aceh Tamiang tahap II SK 2	4.058	86,7	86,7	65,7	75,8%
6	Aceh Tamiang tahap II SK 3	4.400	93,8	93,8	69,5	74,2%
7	Aceh Tengah	1.680	32,2	25,6	19,2	75,2%
8	Aceh Tenggara	65	1,5	1,5	0,9	60,0%
9	Aceh Timur	5.318	118,9	114,4	111,8	97,8%
10	Aceh Utara	471	9,1	9,1	7,0	77,5%
11	Bener Meriah	194	4,1	3,9	3,3	85,2%
12	Bireuen	4.347	86,1	86,1	79,3	92,2%
13	Gayo Lues	12	0,3	0,1	0,1	100,0%
14	Kota Langsa	1.326	28,1	24,9	9,2	36,8%
15	Kota Lhokseumawe	1.201	35,7	32,1	16,2	50,4%
16	Kota Subulussalam	1.112	17,8	17,5	11,0	62,8%
17	Nagan Raya	169	3,7	2,7	2,5	93,1%
18	Pidie	18	0,5	0,5	0,4	90,3%
19	Pidie Jaya	282	8,5	8,0	8,0	100,0%
	Jumlah	**30.661**	**653,7**	**621,8**	**494,3**	

Usulan Tahap Berikutnya

Tahap II, sudah reviu APIP
Empat kab/kota: Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya.

Tahap II, berproses
Sepuluh kab/kota, antara lain Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireuen, Pidie.

Tahap III, sudah reviu APIP
Pidie Jaya, sebagai satu-satunya kab/kota.

Tahap III, berproses
Aceh Tamiang (SK 5), Aceh Tengah, Bireuen.

SK tahap II
Aceh Tamiang SK 2–4, Aceh Timur SK 2 dan 3, Aceh Utara SK 2–5.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi berdasarkan laporan pemda, sebagian belum didukung laporan pertanggungjawaban

Realisasi belanja stimulan di Sumatera Utara 76,1%, tersebar di 14 kabupaten/kota

Stimulan RS dan RR per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

	KABUPATEN/KOTA	UNIT	RP MILIAR			REALISASI
			KE DAERAH	KE REKENING	BELANJA	
1	Batu Bara	84	1,9	1,9	1,9	100,0%
2	Deli Serdang	69	1,1	0,8	0,8	99,1%
3	Humbang Hasundutan	131	2,3	0,4	0,4	100,0%
4	Kota Binjai	15	0,5	0,4	0,4	100,0%
5	Kota Medan	50	1,1	0,5	0,1	21,9%
6	Langkat	936	20,0	19,9	14,7	74,1%
7	Mandailing Natal	176	3,3	2,3	0,5	20,1%
8	Nias Selatan	91	1,5	1,1	1,0	94,5%
9	Nias Barat	59	1,3	1,3	0,2	19,6%
10	Pakpak Bharat	6	0,2	0,1	0,1	100,0%
11	Serdang Bedagai	17	0,3	0,3	0,3	100,0%
12	Tapanuli Selatan	249	5,5	5,3	5,3	100,0%
13	Tapanuli Tengah	1.591	31,3	25,8	19,7	76,4%
14	Tapanuli Utara	86	1,9	1,9	1,6	86,3%
	Jumlah	3.560	71,8	61,9	47,1	

Usulan Tahap Berikutnya

Tahap I
14 kabupaten/kota penerima, realisasi belanja **76,1%**.

Tahap II, sudah reviu APIP
Tapanuli Tengah.

Tahap II, berproses
Tiga kab/kota: Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara.

Tahap III, sudah reviu APIP
Belum ada kab/kota.

Tahap III, berproses
Tapanuli Tengah.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi berdasarkan laporan pemda, sebagian belum didukung laporan pertanggungjawaban

Realisasi belanja stimulan di Sumatera Barat 68,1%, tersebar di 11 kabupaten/kota

Stimulan RS dan RR per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

	KABUPATEN/KOTA	UNIT	RP MILIAR			REALISASI
			KE DAERAH	KE REKENING	BELANJA	
1	Pasaman	25	0,4	0,4	0,4	96,6%
2	Pasaman Barat	52	1,0	1,0	0,9	95,5%
3	Agam	112	2,5	1,8	1,4	81,4%
4	Kota Padang Panjang	9	0,2	0,2	0,2	97,7%
5	Kota Padang	275	4,5	1,2	1,2	100,0%
6	Solok	93	1,7	1,5	1,5	98,0%
7	Lima Puluh Kota	78	1,9	1,6	1,6	100,0%
8	Tanah Datar	126	2,9	2,9	2,6	92,1%
9	Padang Pariaman	310	5,8	5,7	1,2	20,4%
10	Kota Pariaman	3	0,1	0,1	0,1	100,0%
11	Pesisir Selatan	103	2,4	2,4	1,7	68,6%
	Jumlah	1.186	23,4	18,7	12,7	

Usulan Tahap Berikutnya

Tahap I
11 kabupaten/kota penerima, realisasi belanja **68,1%**.

Tahap II, sudah reviu APIP
Tiga kab/kota: Agam, Pasaman Barat, Padang.

Tahap II, berproses
Empat kab/kota: Padang Panjang, Solok, Lima Puluh Kota, Tanah Datar.

Tahap III, sudah reviu APIP
Dua kab/kota: Agam, Padang.

Tahap III, berproses
Dua kab/kota: Solok, Tanah Datar.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; realisasi berdasarkan laporan pemda, sebagian belum didukung laporan pertanggungjawaban

26 kabupaten/kota sedang memproses usulan tahap berikutnya

TAHAP II

8 kab/kota sudah reviu APIP

17 kab/kota berproses

TAHAP III

3 kab/kota sudah reviu APIP

6 kab/kota berproses

Status Usulan per Provinsi, Kab/Kota

PROVINSI	PENERIMA	USULAN LANJUT	TAHAP II		TAHAP III	
			REVIU	PROSES	REVIU	PROSES
Aceh	17	14	4	10	1	3
Sumatera Utara	14	4	1	3	0	1
Sumatera Barat	11	8	3	4	2	2
Jumlah	**42**	**26**	**8**	**17**	**3**	**6**

Usulan Lanjut per Provinsi

Aceh
14 dari **17 kabupaten/kota** penerima.

Sumatera Utara
4 dari **14 kabupaten/kota** penerima.

Sumatera Barat
8 dari **11 kabupaten/kota** penerima.

Tiga provinsi
26 dari **42 kabupaten/kota** penerima.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026

03

Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat

01 Dasar Hukum Pelaksanaan 4–5

02 Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan 6–12

03 Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat 13–18

04 Kendala dan Tindak Lanjut 19–20

05 Dokumentasi Lapangan 21–27

Hunian tetap *in situ* dan relokasi mandiri: 850 unit selesai dan 868 unit sedang dibangun

USULAN

38.651
usulan huntap

30.430
usulan sudah direviu

PEMBANGUNAN

868 (2,9%)
proses bangun dari **30.430**

850 (2,2%)
selesai dari **38.651** usulan

Huntap per Provinsi

PROVINSI	USULAN	REVIU USULAN		PEMBANGUNAN		SELESAI DARI USULAN
		SUDAH	PROSES	PROSES	SELESAI	
Aceh	33.978	26.504	7.474	781	824	2,4%
Sumatera Utara	2.296	1.848	448	3	11	0,5%
Sumatera Barat	2.377	2.078	299	84	15	0,6%
Jumlah	**38.651**	**30.430**	**8.221**	**868**	**850**	

Catatan Huntap

Besaran bantuan
Rp**70 juta** per unit rumah rusak berat, sesuai Keputusan Kepala BNPB.

Target dapat berubah
8.221 usulan belum selesai direviu APIP.

Perlambatan
Semen dan besi mahal dan langka.

Anggaran tambahan
ABT disetujui Kemenkeu 22 Oktober 2026.

Sinergi kelembagaan
Tim teknis pusat dan daerah terpadu.

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

Aceh menyumbang 824 unit huntap selesai, terbanyak di Aceh Tamiang dan Bireuen

Huntap per Kabupaten/Kota di Aceh

	KABUPATEN/KOTA	REVIU USULAN		PEMBANGUNAN	
		SUDAH	PROSES	PROSES	SELESAI
1	Aceh Tamiang	9.403	642	67	394
2	Aceh Utara	7.816	0	71	23
3	Aceh Timur	2.747	3.702	174	63
4	Aceh Tengah	1.930	754	54	0
5	Pidie Jaya	2.268	0	5	6
6	Bireuen	340	1.125	248	338
7	Bener Meriah	645	463	42	0
8	Gayo Lues	104	750	0	0
9	Nagan Raya	658	0	0	0
10	Aceh Tenggara	342	9	90	0
11	Kota Lhokseumawe	74	0	0	0
12	Aceh Singkil	65	0	0	0
13	Aceh Barat	49	0	0	0
14	Pidie	42	3	0	0
15	Aceh Selatan	13	26	0	0
16	Kota Subulussalam	8	0	0	0
17	Kota Langsa	0	0	30	0
	Jumlah	26.504	7.474	781	824

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

Sumatera Utara menyelesaikan 11 unit huntap, terbanyak di Langkat

Huntap per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

	KABUPATEN/KOTA	REVIU USULAN		PEMBANGUNAN	
		SUDAH	PROSES	PROSES	SELESAI
1	Batubara	11	0	0	0
2	Deli Serdang	7	0	0	0
3	Humbang Hasundutan	81	255	0	0
4	Kota Binjai	22	0	0	0
5	Kota Medan	19	0	0	0
6	Kota Padangsidimpuan	0	0	0	0
7	Kota Sibolga	0	0	0	0
8	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	0
9	Langkat	299	0	2	8
10	Mandailing Natal	17	0	0	0
11	Nias	0	0	0	0
12	Nias Selatan	17	0	0	0
13	Nias Barat	21	0	0	0
14	Pakpak Bharat	1	0	0	0
15	Serdang Bedagai	0	0	0	0
16	Tapanuli Selatan	303	103	0	0
17	Tapanuli Utara	92	0	1	3
18	Tapanuli Tengah	958	90	0	0
	Jumlah	1.848	448	3	11

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

Sumatera Barat menyelesaikan 15 unit huntap, terbanyak di Agam

Huntap per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

	KABUPATEN/KOTA	REVIU USULAN		PEMBANGUNAN	
		SUDAH	PROSES	PROSES	SELESAI
1	Pasaman	4	0	0	0
2	Pasaman Barat	28	0	0	0
3	Agam	1.124	0	82	10
4	Padang Panjang	4	8	0	1
5	Kota Padang	29	0	0	1
6	Solok	0	190	0	0
7	Lima Puluh Kota	49	13	0	1
8	Tanah Datar	145	88	0	0
9	Padang Pariaman	672	0	0	1
10	Kota Pariaman	8	0	2	1
11	Pesisir Selatan	15	0	0	0
12	Kepulauan Mentawai	0	0	0	0
	Jumlah	2.078	299	84	15

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026; data progres dari penyedia, belum dilengkapi dokumen pendukung

Rencana transfer stimulan tahap II sampai IV pada akhir Oktober 2026 sebesar Rp1.751,1 miliar

RENCANA TRANSFER

Rp1.751,1 M
rencana ke daerah, tahap II sampai IV

Rp707,8 M
tahap II untuk Aceh dan Sumut

Rp608,1 M
tahap IV untuk Aceh

Transfer ke Daerah dan Rencana Tahap II sampai IV, Rp Miliar

PROVINSI	TRANSFER BNPB KE DAERAH	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Aceh	653,7	517,2	319,5	608,1
Sumatera Utara	71,8	190,6	10,1	0,0
Sumatera Barat	23,4	0,0	105,5	0,0
Jumlah	**748,9**	**707,8**	**435,2**	**608,1**

Huntap yang Sudah Berdiri



Aceh Tamiang


Langkat


Lima Puluh Kota


Kota Padang Panjang

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, bahan RTM 27 Oktober 2026; foto dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB

04

Kendala dan Tindak Lanjut

01 Dasar Hukum Pelaksanaan 4–5

02 Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan 6–12

03 Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat 13–18

04 **Kendala dan Tindak Lanjut** 19–20

05 Dokumentasi Lapangan 21–27

Kendala pelaksanaan dan saran tindak lanjut sektor perumahan

Kendala dan Saran Tindak Lanjut

ASPEK	KENDALA	SARAN TINDAK LANJUT
Material	Semen dan besi langka, harganya melonjak	Jamin pasokan dan harga; Kepala BNPB telah menyurati PT Semen Indonesia
Akses lokasi	Lokasi huntap tersebar; distribusi terganggu banjir dan longsor susulan	Prioritaskan akses dan jalur distribusi material
Status lahan	Kepastian lahan, terutama tanah adat dan ulayat	Percepat penyelesaian status dan kesepakatan lahan
Anggaran RB	ABT DSP stimulan rumah rusak berat terlambat cair	Percepat pencairan agar penyedia mulai bekerja
Data penerima	Verifikasi dan validasi data oleh pemda terlambat	Pemda menuntaskan verifikasi dan data yang diperselisihkan
Mekanisme hibah	Hibah RR perumahan belum dibedakan dari sektor lain	Susun mekanisme khusus hibah RR sektor perumahan
Peran DSP	PPK dan BPP DSP rumah rusak berat berada di BNPB	Kembalikan fungsi PPK dan BPP DSP kepada pemda pengusul

Sumber: Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, bahan RTM 27 Oktober 2026; Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 24 Oktober 2026

05

Dokumentasi Lapangan

01 Dasar Hukum Pelaksanaan 4–5

02 Stimulan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan 6–12

03 Hunian Tetap dan Stimulan Rumah Rusak Berat 13–18

04 Kendala dan Tindak Lanjut 19–20

05 Dokumentasi Lapangan 21–27

Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Aceh

Rusak Ringan, Pidie Jaya


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Sedang, Pidie Jaya


Kondisi awal

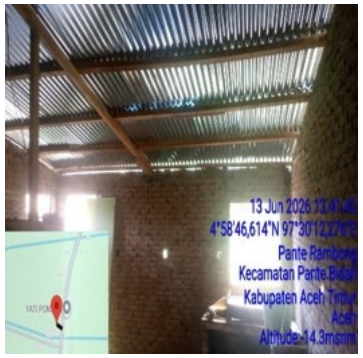

Pengerjaan


Selesai

Rusak Sedang, Aceh Timur


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Ringan, Bireuen


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 2026

Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Kota Binjai, Sumatera Utara

Rusak Sedang, Kota Binjai


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Ringan, Kota Binjai



Kondisi awal



Pengerjaan


Selesai

Rusak Sedang, Kota Binjai


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Capaian Kota Binjai

Stimulan Kota Binjai
15 unit rumah, realisasi belanja **100%**.

Huntap Kota Binjai
Usulan **22 unit**, proses pembangunan **0 unit**.

Dana Kota Binjai
Transfer Rp**450** juta, belanja Rp**420** juta.

Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 2026

Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Lima Puluh Kota dan Pasaman Barat

Rusak Sedang, Lima Puluh Kota


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Sedang, Lima Puluh Kota


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Ringan, Lima Puluh Kota


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Sedang, Pasaman Barat


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 2026

Dokumentasi perbaikan rumah rusak di Pasaman dan Agam

Rusak Sedang, Pasaman



Kondisi awal



Pengerjaan



Selesai

Rusak Ringan, Agam


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Rusak Sedang, Agam


Kondisi awal


Pengerjaan


Selesai

Capaian Pasaman dan Agam

KAB/KOTA	STIMULAN		HUNTAP		
	UNIT	BELANJA	USULAN	PROSES	SELESAI
Pasaman	25	96,6%	4	0	0
Agam	112	81,4%	1.124	82	10

Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 2026

Dokumentasi pembangunan huntap di Aceh

Huntap di Aceh



Bireuen



Aceh Timur



Aceh Tamiang



Bireuen



Pidie Jaya



Aceh Timur

Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 2026

Dokumentasi pembangunan huntap di Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Langkat, Sumatera Utara


Langkat


Langkat

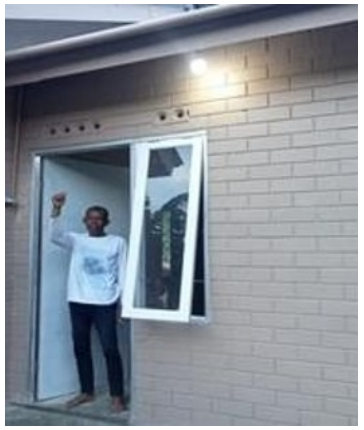

Langkat


Langkat


Langkat


Langkat

Sumatera Barat


Lima Puluh Kota


Padang Pariaman


Kota Padang


Agam


Agam


Kota Padang Panjang

Sumber: Foto dokumentasi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, 2026

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Progres Sektor Perumahan RR Pascabencana di Wilayah Sumatera

Selasa, 27 Oktober 2026



Foto: Dokumentasi Kedeputian Bidang RR BNPB
