
Hunian tetap: sebagian besar usulan sudah direviu, tetapi baru sebagian kecil yang selesai dibangun

CUT OFF DATA 24 Okt 2026

Tahapan usulan huntap, tiga provinsi

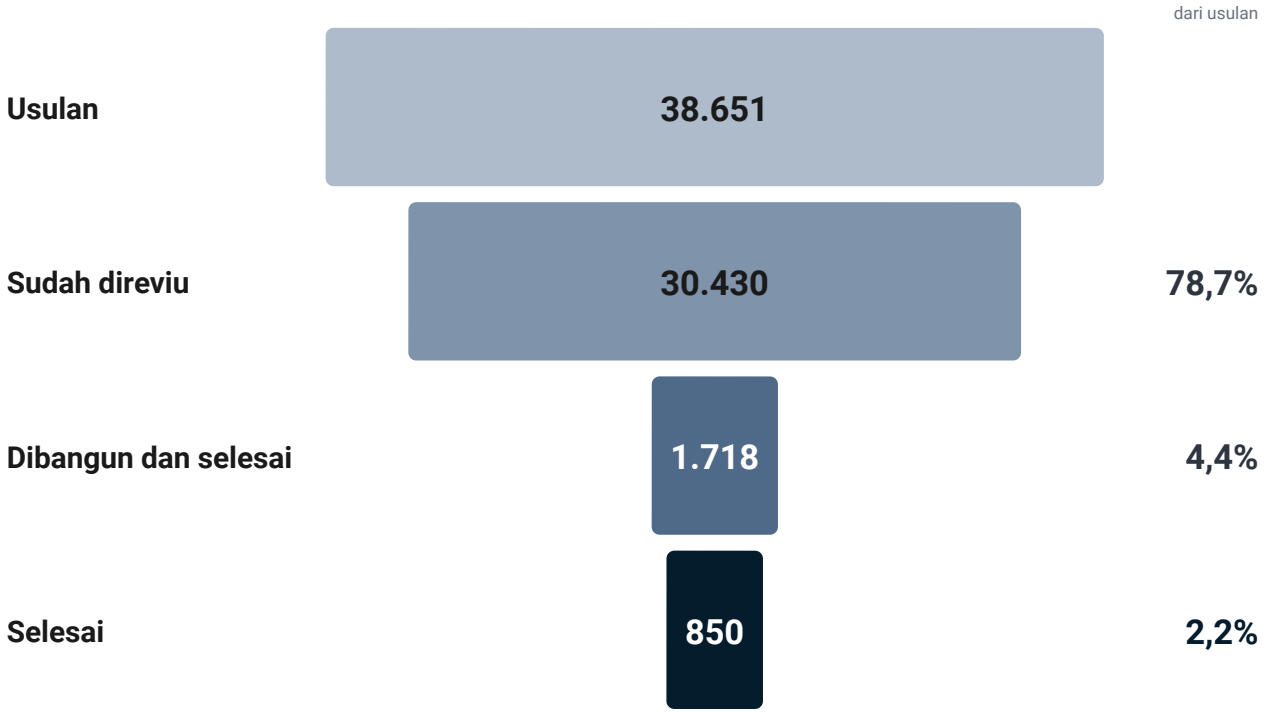

Rincian per provinsi, unit

PROVINSI	USULAN	DIREVIU	PROSES	SELESAI
Aceh	33.978	26.504	781	824
Sumatera Utara	2.296	1.848	3	11
Sumatera Barat	2.377	2.078	84	15
Jumlah	38.651	30.430	868	850

IMPLIKASI

Percepat pembangunan

Hambatan ada setelah reviu, jadi dukungan diarahkan ke penyedia dan bahan bangunan.

Sumut dan Sumbar

Dua provinsi ini perlu pendampingan teknis agar unit selesai tidak tertinggal dari Aceh.


Sumber: *Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Okt 2026; data progres dari penyedia*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari seluruh usulan huntap, sebagian besar tertahan di antara reviu APIP dan dimulainya pembangunan

CUT OFF DATA **24 Okt 2026**

Dari usulan ke huntap selesai, unit

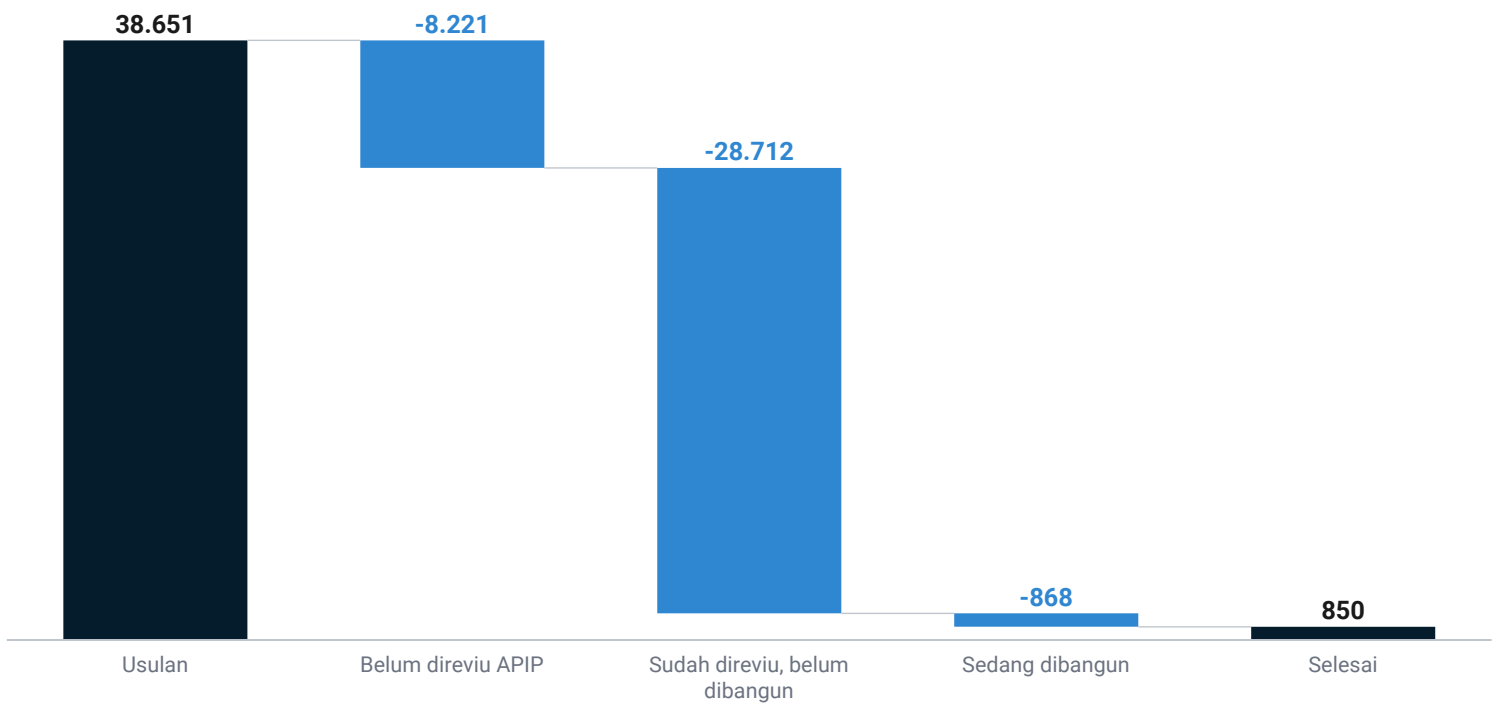

Selesai dari usulan per provinsi

Aceh	**824** dari 33.978 unit	**2,4%**
Sumatera Utara	**11** dari 2.296 unit	**0,5%**
Sumatera Barat	**15** dari 2.377 unit	**0,6%**

IMPLIKASI

Mulai pembangunan
Dukungan dipusatkan pada usulan yang sudah direviu tetapi belum dibangun.

Reviu APIP
Sisa reviu dipercepat agar target tidak terus bergeser.


Sumber: *Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Aceh menerima porsi terbesar transfer ke daerah dan rencana tahap II sampai IV, Sumatera Barat menunggu tahap III

CUT OFF DATA 24 Okt 2026

Transfer dan rencana tahap, Rp miliar

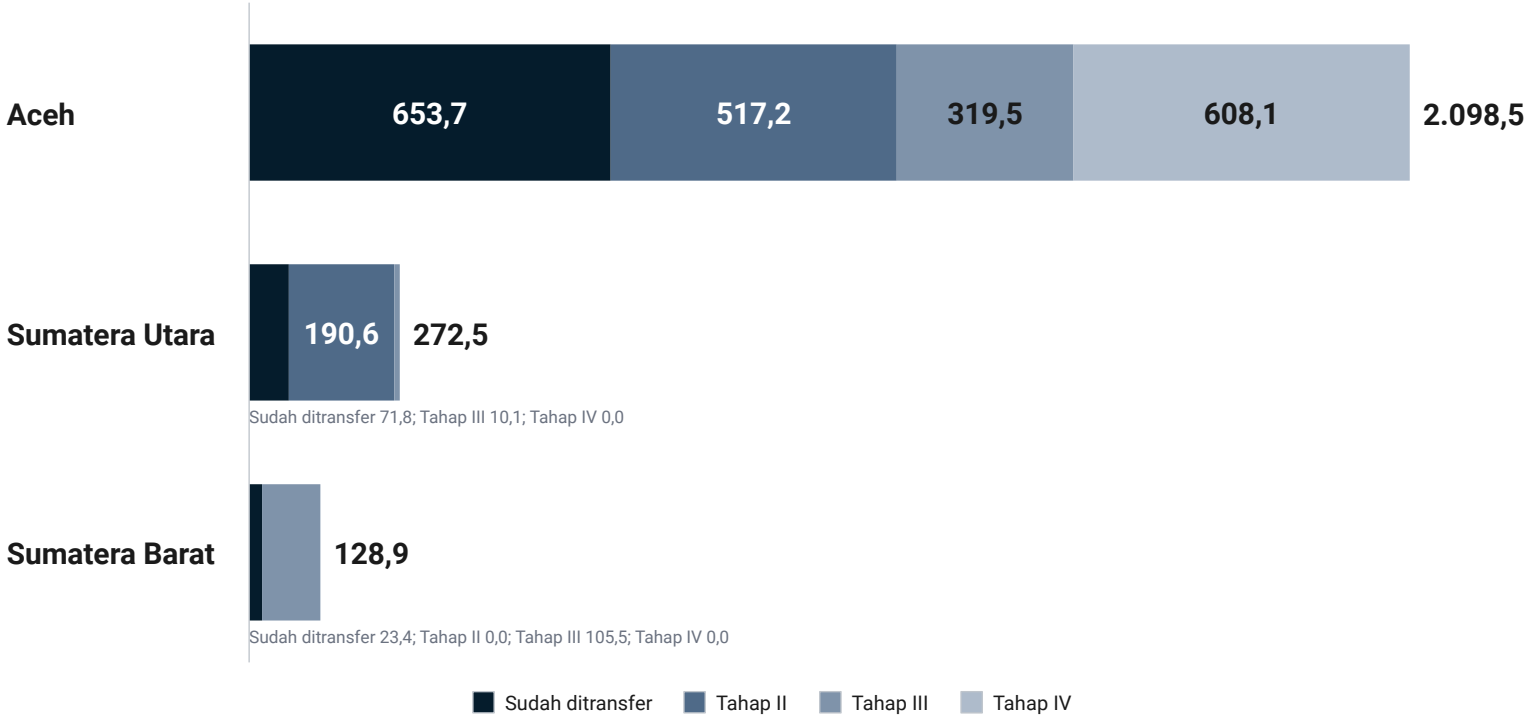

Bukti

- Aceh menerima porsi terbesar di semua tahap.
- Tahap II hanya untuk Aceh dan Sumatera Utara.
- Tahap IV hanya untuk Aceh.
- Sumatera Barat baru menerima lagi di tahap III.
- Rencana transfer berlaku sampai akhir Oktober.
- Sumatera Utara hampir tidak menerima tahap III.

IMPLIKASI

Pengawasan Aceh

Penyerapan di Aceh menentukan capaian tiga provinsi, jadi pemantauan belanja dipusatkan di sana.

Jadwal tahap

Tahap III dan IV perlu jadwal pasti agar daerah dapat menyiapkan penerima.


Sumber: *Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Usulan tahap berikutnya: Aceh hampir semua kabupaten/kota, Sumatera Utara baru sebagian kecil

CUT OFF DATA **24 Okt 2026**

Kab/kota dengan usulan lanjut dari penerima

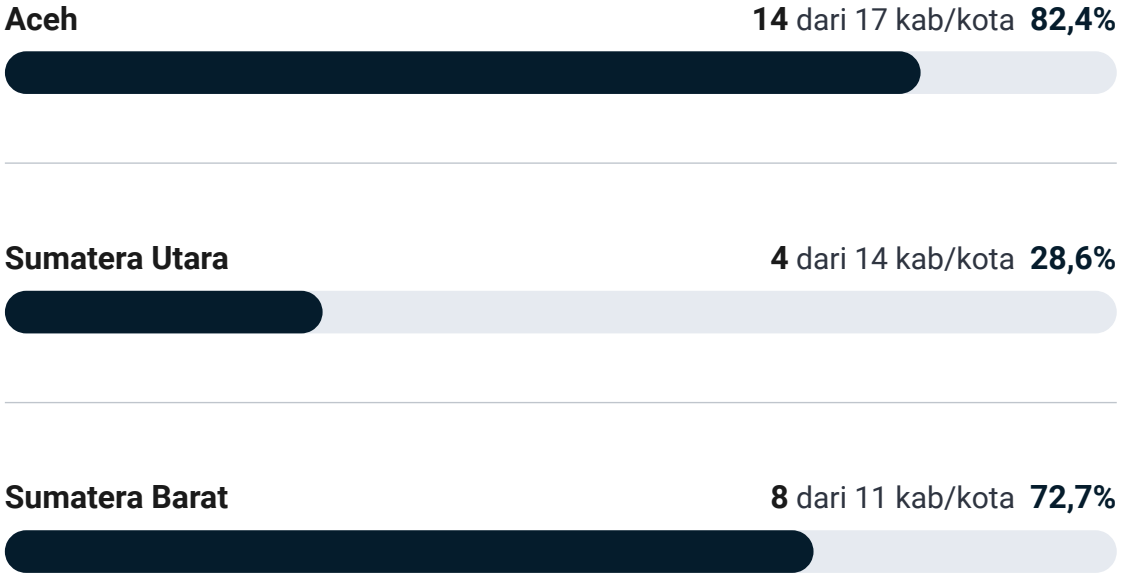

Status tahap per provinsi

PROVINSI	II REVIU	II PROSES	III REVIU	III PROSES
Aceh	4	10	1	3
Sumatera Utara	1	3	0	1
Sumatera Barat	3	4	2	2

- Tahap II: delapan kab/kota sudah reviu APIP, tujuh belas berproses.
- Tahap III: tiga kab/kota sudah reviu APIP, enam berproses.

IMPLIKASI

Sumatera Utara
Sepuluh kab/kota penerima belum mengusulkan tahap berikutnya dan perlu didampingi.

Reviu APIP
Antrean reviu APIP menentukan kecepatan usulan masuk ke tahap berikutnya.

Sumber: *Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lima kendala memperlambat pembangunan perumahan, dan tiap kendala sudah punya saran tindak lanjut

CUT OFF DATA **24 Okt 2026**

Kendala dan saran tindak lanjut

	KENDALA	SARAN TINDAK LANJUT
Material	Semen dan besi langka, harganya melonjak.	Jamin pasokan dan harga; Kepala BNPB telah menyurati PT Semen Indonesia.
Akses lokasi	Lokasi terpencil; distribusi terganggu banjir dan longsor susulan.	Prioritaskan akses dan jalur distribusi material.
Status lahan	Kepastian lahan, terutama tanah adat dan ulayat.	Percepat penyelesaian status dan kesepakatan lahan.
Anggaran RR	Dana siap pakai stimulan rumah rusak berat terlambat cair.	Percepat pencairan agar pembangunan dapat dimulai.
Data penerima	Verifikasi dan validasi data oleh pemda terlambat.	Pemda menuntaskan verifikasi dan data yang diperselisihkan.

Sumber: *Kedeputian Bidang RR BNPB, 24 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
