BNPB

# Program Flagship Kerja Sama BNPB dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha

Satu proyek bernama per kampus koordinator bersama calon mitra swasta yang akan diuji tuntas

**Jakarta, 3 November 2026**




***Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana***

**© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

*Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana*

Foto: Ilham Kuniawan Gumilang (UI), A2613 (ITB), Alharomain354 (UGM), Davidelit (IPB); CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons



# Daftar Isi

Program Flagship Kerja Sama BNPB
dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha


01 Brainstorming dan Penyaringan Ide 4–9

02 Flagship Kampus Koordinator 10–27

03 Tata Kelola dan Tindak Lanjut 28–32

# Ringkasan: tiap kampus koordinator memimpin satu proyek bernama bersama mitra swasta, dengan kampus sebagai penjamin mutu

Celah

## Program masih berupa wadah

Paparan sebelumnya memuat **15** program dalam **4** pilar; belum ada proyek bernama yang bisa diresmikan dan diukur.

Model tiga pihak

## Aset yang saling melengkapi

Kampus menguji dan memverifikasi; swasta membawa pabrik, platform, armada, dan karyawan; BNPB membawa mandat dan data.

Alasan swasta ikut

## Pajak dan reputasi

Sumbangan bencana lewat BNPB dan sumbangan litbang ke kampus dapat dikurangkan, paling tinggi **5%** penghasilan neto.

Brainstorming

## Ide disaring dulu

**53** ide dinilai dengan **5** kriteria; **17** ide lolos ambang dan menjadi bahan flagship.

Flagship

## Satu identitas per kampus

**12** flagship: satu untuk tiap kampus koordinator, ditambah Telkom University di regional Jawa Barat.

Lintas regional

## Dijalankan semua kampus

**5** program bersama, dari pesan siaga di aplikasi sampai asuransi bencana daerah.

Pagar

## Uji tuntas sebelum MoU

**7** syarat menjaga BNPB dari mitra tersanksi kebakaran, tambang di DAS banjir, dan tembakau.

Tahapan

## Dari percontohan ke perluasan


Penjajakan 100 hari, percontohan 2027, lalu perluasan sesuai peta jalan sampai **100** kampus mitra pada 2029.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

**Kepala BNPB diminta menyetujui daftar flagship (termasuk status Telkom University), menunjuk unit pasangan, dan mengizinkan penjajakan calon mitra dengan uji tuntas.**

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026; PMK 114/2025*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

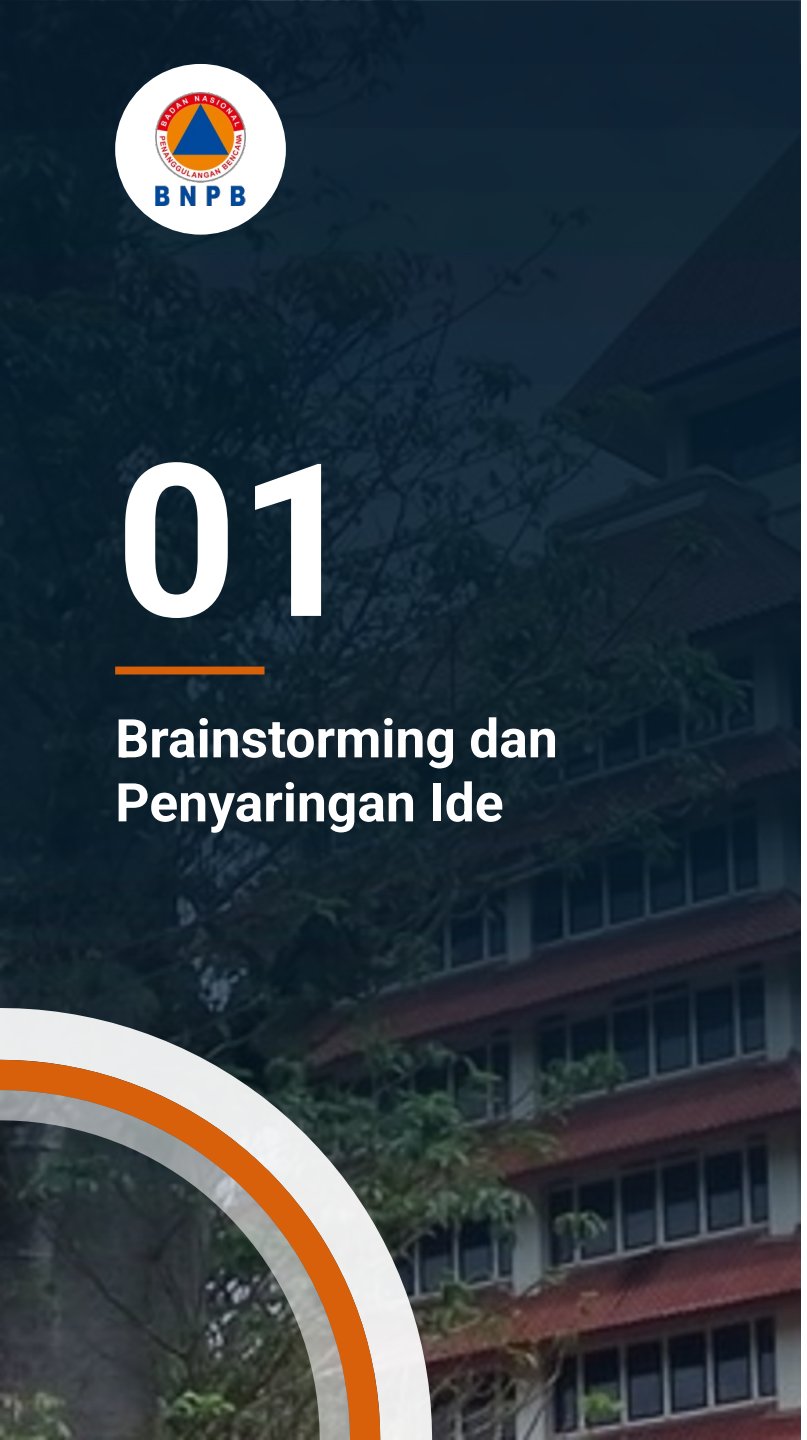

# 01

## Brainstorming dan Penyaringan Ide


01 **Brainstorming dan Penyaringan Ide** 4–9

02 Flagship Kampus Koordinator 10–27

03 Tata Kelola dan Tindak Lanjut 28–32

# Paparan sebelumnya memuat 15 program dalam 4 pilar, tetapi program masih berupa wadah dan swasta hanya hadir sebagai sumber dana

## Dari wadah program ke proyek bernama

| | PAPARAN SEBELUMNYA | USULAN FLAGSHIP |
|---|---|---|
| **Bentuk program** | Wadah: Ruang Inovasi, Simpul riset, Korps Relawan | Proyek bernama dengan mitra dan target; tiap proyek punya unit BNPB pasangan |
| **Peran swasta** | Sumber dana TJSL dan CSR | Pembawa aset: pabrik, platform, armada, gedung, dan karyawan |
| **Identitas kampus** | Semua kampus koordinator menjalankan daftar program yang sama | Satu flagship per kampus sesuai bahaya regional dan kekuatannya |
| **Peran kampus** | Pelaksana riset dan pengabdian | Penguji dan verifikator yang membuat program swasta dipercaya |
| **Ukuran hasil** | Jumlah hibah dan artikel | Unit terpasang, desa terverifikasi, kit teruji di kejadian nyata |

## Fondasi yang sudah ada

**11** kampus — **Kampus koordinator**: sepuluh regional dan satu tematik

**116** kampus — **Kampus sekitar**: dibina kampus koordinator

**14** lembaga — **Mitra pendukung**: pusat, daerah, masyarakat, internasional

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Tiap pihak dalam flagship membawa aset yang tidak dimiliki pihak lain; 6 motif usaha menjadi alasan swasta ikut

## Yang dibawa tiap pihak ke satu flagship

### Perguruan tinggi

Pakar dan laboratorium untuk merancang dan menguji. Mahasiswa lewat KKN dan magang. Penilaian independen yang membuat hasil dipercaya. Jejaring alumni ke daerah dan industri.

### Dunia usaha

Pabrik dan laboratorium produk untuk produksi massal. Platform digital milik perusahaan. Armada dan jaringan distribusi. Karyawan terlatih dan dana TJSL.

### BNPB

Mandat dan standar penanggulangan bencana. Data DIBI dan InaRISK untuk riset. Jalur ke BPBD dan pemerintah daerah. Pengakuan resmi dan panggung nasional.

## Motif swasta untuk ikut

**Kewajiban TJSL**
Dampak terukur untuk laporan

**Kelangsungan usaha**
Pabrik di zona rawan

**Riset produk**
Produk diuji di lapangan

**Merek**
Hadir di program negara

**Talenta**
Akses mahasiswa terbaik

**Pasar baru**
Asuransi dan bahan bangunan

CONTOH DI FLAGSHIP

**Pabrik**
Usulan: industri elektronika memproduksi alat peringatan UGM.

**Platform**
Usulan: platform VR calon mitra untuk latihan siaga sekolah.

**Gedung**
Usulan: Unand menilai gedung swasta Padang untuk evakuasi.

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sumbangan bencana lewat BNPB dan sumbangan litbang ke kampus dapat dikurangkan sampai 5% penghasilan neto, tetapi insentif litbang baru dipakai sekitar 30 wajib pajak

## Dasar hukum dan insentif bagi mitra swasta

| ATURAN | ISI | MANFAAT BAGI MITRA |
|---|---|---|
| **UU 24/2007 Pasal 28** | Lembaga usaha ikut menanggulangi bencana | Dasar keikutsertaan swasta |
| **Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2014** | MoU dan rencana kegiatan bersama mitra | Penghargaan BNPB dan laporan publik |
| **PMK Nomor 114 Tahun 2025** | Bencana lewat BNPB; litbang lewat kampus | Mengurangi penghasilan bruto |
| **PP 45/2019** | Insentif litbang, proposal ditelaah BRIN | Pengurang biaya litbang berlipat |
| **Dana Padanan Kemdiktisaintek** | Kontribusi industri dipadankan negara | Dana riset kampus berlipat |

## Skala insentif dan dana

**300** %

**Insentif litbang**

pengurang penghasilan bruto, paling tinggi

**750** miliar rupiah

**Dana Padanan 2024**

anggaran tahun 2024 untuk kampus

**30** wajib pajak

**Pemakai insentif litbang**


menurut Menteri Keuangan, 2024

**Sumber:** *PMK 114/2025 Pasal 4; PP 45/2019 dan PMK 81/2024 (DDTC News, 2024); Perka BNPB 12/2014; Kemdiktisaintek*


© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sebanyak 53 ide dinilai dengan 5 kriteria; 24 ide meraih 18 poin ke atas dan 17 ide lolos ambang 20 poin

## Penyaringan ide program

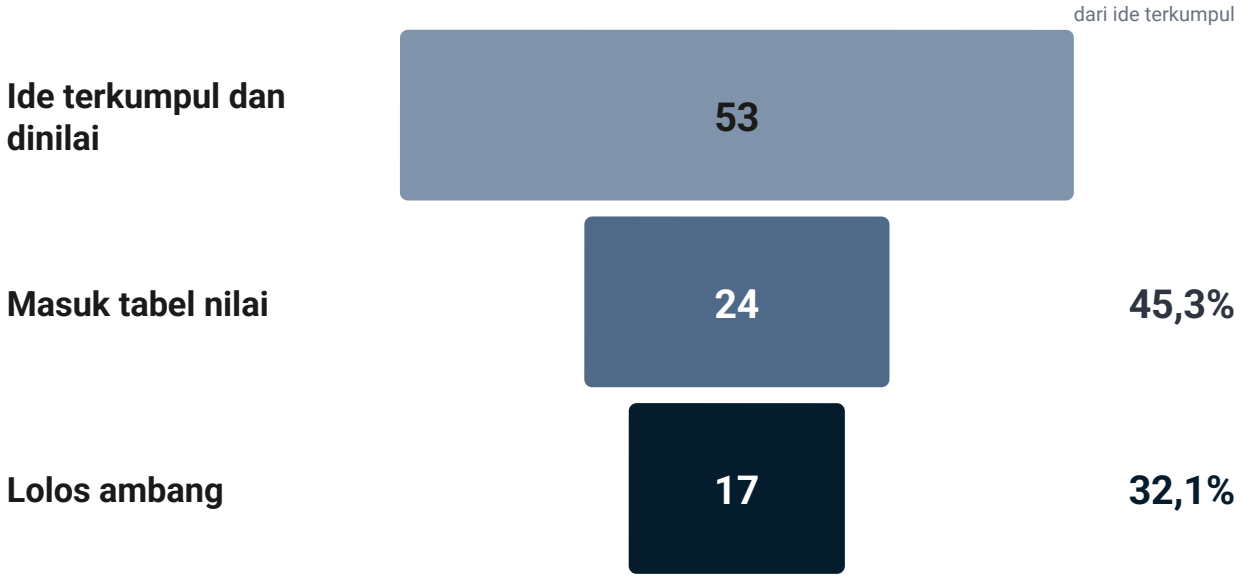


## Jumlah ide per gugus

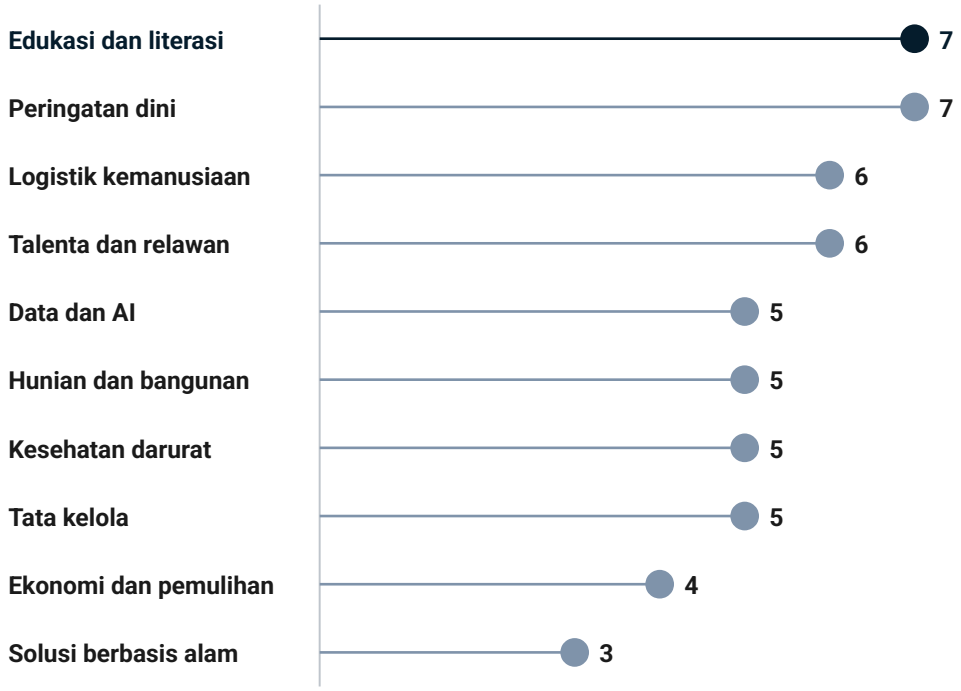


### CARA MENYARING

**Kebutuhan BNPB**
Menjawab kebutuhan unit di paparan sebelumnya.

**Dampak dan kesiapan**
Skala manfaat besar; prototipe sudah ada.

**Daya tarik swasta**
Perusahaan mendapat manfaat balik terukur.

**Risiko rendah**
Risiko reputasi dan konflik kepentingan kecil.

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Ide bernilai tertinggi, 24 dari 25 poin, memindahkan alat kampus dari percontohan ke produksi massal bersama industri

## Nilai dua belas ide teratas per kriteria

Nilai per kriteria: kebutuhan BNPB, dampak, daya tarik swasta, kesiapan, risiko rendah

| IDE | BUTUH | DAMPAK | SWASTA | SIAP | AMAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alat kampus diproduksi massal | Penuh | Penuh | Tinggi | Penuh | Penuh |
| Sekolah Siaga VR | Tinggi | Penuh | Penuh | Tinggi | Penuh |
| Rumah tahan gempa di toko bangunan | Penuh | Penuh | Penuh | Tinggi | Tinggi |
| Kit martabat berbasis riset | Tinggi | Tinggi | Penuh | Tinggi | Penuh |
| Kaji cepat hari pertama | Penuh | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Penuh |
| Gedung swasta jadi tempat evakuasi | Penuh | Penuh | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| Relawan karyawan dan mahasiswa | Tinggi | Tinggi | Penuh | Tinggi | Penuh |
| Kapal tanggap bencana kepulauan | Penuh | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Penuh |
| Sensor gempa di gedung swasta | Tinggi | Tinggi | Penuh | Tinggi | Penuh |
| Desa bebas api berinsentif | Penuh | Penuh | Tinggi | Penuh | Cukup |
| Tim medis darurat kampus | Penuh | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Penuh |
| Gudang bersama dan stok siaga | Penuh | Tinggi | Tinggi | Cukup | Penuh |

Cukup, tiga poin · Tinggi, empat poin · Penuh, lima poin

## Pola dari penyaringan

- Nilai tertinggi **24** dari **25** poin: alat kampus diproduksi massal bersama industri.
- Ide terkuat memakai aset swasta selain uang: pabrik, platform, gedung, armada, dan karyawan.
- Ide terkuat memberi swasta manfaat balik, sehingga kerja sama bertahan setelah satu tahun anggaran.
- Kampus berperan sebagai penguji dan verifikator, pagar dari program yang hanya pencitraan.
- Desa bebas api bernilai tinggi tetapi butuh pagar reputasi karena sebagian konsesi tersanksi.

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026, poin satu sampai lima per kriteria*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



# 02

## Flagship Kampus Koordinator



01 Brainstorming dan Penyaringan Ide 4–9

**02 Flagship Kampus Koordinator 10–27**

03 Tata Kelola dan Tindak Lanjut 28–32

# Dua belas flagship dipimpin 11 kampus koordinator dan Telkom University, dan dapat ditiru 116 kampus di sekitarnya

## Kampus koordinator dan kampus sekitar yang dibina

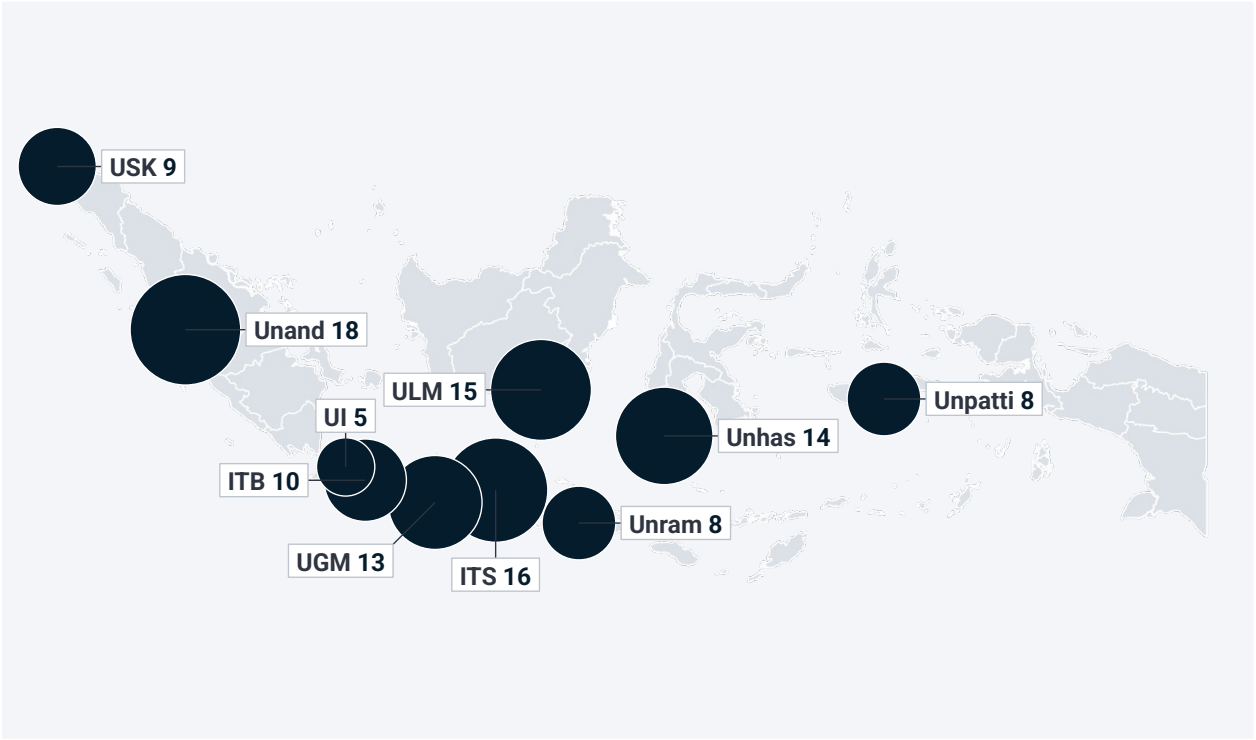


Sumber batas: olahan BNPB; WGS84; batas wilayah ilustratif dan tidak resmi

## Nama flagship tiap kampus

| KAMPUS | FLAGSHIP |
|---|---|
| 1 USK | Lumbung Siaga Aceh |
| 2 Unand | Padang Siap Megathrust |
| 3 UI | Korps Siaga Korporat |
| 4 ITB | Lab Inovasi Kemanusiaan |
| 5 Tel-U (usulan) | Sekolah Siaga Imersif |
| 6 UGM | EWS Produksi Massal |
| 7 ITS | Kapal Tanggap Bencana |
| 8 Unram | Rumah Tahan Gempa |
| 9 ULM | Desa Lahan Basah Tangguh |
| 10 Unhas | Sulawesi Aman Bangun |
| 11 Unpatti | Pulau Siaga Terhubung |
| 12 IPB | Desa Bebas Api Terverifikasi |

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sepuluh flagship diambil dari 17 ide lolos; flagship Sulawesi serta Maluku diambil dari daftar panjang karena bahayanya belum terjawab

## Dari ide lolos ke kampus

| KAMPUS | BAHAYA UTAMA REGIONAL | BUKTI YANG SUDAH ADA | IDE TERPILIH (KODE) |
|---|---|---|---|
| **USK** | Tsunami dan banjir | Satgas Senyar, pelacak logistik | Gudang bersama dan stok siaga (E1) |
| **Unand** | Megathrust Mentawai | Pusat unggulan BNPB | Gedung jadi tempat evakuasi (D3) |
| **UI** | Banjir kota | DRRC berkontrak dengan industri | Relawan karyawan (H1) |
| **ITB** | Gempa dan longsor | Farmasi ITB, Labtek XV | Kit martabat (E4) |
| **Tel-U** | Gempa dan banjir | Laboratorium VR, Flood Eye | Sekolah Siaga VR (A1) |
| **UGM** | Longsor | GAMA-EWS berstandar ISO | Alat diproduksi massal (B1) |
| **ITS** | Kepulauan, gunung api | Perkapalan, RS Kapal Unair | Kapal kepulauan (E2) |
| **Unram** | Gempa | Pascagempa Lombok | Rumah tahan gempa (D1) |
| **ULM** | Banjir dan kebakaran rawa | Lahan basah dan mangrove | Sabuk hijau dan lahan basah (I1) |
| **Unhas** | Gempa dan likuefaksi | Riset likuefaksi Palu | Daftar panjang: peta kota rawan (C4) |
| **Unpatti** | Tsunami, pulau kecil | Riset tsunami Ambon | Daftar panjang: sirene dan pesan (B7, B3) |
| **IPB** | Karhutla dan gambut | FFEWS di Muaro Jambi | Desa bebas api (G4) |

### ATURAN PEMILIHAN

**Cocok bahaya regional**
Ide lolos dipakai bila menjawab bahaya utama regional kampus itu.

**Ide lolos lainnya**
A5 dan C3 jadi program lintas; B2, B5, E5, F1, G1 jadi pendukung.

**Pengecualian**
Sulawesi dan Maluku memakai daftar panjang; dinilai ulang saat percontohan.

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026; riset web BNPB, 2 Nov 2026; kode ide di Lampiran A1*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Semua calon mitra di slide berikut wajib lolos 7 syarat uji tuntas, karena 32 perusahaan dikenai sanksi atas kebakaran 2026

## Syarat mitra dalam MoU

**Uji tuntas sebelum MoU**
Sanksi dan perkara diperiksa; afiliasi diumumkan

**Tema tidak bersinggungan**
Tambang tidak untuk banjir di DAS yang sama

**Sanksi kebakaran aktif**
Tidak menjadi mitra karhutla selama sanksi berlaku

**Tembakau**
Tidak diajukan sebagai calon mitra

**Tanpa merek produk**
Pada materi anak dan barang bantuan negara

**Penerima inklusif**
Walau dana lewat zakat atau yayasan

**Laporan publik**
Tiap tahun, kampus sebagai penilai hasil

## Mengapa pagar perlu

**32** perusahaan

**Perusahaan disanksi**
atas kebakaran 2026, Kemenhut

**335** perusahaan

**Perusahaan ditandai**
kebakaran di konsesi 2026, KLH

## CARA MENERAPKAN

### Lampiran MoU
Tujuh syarat menjadi lampiran baku tiap MoU flagship.

### Status calon mitra
Semua mitra di slide flagship berstatus calon sampai lolos uji.

### Bila dilanggar
Kerja sama ditunda sampai sanksi atau sengketa selesai.

**Sumber:** *Kementerian Kehutanan lewat Katadata, 19 Okt 2026; KLH dikutip media, 24 Agt 2026; PP 28/2024*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# USK memantau logistik Siklon Senyar di 7 dari 23 kabupaten/kota Aceh; Lumbung Siaga Aceh diusulkan menjadikannya stok siaga tetap

## Kabupaten/kota yang logistiknya dipantau USK




**Dipantau lewat WebGIS USK**

7 dari 23 kabupaten/kota
tujuh posko aktif dan tujuh dapur umum, Nov 2025

## Bukti saat Senyar

**120** orang

**Relawan dan mitra satgas**
hadir di temu satgas, Feb 2026

**25.000** liter per hari

**Air bersih calon mitra**
Medco, banjir Aceh 2025

### USULAN PERAN, BELUM DIJAJAKI

**USK (TDMRC)**
Menghitung stok siaga dan lokasi gudang dari data Senyar.

**Calon mitra**
Medco: pengolah air; Telkomsel: koneksi posko.

**BNPB**
Standar stok siaga, sambung ke gudang regional.

**Sumber:** *TDMRC USK, 12 Feb 2026; Good News From Indonesia; Kemendagri; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Cetak biru megathrust Unand dan Pegadaian dengan 5 komponen diserahkan ke Wali Kota Padang; flagship diusulkan melaksanakannya mulai dari tempat evakuasi

## Padang Siap Megathrust: usulan, belum dijajaki

| | SEKARANG | USULAN FLAGSHIP |
|---|---|---|
| **Cetak biru** | Diserahkan ke Wali Kota Padang, Juni 2026 | Dilaksanakan dengan target gedung dan masjid tiap kelurahan |
| **Tempat evakuasi** | Gedung dan masjid belum dinilai kelayakan strukturnya | Dinilai Unand dan ditetapkan BPBD sebagai tempat evakuasi resmi |
| **Biaya** | Belum ada pembagian biaya | Diusulkan: Pegadaian dan pemilik gedung membiayai rambu dan latihan |
| **Latihan** | Belum ada latihan skala kota | Latihan evakuasi kota tiap tahun bersama warga |

## Dasar yang sudah ada

**5** komponen

**Komponen cetak biru**
Unand dan Pegadaian, Jun 2026

**18** kampus

**Kampus sekitar**
regional Sumatera tengah dan selatan

## PROGRAM PENDUKUNG

**Hitung rugi megathrust**
Model kerugian bersama perusahaan reasuransi.

**Peringatan galodo**
Memakai alat dari flagship EWS Produksi Massal.

**Kampus aman bencana**
Unand menjadi contoh rencana evakuasi kampus.

**Sumber:** *Katadata, 3 Jul 2026; ANTARA, 24 Mei 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Korps Relawan menargetkan 5.000 anggota pada 2029; Korps Siaga Korporat diusulkan agar UI dan 5 kampus sekitarnya melatih regu karyawan dan mahasiswa

## Korps Siaga Korporat: usulan peran, belum dijajaki

| 1 UI (DRRC) | 2 Calon mitra usaha | 3 BNPB |
|---|---|---|
| • Kurikulum dan sertifikasi relawan | • Biaya pelatihan karyawan | • Mendaftarkan regu gabungan |
| • Pengalaman kontrak dengan industri | • Regu karyawan siap kirim | • Mengaktifkan saat darurat |
| • Mahasiswa satu regu dengan karyawan | • Perusahaan di Jakarta dan Banten | • Data relawan nasional |

## Target dan kampus regional

**5.000** anggota

**Target Korps Relawan**

nasional, 2029, paparan sebelumnya

**5** kampus

**Kampus sekitar UI**

regional DKI Jakarta dan Banten

## PROGRAM PENDUKUNG

**Tim medis darurat**
FK UI membentuk tim siap kirim berstandar.

**UMKM bangkit**
FEB UI bersama bank melatih rencana kelangsungan usaha.

**Pesan siaga di aplikasi**
Psikologi UI menguji pesan bersama platform digital.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Antara, 6 Mei 2024; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Kit kebersihan pengungsi berbasis riset kebutuhan diusulkan dirumuskan Lab Inovasi Kemanusiaan ITB, lalu dibagikan ke 10 kampus regional Jawa Barat

## Lab Inovasi Kemanusiaan: usulan peran, belum dijajaki

| 1 ITB | 2 Calon: Paragon | 3 BNPB |
|---|---|---|
| • Meneliti kebutuhan pengungsi | • Memproduksi pembersih tanpa air | • Spesifikasi generik jadi standar |
| • Merumuskan produk di Labtek XV | • Menyimpan stok siaga | • Pengadaan tetap terbuka |
| • Menguji kit di kejadian nyata | • Karyawan relawan menyalurkan | • Membuka uji di pengungsian |

## Kampus dan calon mitra

**10** kampus

**Kampus regional**
sekitar ITB di Jawa Barat

**30** ton

**Kapasitas kirim calon mitra**
bantuan Paragon ke Sumatera, Des 2025

PROGRAM PENDUKUNG

**Sekolah Siaga Imersif**
Bersama Telkom University; slide berikut.

**Sensor gempa di gedung**
Seismograf buatan ITB dipasang di gedung swasta.

**Asuransi bencana daerah**
ITB sudah bersama DJPK dalam ARISE fiskal.

**Sumber:** *Katadata, 19 Des 2025; ITB, 22 Jun 2025 dan 7 Agt 2025; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Satu program sekolah aman bencana swasta menjangkau 133 sekolah di Yogyakarta dalam dua tahun; Sekolah Siaga Imersif diusulkan membawa latihan VR ke Jawa Barat

## Sekolah Siaga Imersif: usulan peran, belum dijajaki

| PIHAK | USULAN PERAN | USULAN HASIL 2027 |
|---|---|---|
| **ITB** | Isi ilmiah gempa, longsor, banjir | Naskah empat modul |
| **Telkom University** | Konten VR portabel dan fasilitator | Modul dan fasilitator |
| **Calon mitra Telkom** | Koneksi sekolah; perangkat lewat pengadaan | Sekolah percontohan |
| **BNPB** | Kurikulum sekolah aman bencana | Uji hasil belajar |

## Modul sekolah yang sudah ada

**133** sekolah

**Sekolah SPAB**
Yogyakarta, 2022 sampai 2024

**21.922** orang

**Peserta SPAB**
Prudence Foundation dan Plan

## PROGRAM PENDUKUNG

**Modul tiap regional**
Konten dibuka untuk semua kampus dengan bahaya lokal.

**Peraga peringatan dini**
Flood Eye dipakai sebagai alat peraga di sekolah.

**Dome Theater Museum ITB**
Ruang tayang publik untuk film siaga.

**Sumber:** *Media Asuransi News, 29 Agt 2024; Telkom University; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Telkom University berada di regional ITB yang memuat 10 kampus sekitar; usulan: memimpin flagship tambahan dengan afiliasi Telkom diumumkan

## Dua pilihan status Telkom University

| | PILIHAN A: MEMIMPIN FLAGSHIP TAMBAHAN | PILIHAN B: PELAKSANA DI BAWAH ITB |
|---|---|---|
| **Aset** | Laboratorium VR dan Flood Eye dipakai penuh | Aset tetap dipakai, arah dari ITB |
| **Afiliasi** | Hubungan dengan Telkom diumumkan; penilai hasil dari kampus lain | Risiko afiliasi lebih kecil karena ITB memimpin |
| **Koordinasi** | Dua pemimpin flagship di satu regional | Satu pintu koordinasi Jawa Barat |
| **Kecepatan** | Lebih cepat, Tel-U memegang anggaran sendiri | Mengikuti jadwal koordinasi ITB |
| **Risiko** | Telkom juga calon mitra; konflik kepentingan perlu dijaga | Aset Tel-U kurang dipakai; beban ITB bertambah |

## Usulan


- Pilihan A untuk percontohan 2027: Telkom University punya laboratorium VR dan riset VR gempa.
- Syarat: afiliasi dengan Telkom diumumkan dan perangkat dibeli lewat pengadaan terbuka.
- Hasil belajar siswa dinilai kampus lain di regional Jawa Barat secara terbuka.
- Status dinilai ulang saat perluasan 2028 bersama ITB sebagai koordinator regional.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# GAMA-EWS sudah terpasang di 120 dari 514 kabupaten/kota; EWS Produksi Massal diusulkan memproduksinya bersama industri

## Kabupaten/kota yang sudah memasang GAMA-EWS

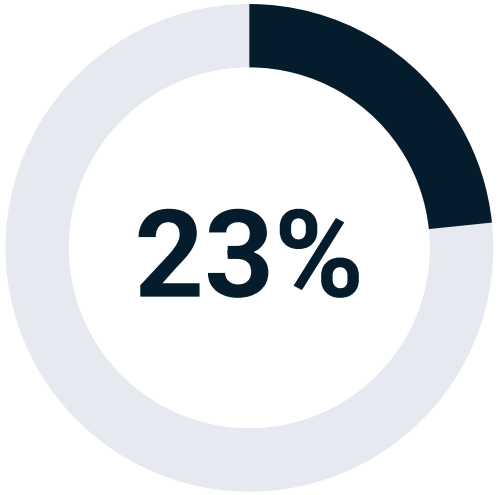


### Kabupaten/kota dengan GAMA-EWS

120 dari 514 kabupaten/kota
dipasang bersama BNPB dan pemda sampai 2024

## Target dan kampus pendukung

**1.000** unit

**Usulan target 2029**
alat buatan industri, standar UGM

**13** kampus

**Kampus regional**
sekitar UGM di Jawa Tengah dan DIY

**USULAN PERAN, BELUM DIJAJAKI**

**UGM**
Desain dan standar ISO; menguji unit hasil pabrik.

**Calon mitra industri**
Produksi massal dengan biaya per unit lebih rendah.

**BNPB dan BPBD**
Menetapkan desa rawan longsor dan banjir bandang.

**Sumber:** *International Consortium on Landslides, 24 Nov 2024; Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Kemendagri*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# RS Kapal Unair sudah melayani korban banjir Agam; ITS diusulkan merancang modul klinik siap pasang bersama Unair, salah satu dari 16 kampus regional

## Kapal Tanggap Bencana: usulan tahapan




## Bukti yang sudah ada

**16** kampus

**Kampus regional**

sekitar ITS di Jawa Timur, termasuk Unair

**8** provinsi

**Provinsi sasaran**

Kepulauan Maluku dan enam provinsi Papua

### USULAN PERAN, BELUM DIJAJAKI

**ITS dan Unair**
ITS merancang modul klinik; Unair menyiapkan tim medis kapal.

**Calon mitra PT PAL**
Membangun modul di galangan, lini kapal rumah sakit.

**BNPB**
Mengaktifkan saat darurat dan menjadwalkan siaga musim gelombang.

**Sumber:** *Unair, 13 Des 2025; Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Unram diusulkan menyiapkan paket desain rumah tahan gempa di toko bangunan, untuk ditiru 8 kampus regional Bali dan Nusa Tenggara

## Rumah Tahan Gempa: usulan peran, belum dijajaki

| PIHAK | USULAN PERAN | USULAN HASIL 2027 |
|---|---|---|
| **Unram dan UII** | Paket desain dan modul tukang | Paket desain baku |
| **Calon mitra AMMAN** | Pelatihan dan sertifikasi tukang | Tukang bersertifikat |
| **Produsen bahan** | Paket bahan di jaringan toko | Paket tersedia di toko |
| **BNPB** | Desain generik jadi acuan rehabilitasi | Diusulkan untuk pemulihan NTT |

## Desain yang sudah teruji




BARRATAGA, rumah rakyat tahan gempa (UII)

### DASAR YANG SUDAH ADA

**Kampus regional**
Sebanyak **8** kampus di Bali dan Nusa Tenggara bisa meniru paket.

**Calon mitra**
AMMAN mengirim tim tanggap darurat ke gempa Cianjur 2022.

**Program pendukung**
Hotel siap tsunami dan sekolah aman Bali; rincian di lampiran.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; AMMAN, 5 Des 2022; ANTARA; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# ULM mengelola 629 hektare mangrove; Desa Lahan Basah Tangguh diusulkan memakai pengalaman itu untuk desa rawa di Kalimantan

## Desa Lahan Basah Tangguh: usulan peran, belum dijajaki

| 1 ULM | 2 Calon mitra | 3 BNPB |
|---|---|---|
| • Memetakan desa rawa rawan | • PHKT: melatih regu desa | • BPBD menetapkan desa tangguh |
| • Peringatan dini berbasis warga | • Alat pemadam desa | • Data desa ke peringatan dini |
| • Budidaya tanpa bakar | • Diperiksa: perkara induk | • Perluasan ke lima provinsi |

## Bukti yang sudah ada

**629** hektare

**Mangrove dikelola**
hutan pendidikan ULM di Kotabaru

**5** provinsi

**Provinsi regional**
seluruh Kalimantan

PROGRAM PENDUKUNG

**Talenta Kalimantan**
Beasiswa kebencanaan lewat jalur beasiswa perusahaan yang ada.

**Sabuk hijau pesisir**
Mangrove Kotabaru sebagai peredam gelombang.

**Dukungan IKN**
Desa tangguh di sekitar ibu kota baru.

**Sumber:** *Antara Kalsel, 2023; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sulawesi Aman Bangun mengusulkan perluasan peta zona likuefaksi dan longsor dari Palu ke wilayah lain bersama 14 kampus regional Sulawesi

## Sulawesi Aman Bangun: usulan, belum dijajaki

| | SEKARANG | USULAN FLAGSHIP |
|---|---|---|
| **Peta bahaya** | Peta zona rawan Palu tersedia sesudah 2018 | Diperluas ke wilayah prioritas lain di Sulawesi |
| **Tata ruang** | Pemakaian peta di daerah lain belum seragam | Diusulkan masuk revisi rencana tata ruang |
| **Pendanaan** | Belum ada sumber dana pemetaan | Calon mitra di Sulawesi setelah lolos uji tuntas |
| **Batas peran mitra** | Belum ada aturan | Mitra tambang tidak dilibatkan pada tema banjir dan DAS |

## Bukti yang sudah ada

**14** kampus

**Kampus sekitar**
regional Sulawesi, termasuk Untad

**6** provinsi

**Provinsi regional**
seluruh Sulawesi, bersama Untad

## PROGRAM PENDUKUNG

**Kaji cepat hari pertama**
Korps drone mahasiswa Unhas dan Untad.

**Rumah tahan gempa**
Memakai paket dari flagship Rumah Tahan Gempa.

**Tim medis FK Unhas**
Tim siap kirim untuk Sulawesi.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; riset web BNPB, 2 Nov 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Pulau Siaga Terhubung diusulkan menyiapkan simpul komunikasi darurat di pulau kecil Maluku dan Papua bersama 8 kampus regional

## Dasar yang sudah ada di regional Maluku dan Papua

**8**
**Kampus regional**
termasuk Uncen dan Unkhair

**8**
**Provinsi regional**
Kepulauan Maluku dan Papua

**800**
**BTS baru calon mitra**
Telkomsel, 2023

**9**
**Fakultas tim Masela**
bersama INPEX, 2025

## Program pendukung

- Kembar kampus tsunami: lanjutan riset Ambon bersama TDMRC USK sejak 2022.
- Sabuk hijau pulau kecil: mangrove sebagai peredam gelombang.
- Tanggap darurat timur: tim perusahaan di Papua sebagai pendukung.

## USULAN PERAN, BELUM DIJAJAKI

**Unpatti**
Memetakan pulau tanpa jalur darurat; menguji pesan bahasa lokal.

**Calon mitra**
Telkomsel: BTS bergerak; INPEX: dana sirene di Tanimbar.

**BNPB**
Sambung ke sistem nasional; tetapkan pulau prioritas.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Antara Ambon, 2023 dan 17 Jan 2025; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sekitar 85.000 hektare konsesi terbakar pada 2026; IPB diusulkan menjadi verifikator independen desa bebas api dari program perusahaan

## Desa Bebas Api Terverifikasi: usulan peran, belum dijajaki

| PIHAK | USULAN PERAN | USULAN HASIL 2027 |
|---|---|---|
| **IPB dan Unri** | Verifikasi independen dan FFEWS | Standar verifikasi |
| **Calon mitra sawit** | Insentif desa dan regu pemadam | Desa Riau dan Jambi |
| **BPBD** | Mendampingi regu desa | Regu desa terlatih |
| **BNPB** | Standar dan data peringatan karhutla | Desa tercatat |

## Mengapa verifikasi perlu

**85.000** hektare

**Konsesi terbakar**
kebakaran 2026, KLH

**335** perusahaan

**Perusahaan ditandai**
kebakaran di konsesi 2026, KLH

PROGRAM PENDUKUNG

**Udara bersih musim asap**
Ruang udara bersih sekolah bersama Unri.

**Pangan darurat lokal**
Dirumuskan kampus pangan IPB.

**Gambut basah**
FFEWS memantau muka air gambut.

**Sumber:** *KLH dikutip media, 24 Agt 2026; Asian Agri, 3 Jul 2024; Mongabay, 15 Sep 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sebanyak 5 program lintas regional melengkapi flagship, dari pesan siaga di aplikasi sampai asuransi bencana daerah

BNPB

## Program lintas regional

| PROGRAM | ISI | PIHAK TERKAIT |
|---|---|---|
| 1 **Pesan Siaga di Aplikasi** | Pesan musiman diuji kampus | Calon: GoTo, Telkomsel |
| 2 **Meja Insentif Mitra** | Pendampingan pengurang pajak | Deputi Sistem dan Strategi |
| 3 **Dana Padanan** | Dana industri dipadankan negara | Kemdiktisaintek, LPDP |
| 4 **Pintu Dunia Usaha** | Kapasitas perusahaan dipetakan | Calon: Kadin |
| 5 **Asuransi Bencana Daerah** | Pembiayaan risiko aset daerah | ITB, DJPK, UNDRR |

## Kanal yang sudah terbukti

**129** miliar rupiah

**Donasi lewat GoPay**
sepanjang 2024

**25.000** orang

**Peserta kampanye siaga**
dilatih PetaBencana bersama BNPB, 2025

**Sumber:** *Bisnis.com, 10 Sep 2025; Yayasan Peta Bencana, 26 Apr 2025; Kabar Bursa, 1 Sep 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# 03

## Tata Kelola dan Tindak Lanjut


01 Brainstorming dan Penyaringan Ide 4–9

02 Flagship Kampus Koordinator 10–27

**03 Tata Kelola dan Tindak Lanjut 28–32**

# Tahap percontohan butuh satu sekretariat dan unit penanggung jawab per flagship dari 6 unit BNPB; biaya koordinasi dihitung setelah penjajakan

## Kebutuhan BNPB untuk percontohan

**Sekretariat program**
Lintas deputi, sesuai rencana 100 hari

**Unit pasangan**
Satu unit penanggung jawab per flagship; satu unit boleh memegang beberapa

**Penghubung kampus**
Satu dosen per kampus pelaksana flagship

**Meja insentif**
Di Deputi Bidang Sistem dan Strategi

**Biaya lapangan**
Dari calon mitra dan dana padanan

**Biaya koordinasi**
APBN BNPB, dihitung setelah penjajakan

## Dasar yang sudah ada

**6 unit**
**Unit BNPB berkebutuhan**
dipetakan di paparan sebelumnya

**11 kampus**
**Kampus koordinator**
ditambah Telkom University

**14 lembaga**
**Mitra pendukung**
pusat, daerah, masyarakat, internasional

YANG BELUM DIHITUNG

**Biaya koordinasi**
Dihitung bersama Biro Perencanaan setelah penjajakan.

**Beban kerja unit**
Diukur per unit pasangan pada triwulan pertama.

**Usulan anggaran**
Masuk perencanaan BNPB setelah izin prinsip.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Flagship berjalan tiga tahap, dari penjajakan 100 hari sampai perluasan ke 50 kampus mitra pada 2028 dan 100 kampus pada 2029

BNPB

## Tahapan flagship

| 1 Penjajakan 100 hari | 2 Percontohan 2027 | 3 Perluasan 2028–2029 |
|---|---|---|
| **BNPB dan kampus koordinator** | **Kampus, mitra, BNPB** | **Kampus sekitar dan BPBD** |
| • SK tim dan unit pasangan<br>• Uji tuntas calon mitra<br>• Surat minat dan rancangan MoU | • Satu lokasi tiap flagship<br>• Ukuran hasil disepakati<br>• Laporan publik pertama | • Ditiru **50** lalu **100** kampus mitra<br>• Spesifikasi generik jadi standar BNPB<br>• Mitra baru lewat pintu dunia usaha |
| **Hasil:** Mitra sepakat | **Hasil:** Hasil terukur | **Hasil:** Program tetap |

BILA KEPUTUSAN DITUNDA

**Percontohan mundur**
Lokasi 2027 belum siap sebelum musim kemarau 2027.

**Anggaran mitra lewat**
Rencana TJSL 2027 disusun perusahaan pada akhir 2026.

**Insentif tak terpakai**
Pengurang pajak dihitung per tahun pajak berjalan.

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Daftar 12 flagship yang dimintakan persetujuan, dengan usulan unit BNPB pasangan dan ukuran hasil percontohan 2027

## Unit pasangan dan ukuran hasil tiap flagship

| KAMPUS | FLAGSHIP | UNIT PASANGAN USULAN | UKURAN HASIL 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 USK | Lumbung Siaga Aceh | Logistik dan Peralatan | Satu gudang bersama di Banda Aceh |
| 2 Unand | Padang Siap Megathrust | Pencegahan | Gedung dan masjid zona merah dinilai |
| 3 UI | Korps Siaga Korporat | Penanganan Darurat | Kurikulum dan perusahaan pertama |
| 4 ITB | Lab Inovasi Kemanusiaan | Logistik dan Peralatan | Spesifikasi kit teruji di satu kejadian |
| 5 Tel-U | Sekolah Siaga Imersif (bersyarat) | Pencegahan | Modul dan uji hasil belajar di sekolah |
| 6 UGM | EWS Produksi Massal | Pencegahan | Unit pabrik pertama lolos uji standar |
| 7 ITS | Kapal Tanggap Bencana | Penanganan Darurat | Desain modul, uji di satu kapal |
| 8 Unram | Rumah Tahan Gempa | Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Paket desain dan tukang bersertifikat |
| 9 ULM | Desa Lahan Basah Tangguh | Pencegahan | Desa percontohan Kalsel dan Kaltim |
| 10 Unhas | Sulawesi Aman Bangun | Sistem dan Strategi | Peta wilayah prioritas ke pemda |
| 11 Unpatti | Pulau Siaga Terhubung | Pusdatinkom | Peta pulau terputus di Maluku |
| 12 IPB | Desa Bebas Api Terverifikasi | Penanganan Darurat | Standar verifikasi dan desa percontohan |

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026; unit dari paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Sebanyak 3 keputusan diminta dari Kepala BNPB, lalu 3 tindak lanjut dijalankan unit BNPB untuk memulai flagship

| LANGKAH | RINCIAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|
| **Setujui daftar flagship** — 100 hari | Usulan: Telkom University memimpin flagship tambahan; alternatif: pelaksana di bawah koordinasi ITB. | Kepala BNPB |
| **Tunjuk unit pasangan** — 100 hari | Tiap flagship mendapat satu unit BNPB penanggung jawab dan satu penghubung kampus. | Kepala BNPB |
| **Izinkan penjajakan calon mitra** — 100 hari | Penjajakan hanya dengan calon mitra yang lolos tujuh syarat uji tuntas. | Kepala BNPB |
| **Buka meja insentif mitra** — 2026–2027 | Membantu perusahaan memakai pengurang pajak: sumbangan bencana lewat BNPB, litbang lewat kampus. | Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB |
| **Terbitkan pedoman uji tuntas** — 100 hari | Tujuh syarat mitra masuk pedoman dan menjadi lampiran tiap MoU. | Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB |
| **Laporan publik tahunan** — 2026–2027 | Laporan pertama akhir 2027, lalu tiap tahun; hasil diukur kampus dan diumumkan. | Pusdatinkom BNPB; Kampus koordinator |

**Sumber:** *Paparan kerja sama perguruan tinggi, 30 Okt 2026; Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Terima kasih











CALL CENTER
**117**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia

**© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana**
*Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana*

Foto: Ilham Kuniawan Gumilang (UI), A2613 (ITB), Alharomain354 (UGM), Davidelit (IPB); CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

# Lampiran


**A, Daftar ide beserta profil mitra**

**A1** Daftar panjang ide 35–37

**A2** Program pendukung flagship 38–39

**A3** Profil calon mitra swasta 40


© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# A1. Daftar panjang ide program dari brainstorming dan statusnya

| KODE | GUGUS | IDE | STATUS |
|---|---|---|---|
| **A1** | Edukasi | Sekolah Siaga VR | Lolos |
| **A2** | Edukasi | Truk simulasi bencana keliling | Kegiatan pendukung |
| **A3** | Edukasi | Game jam kebencanaan nasional | Kegiatan pendukung |
| **A4** | Edukasi | Buku cerita siaga berbahasa daerah | Kegiatan pendukung |
| **A5** | Edukasi | Pesan siaga di aplikasi harian | Lolos |
| **A6** | Edukasi | Museum bencana virtual | Cadangan |
| **A7** | Edukasi | Siaga ramah disabilitas | Kegiatan pendukung |
| **B1** | Peringatan dini | Alat kampus diproduksi massal | Lolos |
| **B2** | Peringatan dini | Sensor gempa di gedung swasta | Lolos |
| **B3** | Peringatan dini | Uji pesan peringatan seluler | Kegiatan pendukung |
| **B4** | Peringatan dini | Banjir laporan pengemudi | Cadangan |
| **B5** | Peringatan dini | Kaji cepat hari pertama | Lolos |
| **B6** | Peringatan dini | Pemantauan muka air gambut terbuka | Kegiatan pendukung |
| **B7** | Peringatan dini | Sirene sekolah dan rumah ibadah | Kegiatan pendukung |
| **C1** | Data dan AI | Data berbagi untuk kemanusiaan | Cadangan |
| **C2** | Data dan AI | Tantangan Bank Masalah | Kegiatan pendukung |
| **C3** | Data dan AI | Hitung rugi dan asuransi bencana | Lolos |
| **C4** | Data dan AI | Kembaran digital kota rawan | Kegiatan pendukung |

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# A1. Daftar panjang ide program dari brainstorming dan statusnya (lanjutan 2/3)

| KODE | GUGUS | IDE | STATUS |
|---|---|---|---|
| **C5** | Data dan AI | Taksir rusak dari foto | Cadangan |
| **D1** | Hunian | Rumah tahan gempa di toko bangunan | Lolos |
| **D2** | Hunian | Sekolah dan puskesmas aman | Kegiatan pendukung |
| **D3** | Hunian | Gedung swasta jadi tempat evakuasi | Lolos |
| **D4** | Hunian | Hunian sementara modular | Kegiatan pendukung |
| **D5** | Hunian | Bata dari puing | Kegiatan pendukung |
| **E1** | Logistik | Gudang bersama dan stok siaga | Lolos |
| **E2** | Logistik | Kapal tanggap bencana kepulauan | Lolos |
| **E3** | Logistik | Bantuan sesuai kebutuhan | Kegiatan pendukung |
| **E4** | Logistik | Kit martabat berbasis riset | Lolos |
| **E5** | Logistik | Pangan darurat bergizi lokal | Lolos |
| **E6** | Logistik | Listrik dan air di hari pertama | Kegiatan pendukung |
| **F1** | Kesehatan | Tim medis darurat kampus | Lolos |
| **F2** | Kesehatan | Pemulihan jiwa anak | Kegiatan pendukung |
| **F3** | Kesehatan | Klinik pengungsian jarak jauh | Kegiatan pendukung |
| **F4** | Kesehatan | Udara bersih di musim asap | Cadangan |
| **F5** | Kesehatan | Wabah setelah banjir | Kegiatan pendukung |
| **G1** | Ekonomi | UMKM bangkit | Lolos |

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# A1. Daftar panjang ide program dari brainstorming dan statusnya (lanjutan 3/3)

| KODE | GUGUS | IDE | STATUS |
|---|---|---|---|
| **G2** | Ekonomi | Asesmen ketangguhan kawasan industri | Kegiatan pendukung |
| **G3** | Ekonomi | Asuransi mikro petani dan nelayan | Kegiatan pendukung |
| **G4** | Ekonomi | Desa bebas api berinsentif | Lolos |
| **H1** | Talenta | Relawan karyawan dan mahasiswa | Lolos |
| **H2** | Talenta | Beasiswa tangguh | Kegiatan pendukung |
| **H3** | Talenta | Magang ketangguhan usaha | Kegiatan pendukung |
| **H4** | Talenta | Sertifikasi petugas siaga perusahaan | Kegiatan pendukung |
| **H5** | Talenta | Pusat latihan simulasi regional | Kegiatan pendukung |
| **H6** | Talenta | Pakar kampus siaga panggil | Kegiatan pendukung |
| **I1** | Berbasis alam | Sabuk hijau pesisir | Lolos |
| **I2** | Berbasis alam | Gambut basah | Kegiatan pendukung |
| **I3** | Berbasis alam | Hulu sehat hilir aman | Kegiatan pendukung |
| **J1** | Tata kelola | Perusahaan tangguh bencana | Kegiatan pendukung |
| **J2** | Tata kelola | Belajar dari bencana | Cadangan |
| **J3** | Tata kelola | Dana abadi riset kebencanaan | Kegiatan pendukung |
| **J4** | Tata kelola | Laporan risiko tahunan | Kegiatan pendukung |
| **J5** | Tata kelola | Kantor hilirisasi inovasi kebencanaan | Cadangan |

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# A2. Program pendukung tiap flagship

| KAMPUS | PROGRAM | ISI |
|---|---|---|
| **USK** | Belajar dari Senyar | Laporan pelajaran tanggap darurat |
| **USK** | EvaNami dan latihan VR | Aplikasi evakuasi tsunami di sekolah pesisir |
| **USK** | Konsorsium kampus | Jejaring kampus kebencanaan |
| **UI** | Tim medis darurat | Tim FK UI siap kirim |
| **UI** | UMKM bangkit | Rencana kelangsungan usaha bersama bank |
| **UI** | Pesan siaga di aplikasi | Pesan diuji Psikologi UI |
| **UGM** | KKN di desa binaan swasta | Desa binaan jadi lokasi KKN tematik |
| **UGM** | Taksir rusak dari foto | Model AI kampus |
| **UGM** | Unit tanggap darurat | ERU UGM sebagai model satgas |
| **Unram** | Pariwisata tangguh | Hotel siap tsunami bersama Unud |
| **Unram** | Sekolah aman Bali | Model provinsi SPAB |
| **Unram** | Asuransi bencana Bali | Provinsi uji ARISE fiskal DJPK |
| **Unand** | Hitung rugi megathrust | Model kerugian bersama reasuransi |
| **Unand** | Peringatan galodo | Memakai alat EWS Produksi Massal |
| **Unand** | Kampus aman bencana | Rencana evakuasi kampus |

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# A2. Program pendukung tiap flagship (lanjutan 2/2)

| KAMPUS | PROGRAM | ISI |
|---|---|---|
| **ITB** | Sensor gempa di gedung | Seismograf ITB di gedung swasta |
| **ITB** | Asuransi bencana daerah | ARISE fiskal bersama DJPK |
| **Tel-U** | Modul tiap regional | Konten bahaya lokal untuk semua kampus |
| **Tel-U** | Peraga peringatan dini | Flood Eye di sekolah |
| **ITS** | Peringatan lahar Semeru | Sensor Puslit MKPI bersama BPBD Jatim |
| **ITS** | Robot SAR dan logistik | Pengembangan RAISA |
| **ULM** | Talenta Kalimantan | Beasiswa kebencanaan |
| **ULM** | Sabuk hijau pesisir | Mangrove Kotabaru |
| **Unhas** | Kaji cepat hari pertama | Korps drone Unhas dan Untad |
| **Unhas** | Tim medis FK Unhas | Tim siap kirim Sulawesi |
| **Unpatti** | Kembar kampus tsunami | Riset Ambon bersama TDMRC USK |
| **Unpatti** | Sabuk hijau pulau kecil | Mangrove peredam gelombang |
| **IPB** | Udara bersih musim asap | Ruang udara bersih sekolah bersama Unri |
| **IPB** | Pangan darurat lokal | Kampus pangan IPB |
| **IPB** | Gambut basah | FFEWS memantau muka air |

**Sumber:** *Brainstorm ide BNPB, 2 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# A3. Profil calon mitra swasta beserta pagarnya

| MITRA | REKAM JEJAK | ASET DIBAWA | YANG WAJIB DIPERIKSA |
|---|---|---|---|
| **MedcoEnergi** | Bantuan dan air bersih banjir Aceh, 2025 | Pengolah air, stok bantuan | Uji tuntas standar; belum ada kaitan dengan USK |
| **Pegadaian** | Cetak biru megathrust bersama Unand, 2026 | Dana pelaksanaan | Uji tuntas standar |
| **Astra** | Posko, alat berat, relawan Sumatera, 2025 | Relawan, armada, desa binaan | Uji tuntas standar |
| **Bank Mandiri** | Penyaluran bantuan Sumatera, 2025 | Relawan, kredit pemulihan | Uji tuntas standar |
| **ParagonCorp** | Bantuan Sumatera dan Cianjur; Labtek XV ITB | Produk, stok, relawan karyawan | Penerima inklusif bila lewat zakat |
| **Telkom dan Telkomsel** | Pemulihan jaringan dan satelit posko, 2025 | Platform, koneksi, BTS bergerak | Status platform VR; afiliasi dengan Tel-U |
| **PT Len Industri** | Industrialisasi alat BMKG | Manufaktur alat | Belum ada kaitan dengan UGM |
| **PT PAL** | Kerja sama strategis dengan ITS, 2026 | Galangan kapal | Batasi ke lini kapal rumah sakit |
| **AMMAN** | Tim tanggap darurat ke Cianjur, 2022 | Personel, logistik, dana | Uji tuntas standar |
| **Pertamina Hulu Kaltim** | Pelatihan pemadam warga, latihan darurat | Pelatihan dan peralatan | Perkara hukum induk perusahaan |
| **PT Vale Indonesia** | Hibah alat dan kajian DAS Luwu Utara, 2025 | Dana, alat berat | Kasus Towuti; tidak untuk tema banjir dan DAS |
| **INPEX** | Beasiswa dan laboratorium Masela bersama Unpatti | Dana dan sirene | Uji tuntas standar |
| **GoTo** | Kanal donasi GoPay Rp129 miliar, 2024 | Kanal pesan dan donasi | Uji tuntas standar |
| **Asian Agri, Musim Mas** | Program desa bebas api | Insentif desa, regu | Daftar sanksi dan catatan pemasok |

**Sumber:** *Riset web BNPB, 2 Nov 2026: situs perusahaan, ANTARA, Katadata, Bisnis.com, Kemenhut, KLH*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
