BNPB

Alur Kerja Sama BNPB dan Perguruan Tinggi sampai Finalisasi PKS

Alur ini terdiri atas delapan tahap, dari pemetaan kampus sampai perjanjian yang dapat dijalankan dan dibiayai.

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Tenaga Ahli Kepala BNPB Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

Jakarta, 11 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: Alharomain354, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Daftar Isi

Alur Kerja Sama BNPB dan Perguruan Tinggi sampai Finalisasi PKS

01 Alur Delapan Tahap 5–10

02 Dokumen dan Titik *Closing* 11–13

03 Pendanaan dan Keputusan 14–19

Kerja sama dengan kampus baru selesai saat PKS yang memuat kegiatan beserta sumber dananya ditandatangani kedua pihak

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

POKOK

8
tahap dari pemetaan kampus sampai evaluasi

28
dokumen yang disiapkan sepanjang alur

6
syarat PKS dianggap final

Titik *Closing*

NK belum *closing*
NK tidak mengikat dan tidak memuat kewajiban dana.

PKS adalah *closing*
Sumber dananya termasuk beban masing-masing pihak.

Waktu tempuh
Satu kampus perlu **3** sampai **4** bulan sejak kunjungan awal.

Studium generale
Acara ini menjadi panggung penandatanganan NK.

Perubahan Alur

Pemetaan lebih awal
Kampus dipilih sebelum kunjungan awal.

Satu lokakarya
Dua pertemuan digabung dengan keluaran tertulis.

Biro HOK lebih awal
Biro HOK ikut sejak tim kerja dibentuk.

Syarat lanjut
Setiap tahap baru berlanjut bila syaratnya terpenuhi.

Dana dan Langkah

PKS bila siap
PKS ikut ditandatangani pada hari acara bila sudah siap.

PKS pertama
Kegiatannya memakai beban masing-masing pihak.

Mulai dari UGM
NK BNPB dan UGM berakhir pada 22 Februari 2027.

Dana BNPB
Program baru masuk pagu indikatif 2028.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kampus mendapat 5 manfaat dari kerja sama, mulai dari akses data bencana sampai perjanjian yang tercatat

Yang Kita Tawarkan untuk Kampus

Akses data bencana
Peneliti kampus memakai data kejadian dan risiko bencana sesuai aturan Satu Data Bencana.

Lokasi riset dan uji lapangan
Kita membuka akses lapangan bersama BPBD untuk riset dan uji inovasi kampus.

Kegiatan mahasiswa yang diakui
Mahasiswa dapat ikut KKN tematik kebencanaan atau korps relawan kampus.

Jalur hibah bersama
Kampus dan BNPB dapat mengajukan proposal bersama ke pemberi hibah riset.

Kerja sama yang tercatat
Perjanjian kerja sama bernomor menjadi bukti kinerja kerja sama kampus.

Yang Kita Minta dari Kampus

Penghubung tetap
Kampus menunjuk penghubung yang berwenang.

Pakar yang sesuai
Kampus menugaskan pakar sesuai ancaman wilayah.

Keluaran terukur
Setiap kegiatan memiliki keluaran yang dapat diperiksa.

Laporan berkala
Kampus melaporkan kemajuan kepada BNPB.

Data bersama
Hasil riset dibagikan untuk memperkaya data bencana.

Keterangan: BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. KKN adalah kuliah kerja nyata.

Sumber: *Program Kemitraan BNPB dan Perguruan Tinggi, 30 Okt 2026; dokumen alur, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



01

Alur Delapan Tahap

01 **Alur Delapan Tahap** 5–10

02 Dokumen dan Titik *Closing* 11–13

03 Pendanaan dan Keputusan 14–19

Alur kerja sama terdiri atas 8 tahap dalam 4 fase, dan setiap fase memiliki syarat lanjut yang jelas

Fase Beserta Syarat Lanjutnya

1 Penjajakan	2 Perumusan	3 Pengesahan	4 Pelaksanaan
Tahap pertama sampai ketiga	**Tahap keempat dan kelima**	**Tahap keenam dan ketujuh**	**Tahap kedelapan**
• Kita memetakan kampus dan menyiapkan tawaran. • Kita berkunjung untuk mendengar minat kampus. • Kedua pihak membentuk tim kerja bersama.	• Lokakarya mencocokkan masalah dan keahlian. • Tahap kelima mengunci rencana dan dananya. • Kunjungan teknis memastikan kesiapan.	• NK ditandatangani pada *studium generale*. • PKS ditandatangani lalu dicatat di JDIH. • Kegiatan pertama dijadwalkan dalam dua bulan.	• Kedua pihak menjalankan rencana kerja. • Laporan kemajuan disampaikan secara berkala. • Evaluasi tahunan menentukan PKS lanjutan.
Syarat: Tim lengkap dan draf NK terkirim.	**Syarat:** NK diparaf dan draf PKS ditelaah.	**Syarat:** Kegiatan pertama siap dimulai.	**Syarat:** Evaluasi menjadi dasar PKS baru.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Empat tahap pertama menyiapkan program prioritas bersama kampus dalam 8 minggu sejak pemetaan dimulai

Tahap Pertama sampai Keempat

TAHAP	KELUARAN	SYARAT LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	MINGGU KE
1. Pemetaan kampus	Profil kampus dan usulan program	Ada pakar yang cocok dengan ancaman wilayah	Tenaga Ahli Kepala BNPB	1 sampai 2
2. Kunjungan awal	Notula dan nama penghubung kampus	Pimpinan kampus setuju menunjuk tim	Tenaga Ahli dan wakil rektor	3 sampai 4
3. Tim kerja bersama	Surat penunjukan tim dan jadwal kerja	Biro HOK masuk tim dan draf NK terkirim	Ketua tim kedua pihak	4 sampai 5
4. Lokakarya program	Matriks program dan program prioritas	Unit teknis BNPB bersedia memegang program	Tim kerja dan unit teknis	6 sampai 8

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB.

Catatan Pelaksanaan

Tawaran spesifik
Usulan program cocok dengan wilayah.

Surat resmi
Surat ditujukan ke unit kerja sama.

Tim tertulis
Tim ditetapkan dengan surat resmi.

Pemilik program
Unit teknis memegang tiap program.

Draf NK
Biro HOK mengirim draf sejak awal.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Empat tahap berikutnya mengunci dana, mengesahkan NK di *studium generale*, dan menuntaskan PKS paling lambat 4 minggu sesudahnya

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Tahap Kelima sampai Kedelapan

TAHAP	KELUARAN	SYARAT LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	MINGGU KE
5. Finalisasi program dan pendanaan	Rencana kegiatan berbiaya dan NK berparaf	Sumber dana tertulis dan draf PKS tertelaah	Unit teknis dan Biro HOK	9 sampai 11
6. *Studium generale*	NK bertanda tangan dan PKS bila siap	NK sah	Panitia gabungan	12 sampai 14
7. Finalisasi PKS	PKS bernomor dan tercatat di JDIH	Kegiatan pertama dapat dimulai dan dibiayai	Penanda tangan PKS dan PPK	15 sampai 18
8. Pelaksanaan	Laporan kemajuan dan evaluasi tahunan	Evaluasi menentukan PKS lanjutan	Penanggung jawab program	Sepanjang masa PKS

Catatan Pelaksanaan

Naskah lebih awal
NK diparaf sebelum tanggal acara.

Hari yang sama
PKS ikut ditandatangani bila siap.

Closing
Tahap ketujuh selesai saat dana siap.

NK berlaku
UMY dan Unpad cukup menyusun PKS.

Evaluasi
Laporan tahunan menentukan PKS lanjutan.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. PPK adalah pejabat pembuat komitmen yang menandatangani kontrak atas nama pemilik anggaran.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pembagian peran 7 pihak menunjukkan Biro HOK mulai bekerja pada tahap ketiga, saat tim kerja dibentuk

KRIS KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Peran Tiap Pihak di Setiap Tahap

TAHAP	TENAGA AHLI	BIRO HOK	UNIT TEKNIS	PPK	REKTORAT	HUKUM	FAKULTAS
1. Pemetaan kampus	Pelaksana	Tidak terlibat	Tidak terlibat	Tidak terlibat	Tidak terlibat	Tidak terlibat	Tidak terlibat
2. Kunjungan awal	Pelaksana	Tidak terlibat	Dilibatkan	Tidak terlibat	Pelaksana	Tidak terlibat	Dilibatkan
3. Tim kerja bersama	Pelaksana	Pelaksana	Dilibatkan	Tidak terlibat	Penyetuju	Dilibatkan	Dilibatkan
4. Lokakarya program	Pelaksana	Dilibatkan	Pelaksana	Tidak terlibat	Dilibatkan	Dilibatkan	Pelaksana
5. Finalisasi program dan pendanaan	Dilibatkan	Pelaksana	Pelaksana	Dilibatkan	Penyetuju	Pelaksana	Pelaksana
6. *Studium generale*	Pelaksana	Pelaksana	Dilibatkan	Tidak terlibat	Penyetuju	Dilibatkan	Dilibatkan
7. Finalisasi PKS	Dilibatkan	Pelaksana	Penyetuju	Pelaksana	Penyetuju	Pelaksana	Dilibatkan
8. Pelaksanaan	Dilibatkan	Dilibatkan	Pelaksana	Dilibatkan	Dilibatkan	Tidak terlibat	Pelaksana

Tidak terlibat Dilibatkan Penyetuju Pelaksana

Arti Peran

Pelaksana
Pihak ini mengerjakan keluaran.

Penyetuju
Pihak ini memberi persetujuan.

Dilibatkan
Pihak ini dimintai masukan.

Tidak terlibat
Pihak ini tidak bekerja.

Keterangan: Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB. PPK adalah pejabat pembuat komitmen yang menandatangani kontrak atas nama pemilik anggaran. Kolom Tenaga Ahli berarti Tenaga Ahli Kepala BNPB; kolom Rektorat dan Hukum berarti pimpinan dan bagian hukum kampus.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026; penilaian tim*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Papan pantau memperlihatkan 2 kampus harus menempuh semua tahap, sedangkan 2 kampus dapat mempersingkatnya

KRIS KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Status Awal Empat Kampus per Fase Menurut Masa Berlaku NK

KAMPUS	PENJAJAKAN	PERUMUSAN	PENGESAHAN	PELAKSANAAN
ITB (NK berakhir Februari 2022)	Penuh	Penuh	Penuh	Penuh
UGM (NK berakhir Februari 2027)	Penuh	Penuh	Penuh	Penuh
UMY (NK berlaku sampai Februari 2029)	Ringkas	Ringkas	Penuh	Penuh
Unpad (NK berlaku sampai Juni 2031)	Ringkas	Ringkas	Penuh	Penuh

Ringkas Penuh

Cara Membaca Papan

Sel Penuh
Fase itu dijalani lengkap.

Sel Ringkas
Fase itu dapat dipersingkat.

UGM tetap penuh
NK UGM berakhir sebelum PKS selesai.

NK masih berlaku
UMY dan Unpad cukup menyusun PKS.


Pembaruan
Papan diperbarui setiap pekan.

Kampus baru
Kampus sasaran ditambah sebagai baris.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama.

Sumber: *Naskah NK BNPB dengan ITB, UGM, UMY, Unpad; dokumen alur, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

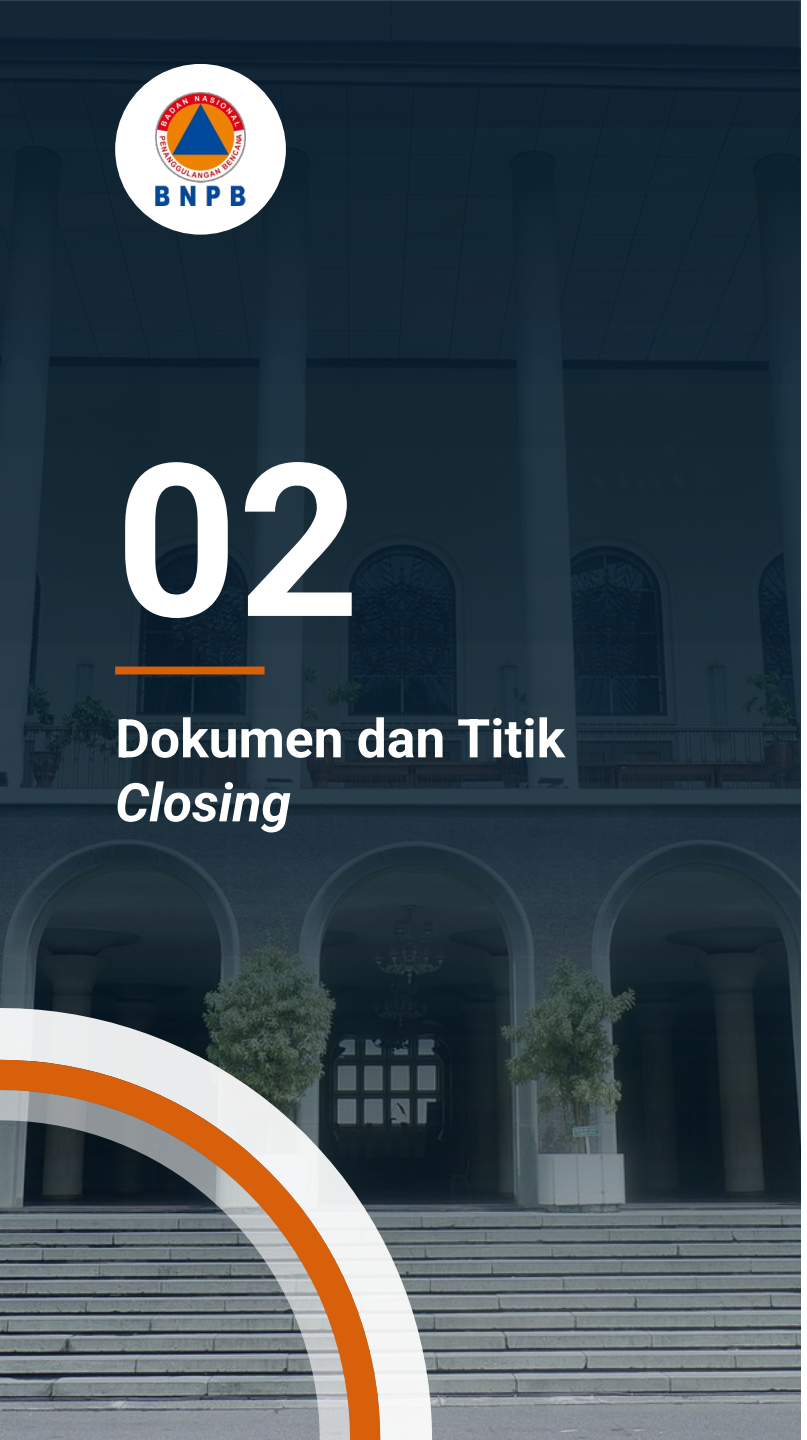

02

Dokumen dan Titik *Closing*

01 Alur Delapan Tahap 5–10

02 Dokumen dan Titik *Closing* **11–13**

03 Pendanaan dan Keputusan 14–19

Sebanyak 21 dari 28 dokumen belum tersedia, dan beban terbesar ada pada tahap finalisasi program dan pendanaan

Jumlah Dokumen per Tahap Menurut Ketersediaannya

jumlah dokumen; rincian lengkap di lampiran

TAHAP	TERSEDIA	TERSEDIA SEBAGIAN	BELUM TERSEDIA
1. Pemetaan kampus	1	1	0
2. Kunjungan awal	2	0	1
3. Tim kerja bersama	1	0	2
4. Lokakarya program	0	0	3
5. Finalisasi program dan pendanaan	0	0	6
6. *Studium generale*	1	1	1
7. Finalisasi PKS	0	0	4
8. Pelaksanaan	0	0	4

jumlah dokumen 0 | 1 | 2 sampai 3 | 4 | 5 atau lebih

Yang Perlu Disiapkan

Tahap kelima
Enam dokumen belum ada, termasuk KAK.

Templat PKS
Templat resmi diminta ke Biro HOK.

Sudah tersedia
Lima dokumen siap, termasuk draf NK.

Tersedia sebagian
Profil kampus dilengkapi per kampus.

Tahap ketujuh
Empat dokumen disusun bersama kampus.

Tahap kedelapan
Empat laporan disusun saat kegiatan berjalan.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. KAK adalah kerangka acuan kerja. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PKS baru dianggap final bila memenuhi 6 syarat dan memuat 12 pasal minimum yang disepakati kedua pihak

Syarat PKS Final

Ditandatangani pejabat berwenang
Penanda tangan kedua pihak memiliki dasar kewenangan.

Bernomor dan tercatat
Naskah bernomor dan dicatat di JDIH BNPB.

Kegiatan memiliki KAK
Setiap kegiatan memiliki keluaran yang dapat diperiksa.

Sumber dana tertulis
Setiap kegiatan menyebut sumber dananya.

Penanggung jawab tertulis
Penanggung jawab kedua pihak tertulis beserta jabatannya.

Jadwal kegiatan pertama
Kegiatan pertama dimulai paling lambat dua bulan sesudah PKS ditandatangani.


Muatan Minimum PKS

PASAL	ISI YANG DIPUTUS
1 **Para pihak**	Penanda tangan dan pelimpahannya
2 **Rujukan NK**	Nomor dan tanggal NK induk
3 **Ruang lingkup**	Program yang dijalankan sesuai KAK
4 **Hak dan kewajiban**	Pembagian tugas per kegiatan
5 **Pembiayaan**	Sumber dana dan cara pencairannya
6 **Hasil dan hak cipta**	Pemilik hasil kajian dan data
7 **Data dan kerahasiaan**	Akses data dan data pribadi
8 **Pelaporan dan evaluasi**	Laporan dan evaluasi tahunan
9 **Jangka waktu**	Satu sampai tiga tahun
10 **Keadaan kahar**	Bencana yang menghentikan kegiatan
11 **Perselisihan**	Musyawarah untuk mufakat
12 **Perubahan dan penutup**	Adendum dan jumlah rangkap

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. KAK adalah kerangka acuan kerja. JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: *Peraturan BRIN 2/2022 juncto 4/2024; dokumen alur, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

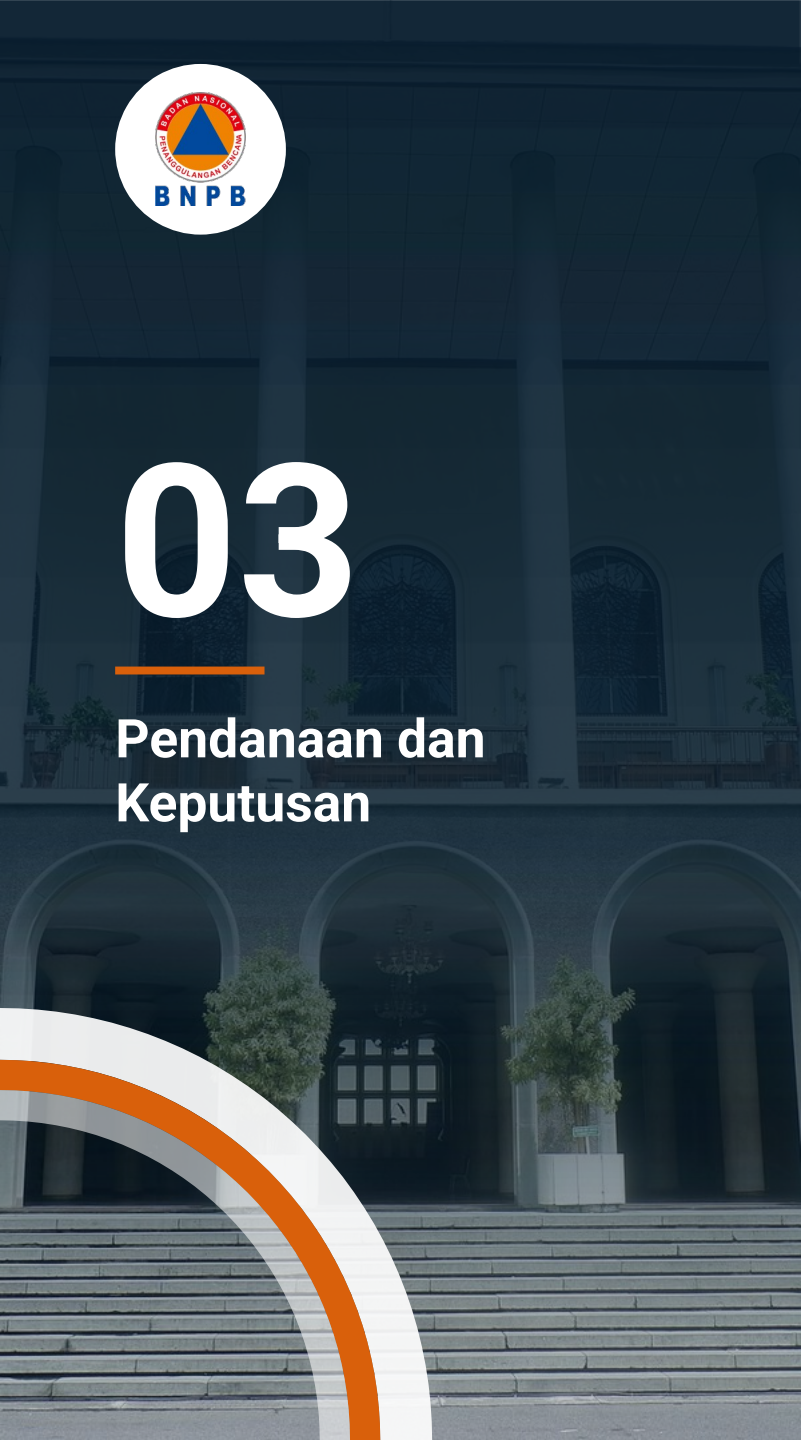

03

Pendanaan dan Keputusan

01 Alur Delapan Tahap 5–10

02 Dokumen dan Titik *Closing* 11–13

03 Pendanaan dan Keputusan 14–19

Dari 5 skema pendanaan, PKS tanpa aliran dana BNPB paling cepat karena tidak menunggu siklus anggaran

Skema Pendanaan Kegiatan

SKEMA	CARA KERJA	KECEPATAN	COCOK UNTUK
A. Beban masing-masing	Kita memberi data dan akses; kampus memakai dana sendiri	Paling cepat	PKS pertama dan riset kecil
B. Dana BNPB	Kegiatan masuk DIPA dan dijalankan lewat swakelola	Lambat	Kajian pesanan BNPB dan pelatihan besar
C. Dana kampus	Hibah internal kampus diarahkan ke masalah BNPB	Cepat	Riset dosen dan tugas akhir
D. Hibah pihak ketiga	Kampus dan BNPB mengajukan proposal bersama	Sedang	Riset besar dan inovasi
E. Dunia usaha	Perusahaan atau BUMN mendanai kegiatan bersama	Sedang	Peralatan dan pelatihan relawan

Rekomendasi Pendanaan

Isi PKS
PKS memuat kegiatan beserta sumber dananya.

Beban sendiri
Sumber dana termasuk beban masing-masing pihak.

Dana BNPB
Program berdana BNPB diusulkan untuk 2028.

Revisi anggaran
Unit teknis dapat memakai revisi DIPA 2027.

Kampus swasta
Mekanisme dana dikonfirmasi ke Biro HOK.

Keterangan: PKS adalah perjanjian kerja sama. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. BUMN adalah badan usaha milik negara. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari 5 titik siklus anggaran, usulan pagu indikatif pada Maret sampai April 2027 menjadi pintu utama dana BNPB untuk kampus

KRIS KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Patokan Siklus Anggaran Pemerintah

1 Alokasi anggaran	2 DIPA terbit	3 Pagu indikatif	4 Pagu anggaran	5 DIPA berikutnya
Sekitar Oktober	**Desember**	**Maret sampai April**	**Sekitar Juli**	**Oktober sampai Desember**
• Alokasi tahun berikutnya ditetapkan. • Anggaran 2027 sudah dialokasikan. • Alokasi 2028 ditetapkan sekitar Oktober 2027.	• DIPA tahun berikutnya terbit. • Belanja unit teknis dimulai Januari. • DIPA 2028 terbit pada Desember 2027.	• Unit teknis mengusulkan program. • Program kampus untuk 2028 masuk di sini. • Usulan disiapkan sejak Januari 2027.	• Pagu tahun berikutnya ditetapkan. • Usulan program disesuaikan. • Pagu 2028 ditetapkan sekitar Juli 2027.	• Siklus berulang setiap tahun. • DIPA memuat kegiatan dari PKS. • Kegiatan berdana BNPB mulai Januari 2028.
Artinya: Program baru tidak masuk 2027.	**Artinya:** Dana baru 2027 lewat revisi.	**Artinya:** BNPB mengusulkan program.	**Artinya:** KAK dan RAB sudah siap.	**Artinya:** PKS berdana BNPB berjalan.


Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. KAK adalah kerangka acuan kerja. RAB adalah rencana anggaran biaya.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bila dimulai pekan depan, NK baru UGM dapat ditandatangani sebelum NK lama berakhir 15 minggu lagi, pada 22 Februari 2027

Linimasa Contoh UGM Sejak 16 November 2026

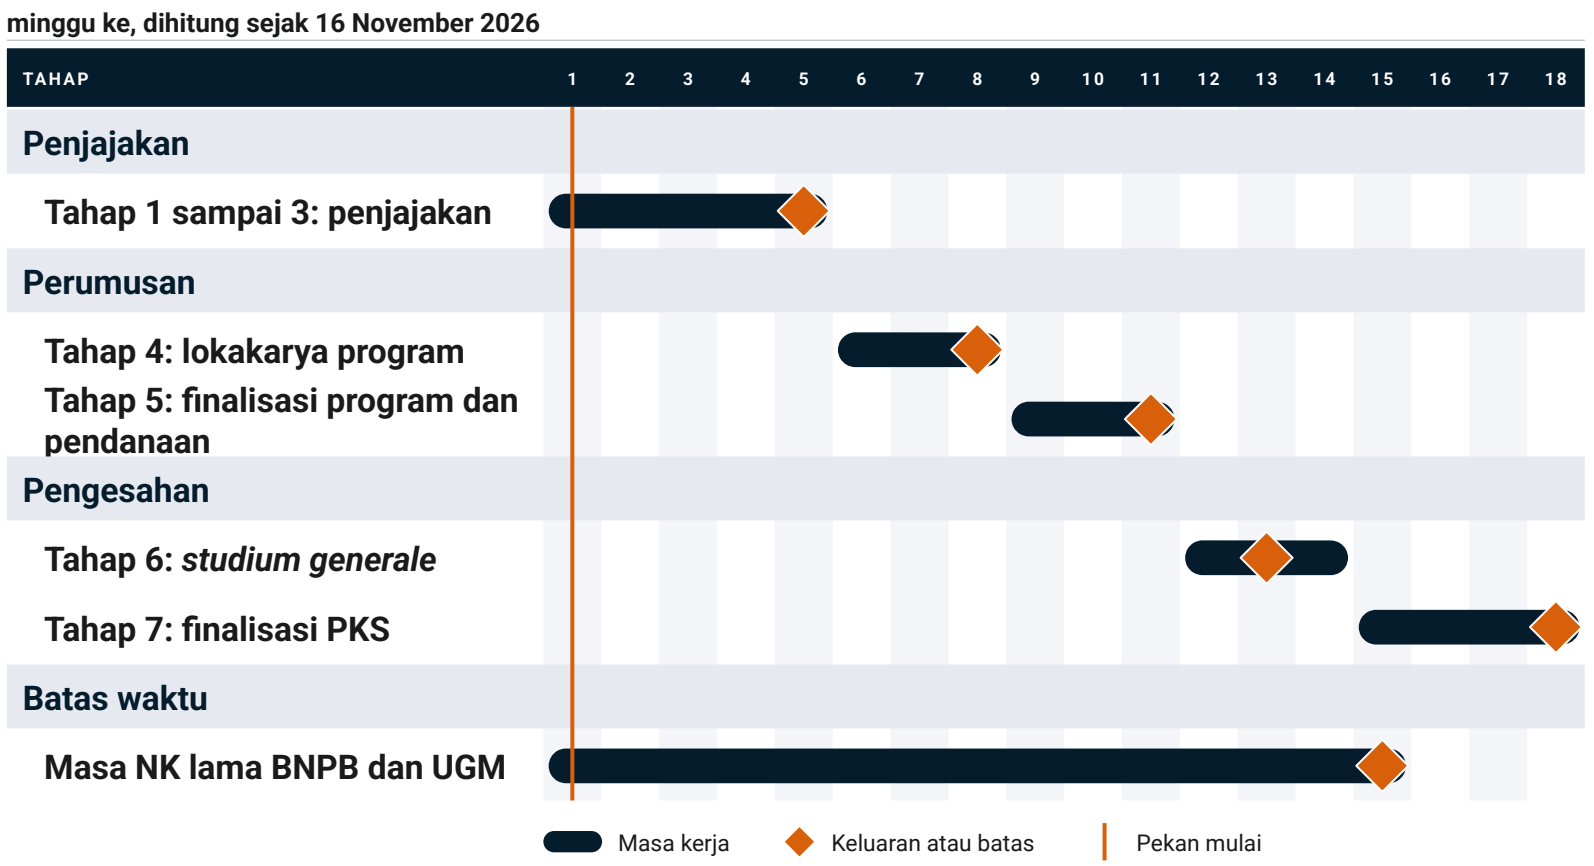

Mengapa UGM Lebih Awal

Batas waktu
NK UGM berakhir 22 Februari 2027.

Jadwal acara
Acara pada minggu ke-12 sampai ke-14.

Cukup waktu
Persiapan memerlukan **11** minggu.

PKS pertama
PKS UGM ditargetkan final Maret 2027.

Risiko
Libur akhir tahun dapat menggeser jadwal.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama.

Sumber: *Naskah NK BNPB dan UGM, 22 Feb 2022; dokumen alur, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jawaban Biro HOK atas 10 hal pokok menentukan templat PKS dan lama telaah naskah di seluruh alur

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Hal yang Perlu Dipastikan Biro HOK

NO	HAL YANG PERLU DIPASTIKAN	TAHAP TERDAMPAK
1	Prosedur baku kerja sama dalam negeri beserta pihak yang wajib terlibat	Semua tahap
2	Ketersediaan templat PKS resmi BNPB dengan perguruan tinggi	Tahap 5
3	Pejabat yang berwenang menandatangani PKS dan kebutuhan surat pelimpahan	Tahap 7
4	Kebutuhan persetujuan Kepala BNPB lewat telaahan staf sebelum PKS ditandatangani	Tahap 5
5	Lama telaah naskah dan tahap saat Biro HOK mulai terlibat	Tahap 3 sampai 5
6	Tata cara penomoran PKS dan pencatatannya di JDIH BNPB	Tahap 7
7	Mekanisme dana BNPB yang mengalir ke kampus negeri dan swasta	Tahap 5 dan 7
8	Kemungkinan NK dan PKS ditandatangani bersamaan secara elektronik	Tahap 6
9	Kecukupan PKS baru bagi kampus yang NK-nya masih berlaku	Tahap 1 sampai 5
10	Pasal wajib tentang data bencana sesuai aturan Satu Data Bencana	Tahap 5

Cara Membahasnya

Waktu
Diskusi dilakukan pada November 2026.

Peserta
Tenaga Ahli bertemu pejabat Biro HOK.

Templat
Templat PKS resmi diminta sekaligus.

Keluaran
Jawaban dicatat sebagai pedoman.

Lama telaah
Jawaban dipakai untuk menyusun linimasa.

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB. JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pimpinan diminta mengambil 5 keputusan supaya kerja sama dengan kampus selesai pada perjanjian kerja sama

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Setujui alur delapan tahap	Paling lambat November 2026, alur ini dipakai untuk semua kampus.	Pimpinan BNPB
Bahas alur dengan Biro HOK	Pada November 2026, sepuluh hal pokok dipastikan sebelum kunjungan awal.	Tenaga Ahli Kepala BNPB; Biro HOK
Mulai kerja sama dari UGM	NK baru UGM ditandatangani lewat *studium generale* sebelum 22 Februari 2027.	Tenaga Ahli Kepala BNPB
Biayai PKS pertama sendiri	PKS pertama UGM final pada Maret 2027 dengan beban masing-masing pihak.	Unit teknis BNPB
Usulkan program untuk 2028	Pada Maret sampai April 2027, program berdana BNPB masuk pagu indikatif 2028.	Biro Perencanaan BNPB

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima kasih

Alfatehan Septianta

Tenaga Ahli Kepala BNPB Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: Alharomain354, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Lampiran daftar dokumen di setiap tahap kerja sama beserta penyusun dan ketersediaannya

TAHAP	DOKUMEN	PENYUSUN	STATUS
1	Profil kampus	Tenaga Ahli Kepala BNPB	Tersedia sebagian
1	Usulan program yang ditawarkan	Tenaga Ahli Kepala BNPB	Tersedia
2	Surat permohonan audiensi	Tenaga Ahli Kepala BNPB	Tersedia
2	Bahan paparan kunjungan	Tenaga Ahli Kepala BNPB	Tersedia
2	Notula dan daftar hadir	Kedua pihak	Belum tersedia
3	Surat penunjukan tim kerja	Masing-masing pihak	Belum tersedia
3	Kerangka acuan tim kerja	Ketua tim kedua pihak	Belum tersedia
3	Draf NK	Biro HOK BNPB	Tersedia
4	Daftar masalah prioritas BNPB	Tenaga Ahli Kepala BNPB dan unit teknis	Belum tersedia
4	Matriks program	Tim kerja	Belum tersedia
4	Notula lokakarya	Sekretariat tim kerja	Belum tersedia
5	Kerangka Acuan Kerja per program	Unit teknis BNPB dan fakultas	Belum tersedia
5	Rencana anggaran biaya per program	Unit teknis dan bagian keuangan	Belum tersedia
5	Surat kepastian sumber dana	Bagian perencanaan dan keuangan	Belum tersedia

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran daftar dokumen di setiap tahap kerja sama beserta penyusun dan ketersediaannya (lanjutan)

TAHAP	DOKUMEN	PENYUSUN	STATUS
5	Draf PKS	Biro HOK dan bagian hukum kampus	Belum tersedia
5	Naskah NK final berparaf	Biro HOK BNPB	Belum tersedia
5	Telaahan staf kepada Kepala BNPB	Tenaga Ahli Kepala BNPB dan Biro HOK	Belum tersedia
6	Konsep acara	Tenaga Ahli Kepala BNPB	Tersedia
6	Surat undangan, sambutan, dan paparan	Kampus dan BNPB	Tersedia sebagian
6	NK rangkap asli dan siaran pers	Biro HOK dan Humas	Belum tersedia
7	PKS final dan lampirannya	Biro HOK dan bagian hukum kampus	Belum tersedia
7	Surat kuasa atau pelimpahan penanda tangan	Biro HOK dan bagian hukum kampus	Belum tersedia
7	Kontrak swakelola atau kontrak pengadaan	PPK dan unit teknis BNPB	Belum tersedia
7	Pencatatan nomor dan unggahan JDIH	Biro HOK	Belum tersedia
8	Rencana kerja tahunan	Penanggung jawab program	Belum tersedia
8	Laporan kemajuan dan laporan keuangan	Pelaksana kampus	Belum tersedia
8	Berita acara serah terima hasil	Pelaksana kampus	Belum tersedia
8	Laporan evaluasi tahunan dan adendum	Tim kerja	Belum tersedia

Keterangan: NK adalah nota kesepahaman. PKS adalah perjanjian kerja sama. Biro HOK adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB. JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. PPK adalah pejabat pembuat komitmen yang menandatangani kontrak atas nama pemilik anggaran. Humas adalah bagian hubungan masyarakat.

Sumber: *Dokumen alur kerja sama BNPB dan perguruan tinggi, 11 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
